



PROGRAMMA
OPERATIVO

VAL D'AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA



Estratto Report di sintesi sullo stato di attuazione

del Programma Operativo
Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra

Aggiornato al 31 dicembre 2016



INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 : Interventi previsti dai DPC Fase I e Fase II, ripartiti per singolo comune	4
Tabella 2: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Abriola con relativa spesa	6
Tabella 3: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Accettura con relativa spesa	7
Tabella 4: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Aliano con relativa spesa	8
Tabella 5: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Anzi con relativa spesa	9
Tabella 6: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Armento con relativa spesa	11
Tabella 7: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Brienza con relativa spesa.....	12
Tabella 8: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Brindisi Montagna con relativa spesa	14
Tabella 9: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Calvello con relativa spesa	15
Tabella 10: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Castelmezzano con relativa spesa ..	17
Tabella 11: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Castelsaraceno con relativa spesa ..	17
Tabella 12: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Cirigliano con relativa spesa.....	19
Tabella 13: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Corleto Perticara con relativa spesa	19
Tabella 14: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Gallicchio con relativa spesa	21
Tabella 15: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Gorgoglione con relativa spesa	22
Tabella 16: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Grumento Nova con relativa spesa.	24
Tabella 17: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Guardia Perticara con relativa spesa	25
Tabella 18: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Laurenzana con relativa spesa	26
Tabella 19: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Marsiconuovo con relativa spesa....	27
Tabella 20: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Marsicovetere con relativa spesa ...	29
Tabella 21: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Missanello con relativa spesa	31
Tabella 22: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Moliterno con relativa spesa	32
Tabella 23: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Montemurro con relativa spesa.....	35
Tabella 24: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Paterno con relativa spesa.....	36
Tabella 25: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Pietrapertosa con relativa spesa.....	37
Tabella 26: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Roccanova con relativa spesa	38
Tabella 27: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di San Chirico Raparo con relativa spesa	39
Tabella 28: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di San Martino d'Agri con relativa spesa	40
Tabella 29: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Sant'Arcangelo con relativa spesa .	41
Tabella 30: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Sarconi con relativa spesa.....	43
Tabella 31: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Sasso di Castalda con relativa spesa	44
Tabella 32: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Satriano di Lucania con relativa spesa	46
Tabella 33: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Spinoso con relativa spesa	47
Tabella 34: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Stigliano con relativa spesa.....	49
Tabella 35: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Tramutola con relativa spesa	49
Tabella 36: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Viggiano con relativa spesa.....	51
Tabella 37: Quadro di sintesi edilizia scolastica	53
Tabella 38: Quadro di sintesi edilizia scolastica	53

Tabella 39: Quadro di sintesi edilizia di culto.....	54
Tabella 40: Quadro di sintesi edilizia di culto.....	54
Tabella 41: Quadro di sintesi viabilità	55
Tabella 42: Quadro di sintesi viabilità	55

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1: Interventi previsti dai DPC della I e II fase insieme, ripartiti per singolo comune	5
Grafico 2: Andamento temporale della spesa del Comune di Abriola.....	7
Grafico 3: Andamento temporale della spesa del Comune di Aliano	9
Grafico 4: Andamento temporale della spesa del Comune di Anzi	11
Grafico 5: Andamento temporale della spesa del Comune di Armento	12
Grafico 6: Andamento temporale della spesa del Comune di Brienza	14
Grafico 7: Andamento temporale della spesa del Comune di Brindisi Montagna.....	15
Grafico 8: Andamento temporale della spesa del Comune di Calvello.....	17
Grafico 9: Andamento temporale della spesa del Comune di Castelsaraceno.....	19
Grafico 10: Andamento temporale della spesa del Comune di Corleto Perticara	21
Grafico 11: Andamento temporale della spesa del Comune di Gallicchio.....	22
Grafico 12: Andamento temporale della spesa del Comune di Gorgoglione	24
Grafico 13: Andamento temporale della spesa del Comune di Grumento Nova	25
Grafico 14: Andamento temporale della spesa del Comune di Guardia Perticara	26
Grafico 15: Andamento temporale della spesa del Comune di Laurenzana.....	27
Grafico 16: Andamento temporale della spesa del Comune di Marsiconuovo	29
Grafico 17: Andamento temporale della spesa del Comune di Marsicovetere.....	31
Grafico 18: Andamento temporale della spesa del Comune di Missanello	32
Grafico 19: Andamento temporale della spesa del Comune di Moliterno	34
Grafico 20: Andamento temporale della spesa del Comune di Montemurro	36
Grafico 21: Andamento temporale della spesa del Comune di Paterno	37
Grafico 22: Andamento temporale della spesa del Comune di Roccanova.....	39
Grafico 23: Andamento temporale della spesa del Comune di San Chirico Raparo.....	40
Grafico 24: Andamento temporale della spesa del Comune di San Martino d’Agri.....	41
Grafico 25: Andamento temporale della spesa del Comune di Sant’Arcangelo.....	42
Grafico 26: Andamento temporale della spesa del Comune di Sarconi	44
Grafico 27: Andamento temporale della spesa del Comune di Sasso di Castalda.....	45
Grafico 28: Andamento temporale della spesa del Comune di Satriano di Lucania.....	47
Grafico 29: Andamento temporale della spesa del Comune di Spinoso.....	48
Grafico 30: Andamento temporale della spesa del Comune di Tramutola	51
Grafico 31: Andamento temporale della spesa del Comune di Viggiano	52

Le operazioni infrastrutturali attuate dai Comuni nelle Tematiche A1, A2, C1 e C5, fanno registrare una spesa che ammonta a circa 68,5 milioni di euro pari al 66% delle somme programmate e al 67% delle somme impegnate per quanto riguarda il 2015 a circa 73,8 milioni di euro pari al 71% delle somme programmate e al 72,2% delle somme impegnate.

AVANZAMENTO DI SPESA DPC							
Comune	Programmato	Impegnato	Speso al 31/12/2015	Speso al 31/12/2016	% Speso su programmato	% Speso su impegnato al 31/12/2016	Incremento % di spesa 31/12/15-31/12/16
ABRIOLA	3.689.087	3.684.211	2.386.009	2.671.622	72,42%	72,52%	11,97%
ALIANO	3.103.719	3.103.719	2.338.298	2.362.551	76,12%	76,12%	1,04%
ANZI	3.077.595	3.191.947	2.255.749	2.255.749	73,30%	70,67%	0,00%
ARMENTO	2.758.130	2.499.630	1.180.934	1.235.039	44,78%	49,41%	4,58%
BRIENZA	4.924.187	4.924.187	2.638.594	2.918.315	59,26%	59,26%	10,60%
BRINDISI MONTAGNA	2.763.692	2.763.692	1.610.693	1.637.286	59,24%	59,24%	1,65%
CALVELLO	3.525.513	3.499.513	1.941.882	1.912.696	54,25%	54,66%	-1,50%
CASTELSARACENO	3.051.246	3.010.493	1.802.059	2.146.944	70,36%	71,32%	19,14%
CORLETO PERTICARA	4.395.914	4.372.611	2.653.710	2.975.668	67,69%	68,05%	12,13%
GALLICCHIO	2.468.305	2.456.805	1.685.663	2.046.830	82,92%	83,31%	21,43%
GORGOGNONE	2.602.672	2.602.672	2.185.202	2.367.921	90,98%	90,98%	8,36%
GRUMENTO NOVA	2.896.727	2.896.727	1.014.280	1.473.073	50,85%	50,85%	45,23%
GUARDIA PERTICARA	2.204.848	2.204.848	826.342	1.206.342	54,71%	54,71%	45,99%
LAURENZANA	3.473.458	3.423.458	2.381.509	2.667.801	76,81%	77,93%	12,02%
MARSICONUOVO	6.301.960	6.301.960	4.327.975	4.995.836	79,27%	79,27%	15,43%
MARSICOVETERE	4.846.543	4.846.543	3.250.449	3.460.579	71,40%	71,40%	6,46%
MISSANELLO	2.138.025	2.138.025	1.431.711	1.385.133	64,79%	64,79%	-3,25%
MOLITERNO	5.187.170	5.187.170	2.642.755	3.079.398	59,37%	59,37%	16,52%
MONTEMURRO	3.035.355	3.035.355	2.232.926	2.333.444	76,88%	76,88%	4,50%
PATERNO	3.581.932	2.979.272	2.036.966	2.036.966	56,87%	68,37%	0,00%
ROCCANOVA	3.246.000	2.211.000	1.864.852	1.865.352	57,47%	84,37%	0,03%
SAN CHIRICO RAPARO	3.225.777	3.216.177	2.415.415	2.511.024	77,84%	78,07%	3,96%
SAN MARTINO D'AGRI	2.774.225	2.774.225	2.013.970	2.299.200	82,88%	82,88%	14,16%
SANT'ARCANGELO	6.861.266	6.811.316	6.512.233	6.542.233	95,35%	96,05%	0,46%
SARCONI	2.292.251	2.292.251	1.791.109	1.828.713	79,78%	79,78%	2,10%
SASSO DI CASTALDA	3.177.438	3.177.438	2.092.405	2.272.995	71,54%	71,54%	8,63%
SATRIANO DI LUCANIA	3.400.713	3.370.713	3.114.027	3.189.366	93,79%	94,62%	2,42%
SPINOSO	2.517.392	2.367.548	1.077.195	1.077.195	42,79%	45,50%	0,00%
TRAMUTOLA	3.934.014	3.934.014	3.355.122	3.547.242	90,17%	90,17%	5,73%
VIGGIANO	2.798.750	2.798.750	1.475.094	1.475.094	52,71%	52,71%	0,00%
TOTALI	104.253.904	102.076.269	68.535.127	73.777.608	70,77%	72,28%	7,65%

Tabella 1 : Interventi previsti dai DPC Fase I e Fase II, ripartiti per singolo comune

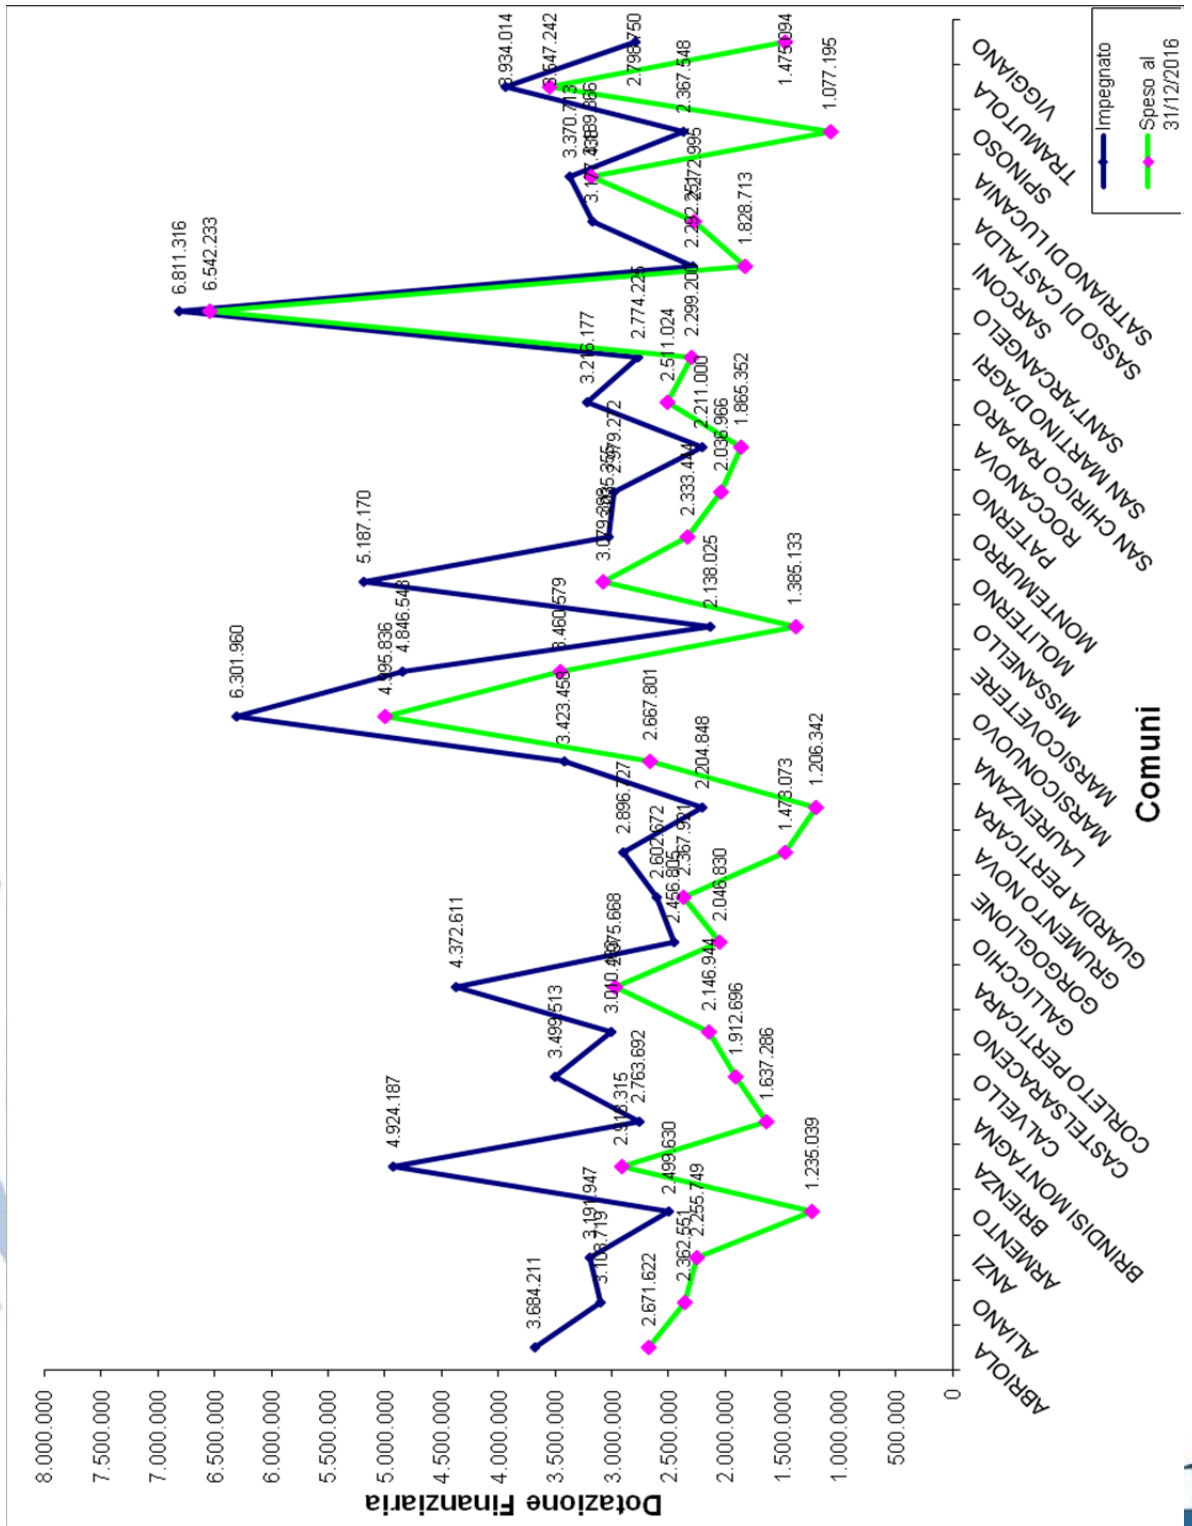


Grafico 1: Interventi previsti dai DPC della I e II fase insieme, ripartiti per singolo comune

Tabella 2: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Abriola con relativa spesa

COMUNE DI ABRIOLA					
DPC. Fase I Appr. con DGR 1068/2006 e DGR 1926/2006		D.P.C. Fase II Approvato con DD 1944 del 13/09/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.03	Riqualificazione luoghi caratteristici del centro urbano. Via dei Fuochi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A1	P.01.04	Parcheggio a servizio della struttura sportiva polifunzionale e scuola media	15.925,99	15.925,99	0,00
A1	P.F2.01.01	Lavori di manutenzione viabilità interna (ex Centro storico recupero piazze)	50.000,00	39.462,48	39.462,48
A1	P.F2.01.01a	Lavori di manutenzione viabilità interna (ex Centro storico recupero piazze). Opere di completamento		10.537,52	9.521,95
A1	P.F2.01.02	Ristrutturazione Palazzo Passarelli. A questo intervento è stato accorpato quello della Fase I per € 381.282,43	811.282,43	381.282,43	730.154,18
				430.000,00	
A1	P.F2.01.03	Lavori di completamento ristrutturazione Palazzo Passarelli. Questo intervento è scaturita dalla rimodulazione del DPC del 30/11/2016	324.210,49	30.000,00	0,00
				20.000,00	
				274.210,49	
A1	P.F2.01.05	Riqualificazione luoghi caratteristici del centro abitato - Piazza Marconi. A questo intervento è stato accorpato quello della Fase I per € 134.340,12	149.340,12	134.340,12	126.653,20
				15.000,00	
A1	P.02.01	Salone Comunale. Con DD del 30/11/16, è stata variata la S. P. Parte di questo intervento.	75.704,65	62.861,33	106.215,29
A1	P.02.01a	Salone Comunale. Opere di completamento		12.843,32	0,00
A1	P.02.02	Riqualificazione zona ingresso del paese	13.602,00	8.725,80	2.617,74
A2	P.04.01	Riqualificazione ambientale Area Burgaro. Parco fluviale	484.029,10	484.029,10	374.410,21
A2	P.04.02	Riqualificazione ambientale Area Tintiera - recupero paesaggistico	71.970,90	71.970,90	0,00
A2	P.F2.04.02	Area Tintiera (recupero paesaggistico)	80.000,00	80.000,00	0,00
A2	P.F2.04.03	Area Arioso (recupero paesaggistico)	99.500,00	99.500,00	70.672,29
A2	P.06.02	Strada Rurale Cascinali - Saucino	39.000,00	39.000,00	32.952,28
A2	P.F2.06.03	Adeguamento strada rurale Contrada Cerreta - Braida	55.486,77	55.486,77	54.185,77
A2	P.F2.06.04	Adeguamento strada rurale Contrada Valloni - Pisciole	30.000,00	30.000,00	0,00
A2	P.F2.06.05	Adeguamento strada rurale Torrente Marsicano	20.000,00	20.000,00	0,00
C1	P.08.01	Completamento struttura polifunzionale in Via Gelsi - I^ Lotto	166.165,68	166.165,68	165.755,50
C1	P.08.02	Completamento struttura polifunzionale in Via Gelsi - II^ Lotto	162.180,10	162.180,10	145.816,57
C1	P.08.09	Completamento ristrutturazione palestra comunale	18.354,31	18.354,31	18.353,06
C1	P.F2.08.06	Ristrutturazione Campo Sportivo Comunale	51.000,00	51.000,00	36.893,20
C1	P.F2.08.08	Miglioramento Impiantistica Palestra Comunale	54.500,00	54.500,00	46.767,46
C5	P.08.04	Centro diurno per anziani	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C5	P.08.05	Ampliamento cimitero comunale - 2^ stralcio	471.998,51	471.998,51	356.452,93
A1		Gestione DPC	88.500,00	88.500,00	22.750,00
C5	P.F2.08.07	Manutenzione straordinaria Villa Comunale. Arredo Parco Giochi	95.336,16	95.336,16	82.027,77
C5	P.F2.08.10	Museo Todisco	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTALI FASE I			1.857.431,24	1.852.555,04	1.475.323,58
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.831.655,97	1.831.655,97	1.196.338,30
TOTALI COMPLESSIVI			3.689.087,21	3.684.211,01	2.671.661,88

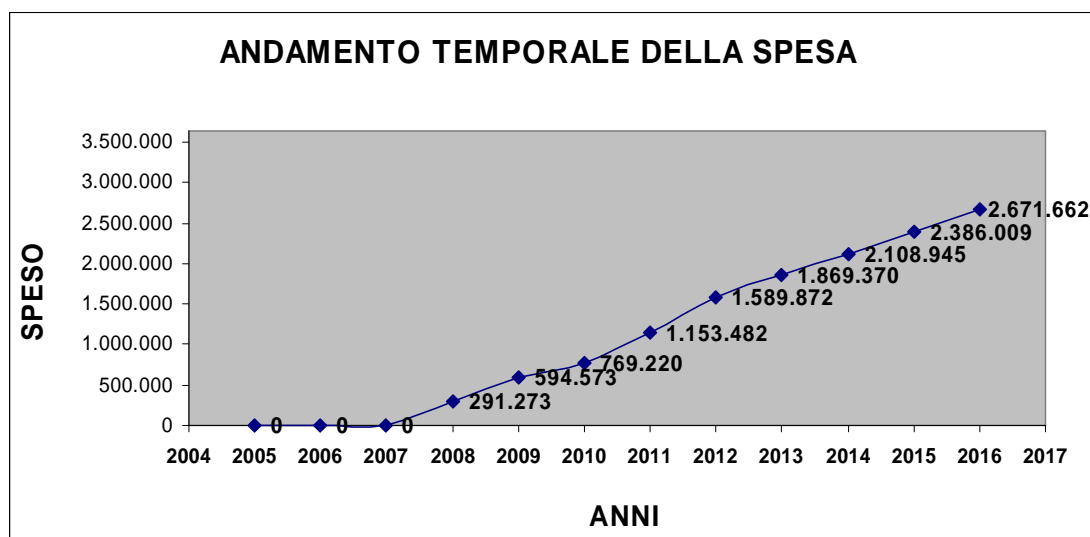


Grafico 2: Andamento temporale della spesa del Comune di Abriola

Tabella 3: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Accettura con relativa spesa

COMUNE DI ACCETTURA					
DPC Fase I presentato e in valutazione			DPC Fase II: nel DPC Fase I sono stati presentati anche gli interventi Fuori tetto finanziario che dovrebbero confluire nel DPC Fase II		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e arredo Largo San Vito	170.000,00		
	P.01.02	Riqualificazione e adeguamento Via Rione Torre e Via Cesare Battisti	270.000,00		
	P.02.01	PIC - Adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e coperture	138.988,33		
A2	P.03.01	Completamento e sistemazione strada Le Rocche	134.000,00		
	P.03.02	Completamento strada Ferrari	110.000,00		
	P.03.03	Completamento strada Camilio	50.000,00		
C1	P.04.01	Miglioramento campo calcio A5 in località San Pietro. Realizzazione tappeto in erba sintetica, costruzione copertura e tribuna, sistemazione spogliatoi esistenti da annessi alla struttura	239.000,00		
C5	P.05.01	Realizzazione di una nuova struttura da adibire a centro sociale polifunzionale (1^ lotto funzionale)	370.000,00		
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	120.769,66	36.230,90	36.230,90
TOTALI FASE I			1.602.757,99	36.230,90	36.230,90
TOTALI COMPLESSIVI			1.602.757,99	36.230,90	36.230,90

Tabella 4: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Aliano con relativa spesa

COMUNE DI ALIANO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1552 del 31-10-2006, 2^ Appr. DGR 1777 del 28-12-2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 969 del 14/04/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione Piazzetta Roma	95.000,00	95.000,00	28.500,00
A1	P.01.02	Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII	65.000,00	65.000,00	38.849,41
A1	P.01.03	Riqualificazione Piazza Garibaldi	65.000,00	47.883,59	47.883,59
		Riqualificazione Piazza Garibaldi. Opere di completamento		17.116,41	6.446,27
A1	P.01.04	Riqualificazione Rione Levi - Riconversione Museo delle Tele.	47.300,00	47.300,00	46.062,13
A1	P.01.05	Toponomastica	17.700,00	17.700,00	17.700,00
A1	P.F2.01.01	Lavori di riqualificazione Via Mercato e Zona Carmine	170.000,00	170.000,00	105.309,04
A1	P.F2.01.02	Lavori di riqualificazione zona vico Roma e ripristino Mercato Coperto	200.000,00	200.000,00	60.000,00
A1	P.02.01	Completamento Sala Polifunzionale Via Cisterna.	90.000,00	90.000,00	77.764,01
A1	P.02.02a	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo Caporale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A1	P.02.03a	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo De Franchi	150.000,00	150.000,00	135.384,00
A1	P.02.04	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo Scardaccione	110.000,00	110.000,00	106.714,00
A1	P.02.04a	Attivazione di divulgazione e valorizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali realizzate con i fondi PO.			
A1	P.03.01a	PIC - Facciate e coperture. I Fase	155.000,00	155.000,00	35.000,00
A2	P.F2.02.01	Lavori di sistemazione strada rurale Calanche - San Leuce.	60.000,00	60.000,00	19.510,53
A2	P.06.01a	Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello Nuovo	100.000,00	76.829,73	76.829,73
		Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello Nuovo. Opere di completamento		23.170,27	9.960,39
A2	P.06.02a	Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello di sotto	100.000,00	80.116,22	80.116,22
		Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello di sotto. Opere di completamento		19.883,78	19.651,25
A2	P.06.03a	Il percorso dei calanchi	50.000,00	36.655,79	36.655,79
		Il percorso dei calanchi. Opere di completamento		13.344,21	0,00
A2	P.07.01a	Acquedotto rurale in località Leo	100.000,00	74.794,45	74.794,45
		Acquedotto rurale in località Leo. Opere di completamento		25.205,55	25.094,15
A2	P.07.01b	Acquedotto rurale in località Alvanello	30.000,00	30.000,00	29.998,93
A2	P.07.02	Sistemazione strade Aliano-Pantano e S.C. Leo-SS 598	80.000,00	64.962,38	64.962,38
A2	P.07.02b	Sistemazione strade Aliano-Pantano e S.C. Leo-SS 598. Opere di completamento		15.037,62	15.037,40
A2	P.07.03a	Sistemazione strade Contrada Serre	33.000,00	33.000,00	32.992,86
C1	P.08.01a	Copertura e potenziamento campo di calcetto	134.447,26	118.536,20	118.536,20
				15.911,06	15.911,06
C1	P.08.01b	Copertura e potenziamento campo di calcetto. Opere di completamento.	21.552,74	11.463,80	11.332,53
				10.088,94	10.062,68
C1	P.08.02a	Realizzazione campo da tennis, pallavolo e pallacanestro.	40.000,00	30.657,32	30.657,32
		Realizzazione campo da tennis, pallavolo e pallacanestro. Opere di completamento		9.342,68	6.496,10
C1	P.08.03a	Realizzazione palestra ad uso pedagogico.	100.600,00	89.332,59	89.332,59

		Realizzazione palestra ad uso pedagogico. Opere di completamento		11.267,41	0,00
C1	P.F2.03.01	Completamento Tendostruttura	70.000,00	70.000,00	66.074,41
C1	P.F2.03.02	Sistemazione Campo Sportivo	20.000,00	20.000,00	19.740,42
C1	P.F2.03.03	Campo Calcetto Alianello Nuovo	30.000,00	23.779,20	23.779,20
		Campo Calcetto Alianello Nuovo. Opere di completamento		6.220,80	6.220,80
C5	P.09.01	Riconversione ex Municipio in struttura socio sanitaria. Punto Salute. Lavori edili	100.000,00	50.000,00	45.091,68
C5		Riconversione ex Municipio in struttura socio sanitaria. Punto Salute. Acquisto attrezzature		3.084,00	3.084,00
C5		P.09.01a		Riconversione ex Municipio in struttura socio sanitaria. Punto Salute. Opere di completamento	46.916,00
C5	P.09.02a	Centro socio assistenziale- 1° Lotto Funzionale	253.800,00	199.426,86	199.426,86
		Centro socio assistenziale- 1° Lotto Funzionale. Opere di completamento		54.373,14	54.372,55
C5	P.09.02b	Centro socio assistenziale- 2° Lotto Funzionale	60.000,00	60.000,00	55.830,09
C5	P.F2.04.01	Completamento centro sociale diurno palazzo Scardaccione	100.000,00	100.000,00	20.598,44
C5	P.F2.04.02	Sistemazione monumentale zona Tomba Carlo Levi	180.000,00	180.000,00	140.479,68
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	P.F2.05.01	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	35.319,00	35.319,00	14.307,96
TOTALI FASE I			2.238.400,00	2.238.400,00	1.886.530,62
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			865.319,00	865.319,00	476.020,48
TOTALI COMPLESSIVI			3.103.719,00	3.103.719,00	2.362.551,10

Importi espressi in euro

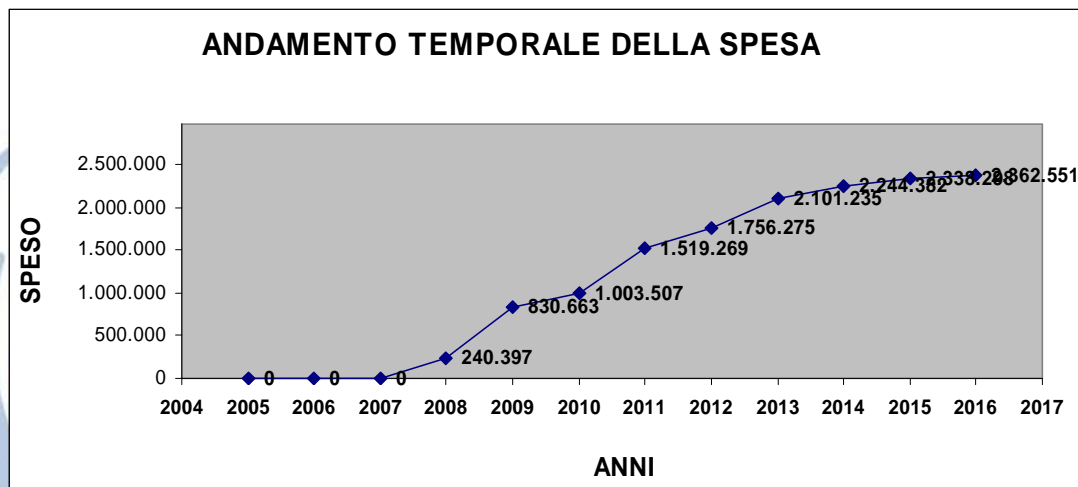


Grafico 3: Andamento temporale della spesa del Comune di Aliano

Tabella 5: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Anzi con relativa spesa

COMUNE DI ANZI					
DPC Fase I Approvazione con D.G.R. 1276 del 04/09/2006			DPC Fase II - Approvazione con D.D. n. 7132/2012/D.00314 del 09/03/2012		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Ripristino pavimentazione in Via Lacava, Piazza Dante Alighieri e Via Garibaldi	419.240,09	420.000,00	420.000,00
A1	P.F2.01.05	Arredo urbano nel centro storico	200.000,00	200.000,00	0,00

A1	P.F2.01.10	Restauro conservativo dei locali al primo piano di palazzo Zampaglione (sala consiliare e locale antistante)	200.000,00	200.000,00	94.247,18
A1	P.F2.01.11	Riattamento della copertura del parcheggio urbano in località Madonna delle Grazie da destinare a tetto solare fotovoltaico e parco giochi per l'infanzia con completamento della viabilità di accesso	170.000,00	170.000,00	51.000,00
A1	P.01.02	Riqualificazione del salone dell'Annunziata e laghetto antistante	210.000,00	210.000,00	209.978,00
A2	P.F2.02.05	Adeguamento e miglioramento della viabilità rurale nel territorio comunale	200.000,00	200.000,00	57.244,50
A1	P.01.03	Riqualificaione e restauro locale seminterrato del Palazzo Zampaglione	220.000,00	220.000,00	188.680,36
A1	P.01.04	Realizzazione rampe di accesso 1° e 2° livello parcheggio Madonna delle Grazie	150.000,00	150.000,00	121.846,84
A2 C1	P.02.01	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale campo Polivalente località Convento.	18.785,69	138.000,00	41.400,00
A2	P.02.02	Riqualificazione ambientale area limitrofa sede municipale con fine spazio relax.	100.000,00	100.000,00	30.000,00
A2	P.02.03	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale Area S. Maria e ammodernamento strada di collegamento.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A2	P.02.04	Adeguamento e miglioramento viabilità comunale Vallone dell'Inferno.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
A1 C1	P.03.01	Potenziamento centro sportivo località S. Donato e intervento di riqualificazione ambientale.	386.032,88	111.770,40	386.032,88
		Potenziamento centro sportivo località S. Donato e intervento di riqualificazione ambientale.		284.800,00	
C1	P.F2.03.05	Completamento dell'adeguamento funzionale ed impiantistico del campo sportivo comunale	30.000,00	30.000,00	0,00
C5	P.04.01	Potenziamento infrastrutture socio - assistenziali ed acquisto pulmino.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
C5	P.04.02	Completamento strutturale ed adeguamento funzionale dei locali di palazzo Zampaglione per finalità socio - assistenziali.	293.460,00	293.460,00	293.460,00
C5	P.04.03	Completamento funzionale locali comunali (ex ufficio tecnico) da destinare a centro diurno anziani e ludoteca.	13.058,06	13.058,06	0,00
C5	P.04.03a	Interventi per il contenimento dei consumi energetici dei locali per attività soci - assistenziali e sanitarie ubicate nell'edificio dell'istituto comprensivo.	68.508,52	68.508,52	34.159,36
		Gestione DPC e PIC	43.600,00	27.440,00	20.000,00
		Gestione DPC e PIC	54.910,01	54.910,01	7.700,00
TOTALI FASE I			2.222.685,24	2.337.036,98	2.045.557,44
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			854.910,01	854.910,01	210.191,68
TOTALI COMPLESSIVI			3.077.595,25	3.191.946,99	2.255.749,12
Importi espressi in euro					

ANDAMENTO TEMPORALE DELLA SPESA

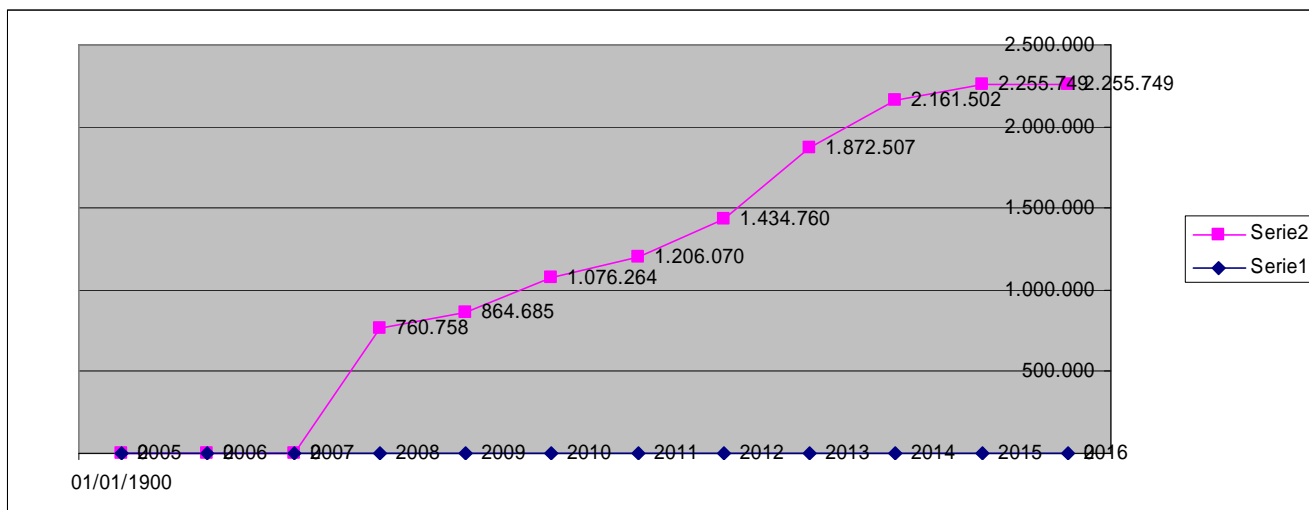


Grafico 4: Andamento temporale della spesa del Comune di Anzi

Tabella 6: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Armento con relativa spesa

COMUNE DI ARMENTO					
D.P.C. Fase I approvato con DGR n. 645/2006 e 750/2009			D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 57 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01a	Canalizzazione acque meteoriche in Piazza Umberto I	60.000,00	60.000,00	46.473,32
A1	P.01.01b	Canalizzazione acque meteoriche in Piazza Umberto I (Completamento)	100.000,00	100.000,00	0,00
A1	P.01.02	Completamento zona S. Vitale	20.000,00	20.000,00	18.868,10
A1	P.01.03	Lavori di riqualificazione Largo Fontanelle	53.000,00	53.000,00	43.487,14
A1	P.01.04	Riqualificazione zona a valle di Piazza Umberto I	200.000,00	167.787,11	151.008,40
A1	P.01.04	Riqualificazione zona a valle di Piazza Umberto I. Opere di completamento		32.212,89	0,00
A1	P.03.01a	PIC Facciate e Coperture. Attivazione ambito pilota 1	35.000,00	35.000,00	34.992,22
A1	P.03.01b	PIC Facciate e Coperture. Attivazione asse di Priorità 1	198.000,00	198.000,00	49.860,22
A1	P.04.01	PIC Casa Sicura	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione asse da San Luca a San Vitale	258.000,00	258.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	PIC - Casa Sicura	50.000,00	50.000,00	15.000,00
A1	P.F2.03.01	PIC - Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	50.000,00	50.000,00	0,00
A2	P.06.01	Completamento acquedotto rurale in località "Serra Pascarelli"	90.000,00	90.000,00	74.229,45
A2	P.06.02	Acquedotto rurale loc. Itlei, Tempa Candore, Tempa Virgilio e Valle Grande	282.000,00	282.000,00	192.525,51
A2	P.F2.04.01	Antichi tratturi Ippoturismo sentieristica	80.000,00	80.000,00	0,00
A2	P.F2.05.01	Miglioramento viabilità ed acquedotto rurale C.da Capannone - Serra Mauta e Piano di Campo - Sant'Eramo	100.000,00	100.000,00	76.111,92
C1	P.07.01a	Sistemazione campo di calcetto	12.200,00	12.200,00	9.895,70
C1	P.07.01b	Completamento campo di calcetto e sistemazione campo sportivo	7.800,00	7.800,00	3.935,23
C1	P.07.02	Centro polivalente zona Lavinaro	205.000,00	205.000,00	0,00
		Centro polivalente zona Lavinaro. Attrezzaggio	66.000,00	66.000,00	0,00

C1	P.F2.07.01	Centro sociale polivalente Lavinaro. Questo intervento ha un costo pari a € 112.900,00, però è maturo condizionato per cui l'impegno non è stato ancora fatto	112.900,00	0,00	0,00
C5	P.F2.07.02	Centro sociale polivalente Lavinaro. Questo intervento ha un costo pari a € 145.600,00, però è maturo condizionato per cui l'impegno non è stato ancora fatto	145.600,00	0,00	0,00
C5	P.08.01a	Realizzazione di una ludoteca	59.000,00	59.000,00	50.653,72
C5	P.08.02a	Realizzazione di una biblioteca e Mediateca Multimediale	141.000,00	141.000,00	130.534,54
C5	P.08.03	Adeguamento funzionale Sala Falcone - Borsellino	72.000,00	72.000,00	63.661,71
C5	P.08.04a	Centro sociale polivalente Lavinaro	66.000,00	66.000,00	0,00
C5	P.F2.06.01	Potenziamento Ludoteca e Mediateca.	20.000,00	20.000,00	19.747,95
		Oneri di programmazione	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	P.F2.09	Risorse umane ed attrezzature connesse	50.830,00	50.830,00	30.254,14
TOTALI FASE I			1.890.800,00	1.890.800,00	1.093.925,26
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			867.330,00	608.830,00	141.114,01
TOTALI			2.758.130,00	2.499.630,00	1.235.039,27

Importi espressi in euro

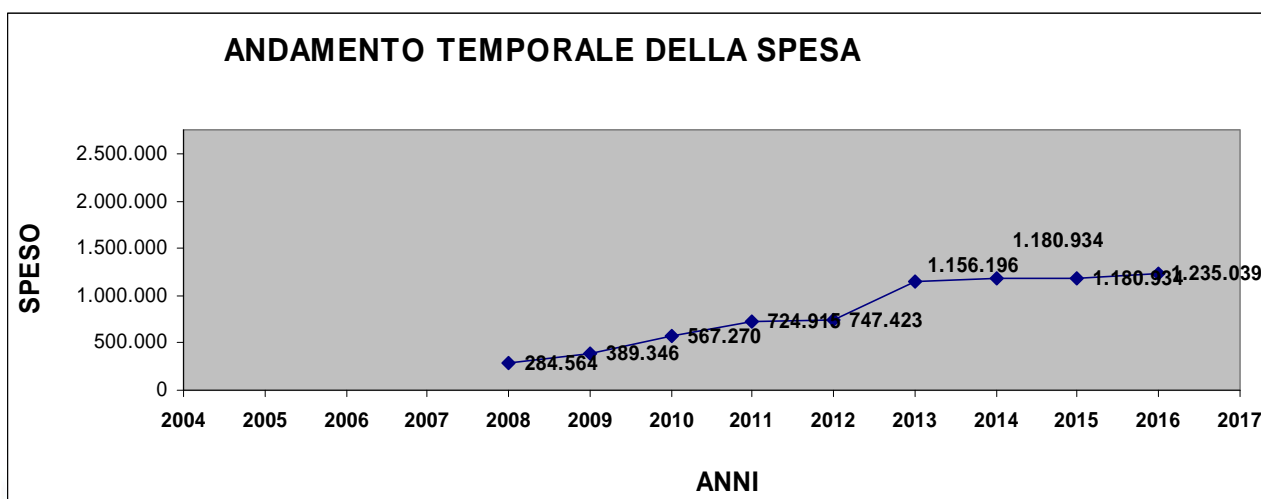


Grafico 5: Andamento temporale della spesa del Comune di Armento

Tabella 7: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Brienza con relativa spesa

Comune di BRIENZA					
D.P.C. Fase I approvato con DGR n. 544/2007 e 1471/2008			D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 974 del 14/04/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Illuminazione artistica del Borgo	37.827,97	37.827,97	37.872,97
A1	P.01.02	Riqualificazione Piazza Guglielmo Marconi e Via S. Giovanni Bosco	700.000,00	586.059,52	586.059,52
A1	P.01.02	Riqualificazione Piazza Guglielmo Marconi e Via S. Giovanni Bosco. Opere di completamento		113.940,48	113.940,48
A1	P.01.03	Toponomastica e arredo urbano centro storico	50.000,00	50.000,00	48.934,17
A1	P.01.04	Riqualificazione Via Maruggi	100.000,00	100.000,00	99.677,66

A1	P.02.01	Ristrutturazione palazzo Paternoster	500.000,00	500.000,00	345.410,16
A1	P.02.02	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Palazzo Comunale (sede Municipale)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A1	P.02.03	Completamento comparto 24/30	440.000,00	440.000,00	207.807,15
A1	P.F2.05.05	Riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I e ponte di collegamento alla viabilità principale. Parte di questo intervento per € 400.000,00 è stato accorpato al P.F2.08.02	200.000,00	200.000,00	0,00
A1	P.F2.05.06	Riqualificazione asta fluviale Centro urbano. Questo intervento per € 70.000,00 è stato accorpato al P.F2.08.02	0,00	0,00	0,00
A2	P.05.01*	Restauro Mulini e Ponticelli (Cofinanziamento PIT)	9.411,00	9.411,00	9.411,04
A2	P.05.02	Opere per la protezione e la fruizione paesistica del territorio	0,00	0,00	0,00
A2	P.06.01*	Recupero e sistemazione area Cappella Madonna degli Angeli	21.789,00	21.789,00	21.789,00
A2	P.06.02a	Ripristino viabilità contrada "Monte"	49.667,44	49.667,44	49.667,44
A2	P.06.02b	Lavori di illuminazione contrada Monte	86.041,68	86.041,68	86.041,68
A2	P.06.02.c	Lavori di illuminazione Contrada Monte. Opere di completamento	13.958,32	13.958,32	3.958,32
A2	P.06.03a	Riqualificazione area antistante Chiesa Madonna degli Schiavi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A2	P.06.03b	Ristrutturazione centro socio educativo per disabili "La Fattoria Burgentina"	40.279,13	40.279,13	40.279,13
A2	P.06.03c	Sistemazione strada di collegamento ex scuola elementare Pergola"	55.518,24	55.518,24	55.518,24
A2	P.06.04	Lavori di completamento e riqualificazione della contrada Monte e della Contrada Schiavi. Questo intervento non esisteva. Scaturisce dalle economie di altri interventi	32.880,15	32.880,15	0,00
A2	P.F2.06.03	Sistemazione strada rurale Monte	250.000,00	250.000,00	249.286,99
A2	P.F2.06.07	Illuminazione rurale Contrade Castellone e Visciglietta	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A2	P.F2.06.08	Illuminazione rurale Contrada Chiuse	80.597,66	61.429,65	61.429,65
		Illuminazione rurale Contrada Chiuse. Opere di completamento		19.168,01	19.168,01
A2	P.F2.08.02	Riqualificazione edificio scolastico ex Scuola Media per realizzazione Centro sociale Polifunzionale. A questo intervento è stato accorpato l'int. P.05.02 Opere per la protezione e la fruizione paesistica del territorio per € 78.000,00; l'int. P.07.01 Lavori di completamento impianto sportivo polivalente e riqualificazione ambientale del campo di calcio e sistemazione aree circostanti per € 525.000,00; parte dell'int. P.F2.05.05 Riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I e ponte di collegamento alla viabilità principale per € 400.000,00 più € 70.000,00 dell'int. P.F2.05.06 Riqualificazione asta fluviale centro urbano.	1.355.243,00	282.243,00	0,00
				78.000,00	0,00
				525.000,00	0,00
				470.000,00	0,00
C1	P.07.01	Lavori di completamento impianto sportivo polivalente e riqualificazione ambientale del campo di calcio e sistemazione aree circostanti.	600.000,00	562.435,05	562.435,05
		Lavori di completamento impianto sportivo polivalente e riqualificazione ambientale del campo di calcio e sistemazione aree circostanti. Opere di completamento		37.564,95	33.808,45
C5	P.08.01	Riqualificazione edificio ex Scuola Media per realizzazione Centro Volontari	0,00	0,00	0,00
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	90.973,00	90.973,00	75.820,08
TOTALI FASE I			2.958.345,93	2.958.345,93	2.508.430,54
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.965.840,66	1.965.840,66	409.884,65
TOTALI			4.924.186,59	4.924.186,59	2.918.315,19
Importi espressi in euro					

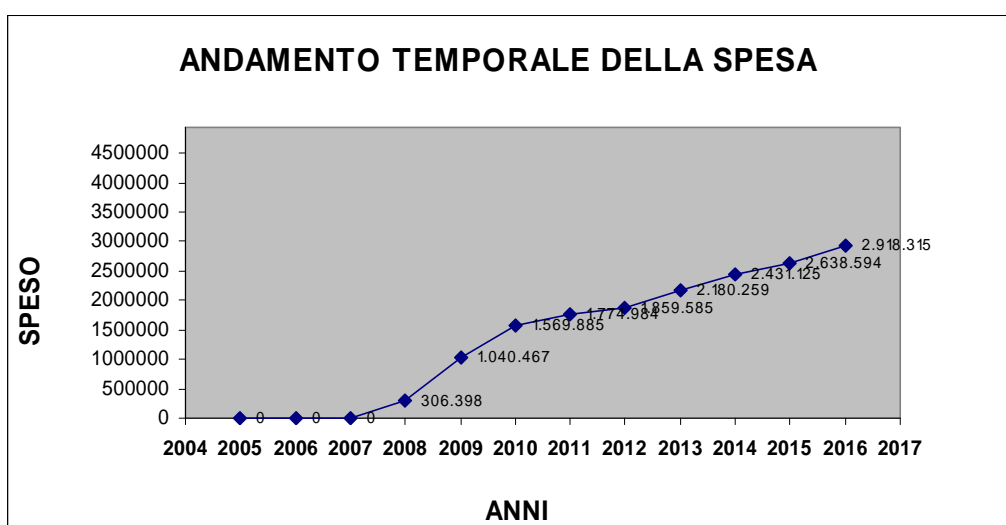


Grafico 6: Andamento temporale della spesa del Comune di Brienza

Tabella 8: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Brindisi Montagna con relativa spesa

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA					
D.P.C. Fase I approvato con DGR n. 796/2006 e 1927/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 0063 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01.a1	Riqualificazione urbana zona Chiesa Maria SS. Delle Grazie.	10.000,00	10.000,00	9.948,88
A1	P.01.01.a2	Riqualificazione urbanistica ed arredo urbano aree urbane e periurbane	235.000,00	187.735,76	187.735,76
A2	P.01.01.a3	Riqualificazione urbanistica ed arredo urbano zona caserma		47.264,24	47.264,24
A1	P.02.01a	Recupero e riutilizzo ex scuola Materna Comunale e opere di completamento	290.000,00	290.000,00	290.000,00
A1	P.03.01	P.I.C. Facciate e coperture centro storico	90.000,00	90.000,00	27.000,00
A1	P.04.01	P.I.C. Casa Sicura	42.500,00	42.500,00	21.250,00
A1	P.05.01	P.I.C. Box Interrati	80.000,00	64.715,52	64.715,52
		P.I.C. Box Interrati. Opere di completamento		15.284,48	0,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione centro storico Via Porta Pia e Corso Garibaldi Via Monte Picone	140.000,00	140.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	Potenziamento Centro ex Scuola Materna Comunale	200.000,00	200.000,00	0,00
A1	P.F2.03.01	PIC - Facciate e delle coperture	60.000,00	60.000,00	0,00
A1	P.F2.04.01	PIC - Casa Sicura	60.000,00	60.000,00	0,00
A1	P.F2.05.01	PIC - Box Interrati	80.000,00	80.000,00	0,00
A1	P.F2.06.01	Fruizione zona castello e aree limitrofe	180.000,00	180.000,00	0,00
A2	P.06.01*	Fruizione torretta castello	150.000,00	150.000,00	136.877,23
A2	P.07.01a	Sistemazione strada Casoni - Porcili - Potenza e completamento	80.000,00	80.000,00	79.365,00
A2	P.07.02b	Sistemazione strada Serra - Ponte dell'Inferno e completamento	80.000,00	80.000,00	79.665,33
A2	P.F2.06.02	Riqualificazione aree urbane e periurbane. Zona Fontana Grande	120.000,00	120.000,00	0,00
A2	P.F2.07.01	Sistemazione strada Aia Chiaffa - Casone	140.000,00	140.000,00	115.213,51
C1	P.08.01*	Costruzione Struttura sportiva polivalente - Campo calcetto e opere di completamento	146.000,00	146.000,00	145.746,86
C1	P.08.02	Completamento e Potenziamento campo di calcio	38.300,00	38.300,00	38.300,00
C1	P.08.03	Ripristino funzionale Palestra Comunale	5.000,00	5.000,00	4.939,42

C1	P.F2.08.01	Completamento impianto sportivo polivalente. Campo di calcetto	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C1	P.F2.08.02	Potenziamento e completamento strutture sportive per la terza età	50.000,00	50.000,00	0,00
C5	P.09.01a	Sistemazione ed attrezzaggio centro di inserimento sociale	183.000,00	183.000,00	138.000,74
C5	P.09.02a	Ristrutturazione immobile da adibire a centro socio - Assistenziale	80.000,00	68.852,10	68.852,10
C5		Ristrutturazione immobile da adibire a centro socio - Assistenziale. Op. completam.		11.147,90	3.147,90
C5	P.F2.09.01	Potenziamento centro inserimento sociale	10.000,00	10.000,00	0,00
C5	P.F2.09.02	Potenziamento Centro socio assistenziale	20.000,00	20.000,00	0,00
		Gestione risorse umane ed attrezzature connesse	75.500,00	75.500,00	75.499,33
	P.F2.10	Gestione risorse umane ed attrezzature connesse	68.392,00	68.392,00	53.764,13
TOTALI FASE I			1.585.300,00	1.585.300,00	1.418.308,31
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.178.392,00	1.178.392,00	218.977,64
TOTALI			2.763.692,00	2.763.692,00	1.637.285,95

Importi espressi in euro

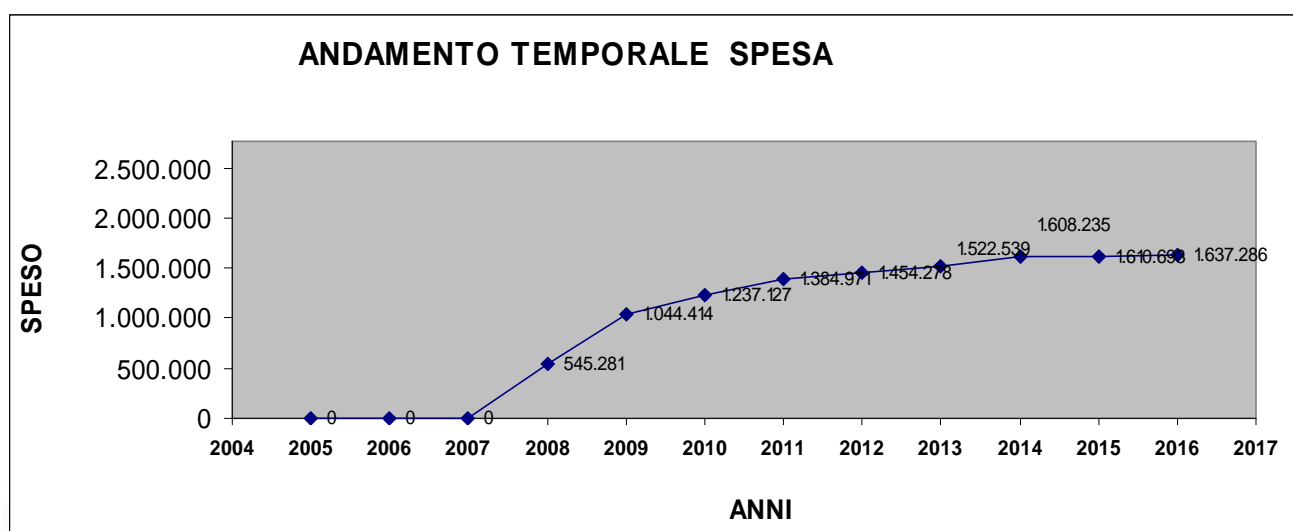


Grafico 7: Andamento temporale della spesa del Comune di Brindisi Montagna

Tabella 9: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Calvello con relativa spesa

COMUNE DI CALVELLO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 657/2006 e 902/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1891 del 10/09/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione area Eredi Andriuzzi	190.000,00	190.000,00	150.171,80
A1	P.01.02	Pubblica Illuminazione centro storico	40.000,00	40.000,00	15.444,00
A1	P.01.03	Arredo urbano Via Roma	50.000,00	50.000,00	15.000,00
A1	P.01.04*	Valorizzazione patrimonio culturale (Progetto Mirabilia)	12.800,00	12.800,00	12.295,00
A1	P.01.06	Miglioramento accessibilità ai rioni Vallone e Castello	60.000,00	60.000,00	41.980,88
A1	P.01.07	Valorizzazione elemento di pregio significativo - Portale in	60.000,00	60.000,00	40.763,98

		bronzo per la Chiesa Madre			
A1	P.01.05	Riqualificazione area monumento ai caduti dei moti 1821-1822.	15.000,00	15.000,00	4.500,00
A1	P.01.10	Completamento toponomastica	17.000,00	17.000,00	0,00
A1	P.03.01a	P.I.C. Facciate e coperture. Attivazione ambito di priorità 1	480.000,00	515.000,00	257.500,00
		Oneri e spese per la gestione dei PIC	35.000,00		
A1	P.04.01	P.I.C. Casa Sicura. Attivazione	63.200,00	63.200,00	18.960,00
A1	P.05.01	P.I.C. Box Interrati. Intervento Via sotto gli Orti.	90.000,00	90.000,00	27.000,00
A1	P.F2.01.11	Riqualificazione urbana del centro storico. Riqualificazione Piazza Garibaldi S. Maria del Plano	110.000,00	110.000,00	83.821,36
A1	P.F2.02.01	Lavori di completamento funzionale del convento S. Maria del Plano e realizzazione museo della ceramica.	290.000,00	290.000,00	336.257,18
			180.000,00	180.000,00	
A2	P.06.01*	Riqualificazione canale S. Lucia	40.000,00	40.000,00	12.000,00
A2	P.06.02*	Valorizzazione Monte Saraceno. Questo intervento è stato spostato al P.F2.06.02	0,00	0,00	0,00
A2	P.06.03*	Riqualificazione naturalistica ed ambientale in località Cacciatizze - Autiero.	142.400,00	142.400,00	119.353,56
A2	P.06.06	Ecopunto. Completamento Ecopunto	28.000,00	28.000,00	0,00
A2	P.07.01a	Sistemazione strada Interpodereale Sorbaro Lago Todaro - Potentissima.	130.000,00	130.000,00	39.000,00
A2	P.07.01b	Sistemazione strada interpodereale Paolino - S. Lucia	130.000,00	130.000,00	89.792,98
A2	P.F2.06.02	Valorizzazione Monte Saraceno e riqualificazione e sistemazione del percorso piazzale	112.600,00	50.000,00	29.185,52
				62.600,00	
A2	P.F2.06.04	Completamento Cacciatizze	22.000,00	22.000,00	19.800,00
A2	P.F2.06.05	Completamento Autiero	56.000,00	56.000,00	0,00
C1	P.08.01	Completamento polo sportivo ricreativo (Parco Cittadino) ed impianti sportivi leggeri	337.900,00	337.900,00	277.859,64
C1	P.F2.08.02	Realizzazione parcheggio a servizio del parco attrezzato - Via Moro	40.000,00	40.000,00	0,00
C1	P.F2.08.03	Realizzazione parcheggio a servizio della piscina - Piazza Gramsci	50.000,00	50.000,00	0,00
C5	P.09.01*	Cofinanziamento alloggio anziani	40.000,00	40.000,00	0,00
C5	P.09.02	Centro sociale ed assistenziale. Casa Famiglia.	200.000,00	200.000,00	108.103,47
C5	P.09.03*	Completamento centro socio educativo. Allestimento Ludoteca.	58.800,00	58.800,00	29.173,20
C5	P.09.06	Ippoterapia.	140.200,00	140.200,00	75.426,98
C5	P.09.07	Arredo parco giochi e centro per l'infanzia	25.000,00	25.000,00	18.984,09
C5	P.F2.09.08	Completamento arredi parco giochi S. Giuseppe	40.000,00	40.000,00	33.984,09
C5	P.F2.09.09	Realizzazione campo ippico	72.500,00	72.500,00	0,00
C5	P.F2.09.10	Completamento ippoterapia	35.000,00	35.000,00	0,00
C5	P.F2.09.11	Arredo Area ludica - Via Aldo Moro	11.713,00	11.713,00	0,00
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	98.000,00	72.000,00	56.338,55
	P.F2.10	Risorse Umane ed attrezzature connesse	22.400,00	22.400,00	0,00
TOTALI FASE I			2.483.300,00	2.457.300,00	1.409.648,13
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.042.213,00	1.042.213,00	503.048,15
TOTALI COMPLESSIVI			3.525.513,00	3.499.513,00	1.912.696,28
Importi espressi in euro					

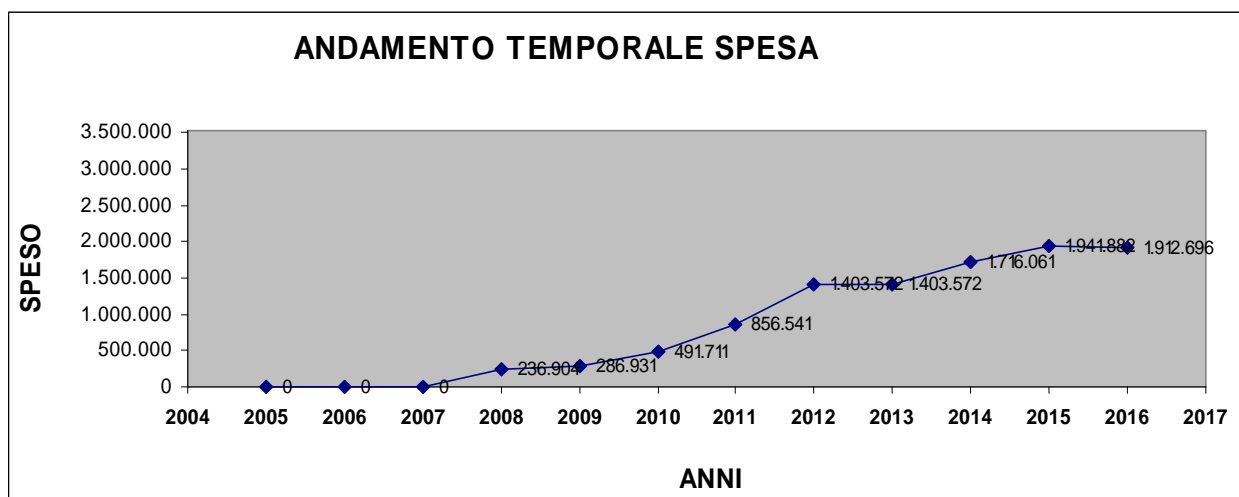


Grafico 8: Andamento temporale della spesa del Comune di Calvello

Tabella 10: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Castelmezzano con relativa spesa

COMUNE DI CASTELMEZZANO					
DPC Fase I presentato e in valutazione			DPC Fase II: è stato appena presentato il DPC Fase I ed è in fase di valutazione		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico	255.000,00		
	P.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	150.507,84		
A2	P.01.01	Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico	148.487,83		
C5	P.03.01	Completamento centro comprensoriale polifunzionale	300.000,00		
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	64.286,58	19.285,97	19.285,97
TOTALI FASE I			918.282,25	19.285,97	19.285,97
TOTALI COMPLESSIVI			918.282,25	19.285,97	19.285,97
Importi espressi in euro					

Tabella 11: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Castelsaraceno con relativa spesa

COMUNE DI CASTEL SARACENO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1468/2006 e 348/2008			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1909 del 13/09/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione facciata municipio e arredo urbano.	112.347,96	112.347,96	112.347,96
A1	P.01.01a	Lavori di sistemazione e arredo urbano Via De Gasperi	14.637,30	14.637,30	13.998,74
A1	P.01.02	Riqualificazione ambientale delle Vie V. Emanuele - Ciro Fontana - Solferino e Via Planula	139.756,28	139.756,28	139.756,28
		Riqualificazione ambientale delle Vie V. Emanuele - Ciro Fontana - Solferino e Via Planula. Opere di completamento. L'economia di questo intervento di € 52.263,72 è stata trasferita al P.06.01		0,00	0,00
A1	P.01.03a	Riqualificazione zona Nord-Est Centro Storico: riqualificazione area Rupe". Di questo intervento € 50.000,00 sono stati trasferiti alla P.06.01, € 50.000,00 al	15.000,00	15.000,00	0,00

		P.01.04 ed € 35.000,00 al P.01.05			
A1	P.01.04	Progetto per lo sviluppo di un sistema di ospitalità diffusa. Questo intervento deriva da parte dello P.01.03a	50.000,00	50.000,00	0,00
A1	P.01.05	Interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo della Torre Saracena. Questo intervento deriva da parte dello P.01.03a	35.000,00	35.000,00	0,00
A1	P.01.06	Riparazione e ripristino funzionale di Via Planula. Questo intervento deriva da parte dello P.01.03a e dall'economia dello P.01.02	102.263,72	50.000,00 52.263,72	24.669,64
A1	P.02.01	P.I.C. Facciate e delle Coperture.	430.000,00	430.000,00	387.000,00
A1	P.F2.01.03a	Riqualificazione itinerario zona Nord est Centro storico Area Via Ciro Fontana. Questo intervento di € 40.000,00 è stato accorpato al P.F2.05.06 Miglioramento e adeguamento funzionale cimitero	0,00	0,00	0,00
A1	P.F2.01.03c	Riqualificazione itinerario zona Nord est Centro storico recupero unità abitative. Questo intervento di € 50.000,00 è stato accorpato al P.F2.05.06 Miglioramento e adeguamento funzionale cimitero	0,00	0,00	0,00
A1	P.F2.02.01	PIC. Facciate e delle Coperture. Parte di questo intervento è passato al P.F2.02.01a	70.987,58	70.987,58	70.987,58
A1	P.F2.02.01a	Lavori di riqualificazione ed arredo urbano del centro abitato e dei nuclei rurali Frusci e Miraldo. 1° Lotto. Barriere stradali. Prima l'intervento era PIC facciate e coperture. Poi è stato scisso in due.	290.958,42	290.958,42	191.253,53
A2	P.05.01a	Intervento di protezione paesistica e riqualificazione ambientale del fiume Racanello - Itinerario dei mulini	77.000,00	61.629,00	18.488,70
		Intervento di protezione paesistica e riqualificazione ambientale del fiume Racanello - Itinerario dei mulini. Opere di completamento		15.371,00	0,00
A2	P.05.02a	Intervento di riqualificazione ambientale e valorizzazione dei tratturi Regi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A2	P.05.03	Lavori di sostituzione e sistemazione infissi esterni del centro didattico ambientale Bosco Favino.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A2	P.06.01	Lavori di Manutenzione straordinaria strada Miraldo.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A2	P.06.02	Sistemazione viabilità rurale e/o illuminazione pubblica zone Miraldo, Giordanello, Frusci ed altre	259.241,52	230.774,96	230.774,96
		Sistemazione viabilità rurale e/o illuminazione pubblica zone Miraldo, Giordanello, Frusci ed altre. Opere di completamento		28.466,56	27.382,38
A2	P.F2.05.05	Riqualificazione Ambientale. Lavori di manutenzione straordinaria della Villa comunale sita sul Largo Canal di Flora	60.000,00	60.000,00	18.000,00
A2	P.F2.05.06	Miglioramento e adeguamento funzionale cimitero. Questo intervento nella prima approvazione non c'era. Con variazione della scheda progetto sono stati eliminati gli interventi P.F2.01.03a di € 40.000,00 e P.F2.01.03c di € 50.000,00,	90.000,00	90.000,00	89.196,70
A2	P.F2.06.03	Sistemazione Strade Rurali Miraldo	100.000,00	100.000,00	98.538,50
A2	P.F2.06.04	Sistemazione Strade Rurali S. Lorenzo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A2	P.F2.06.05	Lavori di sistemazione museo della Pastorizia	100.000,00	100.000,00	88.104,84
C1	P.07.01	Sistemazione attrezzature sportive in località Frusci e completamento	133.020,00	133.020,00	133.020,00
C1	P.07.02*		619.830,00	202.430,00	92.974,50
C5	P.08.01	Complesso Sportivo, Socio Assistenziale e di volontariato		417.400,00	
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	93.450,00	93.450,00	93.450,00
	P.F2.10	Risorse Umane ed attrezzature connesse	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALI FASE I			2.241.546,78	2.241.546,78	1.433.863,16
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			768.946,00	768.946,00	613.081,15
TOTALI COMPLESSIVI			3.051.246,00	3.010.492,78	2.046.944,31

Importi espressi in euro

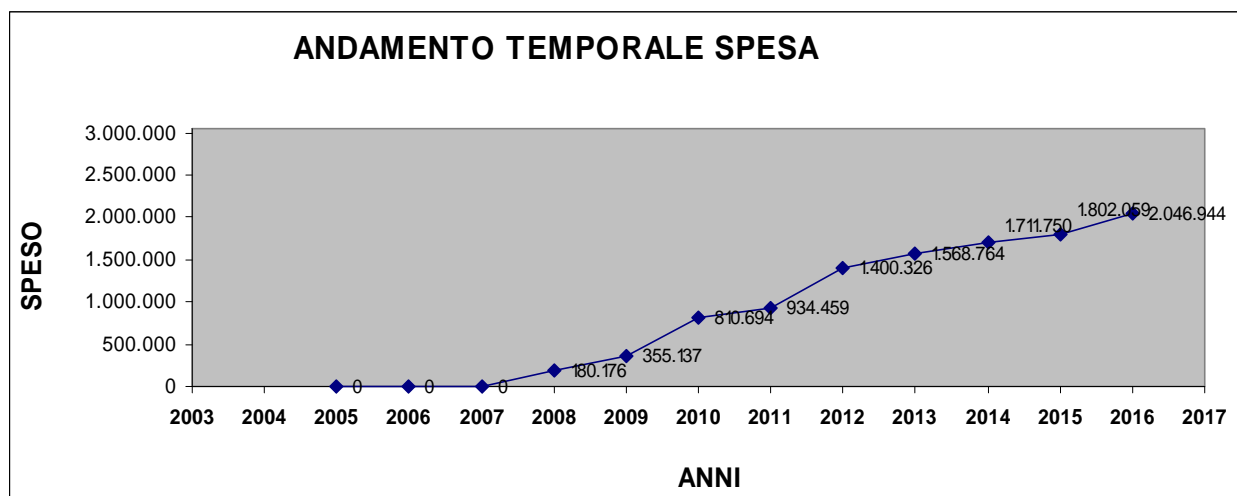


Grafico 9: Andamento temporale della spesa del Comune di Castelsaraceno

Tabella 12: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Cirigliano con relativa spesa

COMUNE DI CIRIGLIANO					
DPC Fase I presentato e in valutazione			DPC Fase II: è stato appena presentato il DPC Fase I ed è in fase di valutazione		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e arredo urbano Piazza IV Novembre Corso Umberto 1°	115.000,00		
	P.01.02	Recupero zona antico lavatoio	30.000,00		
	P.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	250.330,59		
A2	P.03.01	Riqualificazione edificio comunale turistico località "Acquafurr"	60.000,00		
	P.04.01	Sistemazione strada località "Tempa di Falco - Salegrino"	130.000,00		
C1	P.05.01	Sistemazione impianti sportivi	100.000,00		
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	51.584,00	15.475,20	15.475,20
TOTALI FASE I			736.914,59	15.475,20	15.475,20
TOTALI COMPLESSIVI			736.914,59	15.475,20	15.475,20

Importi espressi in euro

Tabella 13: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Corleto Perticara con relativa spesa

COMUNE DI CORLETO PERTICARA					
D.P.C. Fase I Appr. Con DGR 1680/2005, DGR 648/2006 e DGR 903/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 755 del 25/03/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione urbana Rione Costa.	80.000,00	62.782,58	62.782,58
		Riqualificazione urbana Rione Costa. Opere di completamento		17.217,42	17.217,42
A1	P.01.02	Riqualificazione Urbana Vico Plebiscito	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A1	P.01.03	Riqualificazione ed Arredo Urbano Centro Storico	350.000,00	275.282,63	275.282,63

A1	P.01.03a	Riqualificazione ed Arredo Urbano Centro Storico. Opere di miglioramento e di completamento.		74.717,37	68.989,18	
A1	P.01.04	Riqualificazione urbanistica e arredo urbano Via Ariosto collegamento rione Costa.	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione centro storico. Via Nazionale, Corso Lacava, Piazza Plebiscito e Piasseggiata sotto gli archi del ponte.	150.000,00	150.000,00	142.389,50	
A1	P.F2.02.01	Sistemazione sala polifunzionale Zi Nick	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
A1	P.03.01*	PIC Facciate e coperture. Attivazione Ambito Pilota	50.000,00	50.000,00	15.000,00	
A1	P.03.02	PIC Facciate e coperture. Attivazione Ambito Priorità	200.000,00	200.000,00	60.000,00	
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura	122.000,00	122.000,00	61.000,00	
A1	P.F2.04.01	PIC - Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	60.000,00	60.000,00	0,00	
A1	P.05.01*	PIC Box Interrati. Intervento Via Albini. Nella prima e nella seconda approvazione l'intervento era PIC Box interrati. Intervento Pilota per gli stessi importi.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
A1	P.F2.05.01	PIC - Casa Sicura	120.000,00	120.000,00	0,00	
A1	P.F2.08.01	Recupero ex Municipio. Questo intervento è a completamento dei due interventi P. 02.01a di € 220.000,00 totali di cui € 175.000,00 a carico PO e € 45.000,00 comunali e P.02.01b di € 47,260,00 tutti a carico del PO della prima fase. Con DD N. del 13/01/2011 è stata apportata una ulteriore modifica al DPC facendo scomparire gli interventi P.F2.03.01 Sistemazione Piazza Coperta Municipio di € 105.000,00 e P.F2.03.02 Sale Mostra sulla storia Risorgimentale e post unitaria lucana - Intesa Zanardelli di € 300.000,00.	405.000,00	105.000,00	105.000,00	
					300.000,00	0,00
			222.260,00	175.000,00	52.500,00	
				47.260,00	0,00	
			160.000,00	160.000,00	0,00	
A2	P.06.01	Sentieristica Ippoturismo e Antichi tratturi.		47.314,52	47.314,52	
		Sentieristica Ippoturismo e Antichi tratturi. Opere di completamento	65.000,00	17.685,48	17.685,48	
A2	P.07.01a*	Sistemazione Area Spunnituro - I Stralcio	100.000,00	100.000,00	99.413,96	
A2	P.07.01b	Sistemazione Area Spunnituro. Completamento	296.000,00	296.000,00	258.621,43	
A2	P.07.02	Lavori di Realizzazione Acquedotto Bandiera.			52.452,35	
		Lavori di Realizzazione Acquedotto Bandiera. Opere di completamento migliorative	67.000,00	67.000,00	14.412,57	
A2	P.F2.07.01	Sistemazione strada Zaccanella	132.800,00	132.800,00	0,00	
A2	P.F2.07.02	Sistemazione acquedotto rurale "Montagna Rasa" e "Saulo Montagna"	50.000,00	33.851,36	33.851,36	
		Sistemazione acquedotto rurale "Montagna Rasa" e "Saulo Montagna". Opere di completamento		16.148,64	16.030,65	
A2	P.F2.07.03	Messa in sicurezza viabilità rurale	50.000,00	50.000,00	15.000,00	
C1	P.08.01	Palestra Polivalente		66.817,23	66.817,23	
		Palestra Polivalente. Opere di completamento	100.000,00	7.359,41	0,00	
C1	P.08.03	Sistemazione Campo di Tiro a volo	64.000,00	64.000,00	63.290,92	
C5	P.09.01	Completamento Casa per Anziani	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
C1	P.F2.09.01	Polo sportivo ricreativo. Questo intervento è di completamento con il P.08.02 Polo ricreativo Gersa della I Fase e scompare la quota pubblica di € 77.486,50.	250.000,00	250.000,00	299.997,03	
			50.000,00	50.000,00		
C1	P.F2.09.02	Lavori di completamento del campo di calcio comunale. Impianto di illuminazione	130.000,00	130.000,00	100.506,68	
C5	P.F2.10	Lavori di sistemazione edificio Ludoteca. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.09.03 - Ludoteca della Fase I. L'importo precedente è stato decurtato della quota Comunale di € 6.400,00	70.000,00	70.000,00	65.145,68	
			24.000,00	24.000,00		
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	158.840,00	161.360,00	126.487,41	
	P.F2.11	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	65.014,00	65.014,00	34.479,49	
TOTALI FASE I			2.416.840,00	2.393.536,64	2.070.767,68	
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.979.074,00	1.979.074,00	904.900,39	
TOTALI COMPLESSIVI			4.395.914,00	4.372.610,64	2.975.668,07	
Importi espressi in euro						

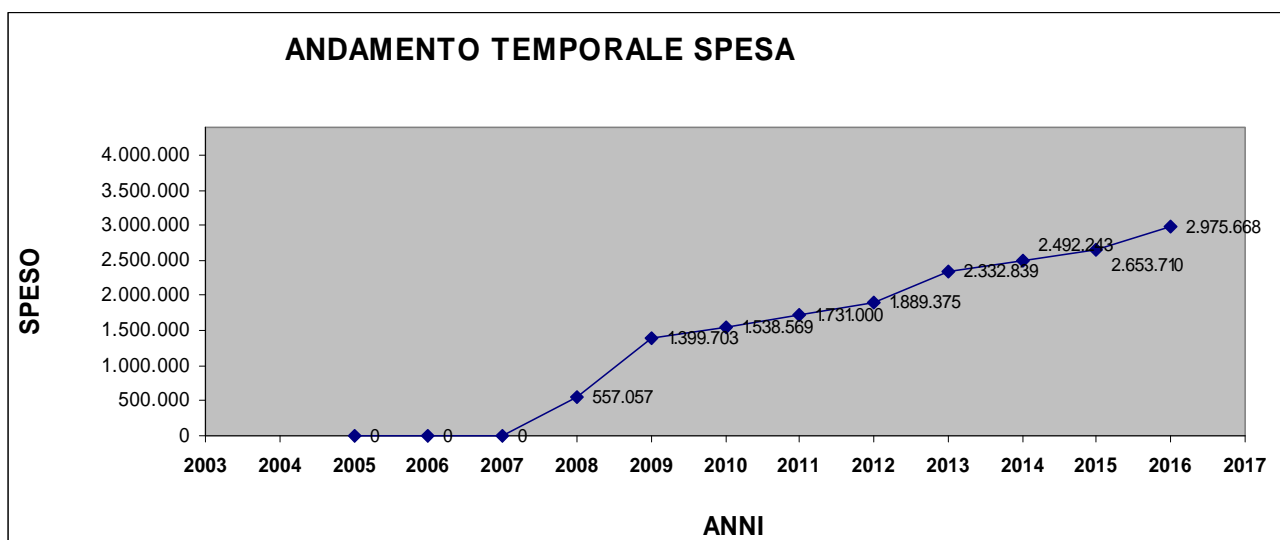


Grafico 10: Andamento temporale della spesa del Comune di Corleto Perticara

Tabella 14: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Gallicchio con relativa spesa

COMUNE DI GALLICCHIO					
D.P.C. Fase I Appr. Con DGR 272/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1441 del 18/06/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
C1	P.01.01	Completamento area impianti sportivi. Campo da bocce e da tennis.	71.400,43	71.400,43	71.400,43
C1	P.01.02*	Ammodernamento e completamento dell'impianto campo sportivo.	79.667,56	79.667,56	79.509,02
C1	P.01.03	Recupero edificio torre dell'orologio comunale adibito a palestra e scuola media inferiore. È stata variata la scheda progetto e a questo intervento è stato accorpato il P.F2.04.01 della Fase II Recupero edificio torre dell'orologio - Palestra per € 71.671,00, per un totale di € 183.018,61	56.832,01	183.018,61	160.887,50
			54.515,60		
			71.671,00		
C1	P.F2.04.01	Recupero Torre dell'orologio. III Lotto. Palestra. Questo intervento è stato spostato alla Fase I al P.01.03 per € 71.671,00	0,00	0,00	0,00
A2	P.02.01*	Acquedotto Rurale Cervone - Santa Lucia.	124.300,00	124.300,00	103.220,28
		Acquedotto Rurale Cervone - Santa Lucia. Opere di completamento			21.079,72
A2	P.02.02	Acquedotto Santa Lucia Il Stralcio - destra Aliano	116.000,00	116.000,00	100.881,39
A2	P.02.07	Interventi di elettrificazione Contrade rurali Santa Lucia e c/da Piagge	5.200,00	5.200,00	5.199,49
A2	P.02.08	Lavori di realizzazione tronchi di acquedotto rurale in Contrada Buscalupo. Questo intervento prima non c'era. È stato attivato con l'economia dell'intervento P.02.02	15.118,61	15.118,61	15.118,61
A2	P.02.11	Intesa tra i comuni. Rete dei paesaggi	10.000,00	10.000,00	1.375,00
A1	P.F2.01.01	Riqualficazione ed arredo urbano Piazza Papa Giovanni XIII	449.960,00	449.960,00	403.154,05
A1	P.F2.02.01	Riqualficazione funzionale area Piazza Papa Giovanni XXIII)	50.040,00	50.040,00	50.040,00
A1	P.F2.03.01	Recupero e riqualficazione Antico Abitato	148.000,00	148.000,00	0,00
A1	P.04.01	Recupero borgo antico. Comparto 2	65.100,51	65.100,51	0,00
A1	P.04.03	Recupero borgo antico. Comparto 17	306.346,31	206.346,31	261.782,74
A1				100.000,00	

A1	P.04.04	Recupero borgo antico. Comparto 18	381.386,18	281.386,18	380.759,44
A1				100.000,00	
A1	P.05.01	PIC Casa Sicura	19.057,05	19.057,05	5.717,12
A1	P.05.02	PIC Facciate e coperture	139.041,26	139.041,26	103.613,32
A1	P.03.01*	Recupero palazzo baronale (ludoteca e centro diurno giovanile)	81.100,00	65.500,00	81.100,00
C5				15.600,00	
C5	P.03.02	Acquisto e recupero palazzo Mazziotta (centro diurno anziani)	170.000,00	170.000,00	169.923,37
		Risorse umane ed attrezzature connesse	45.568,68	34.068,68	32.068,68
		Risorse umane ed attrezzature connesse	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALI FASE I			1.812.305,20	1.800.805,20	1.593.636,11
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			656.000,00	656.000,00	453.194,05
TOTALI COMPLESSIVI			2.468.305,20	2.456.805,20	2.046.830,16

Importi espressi in euro

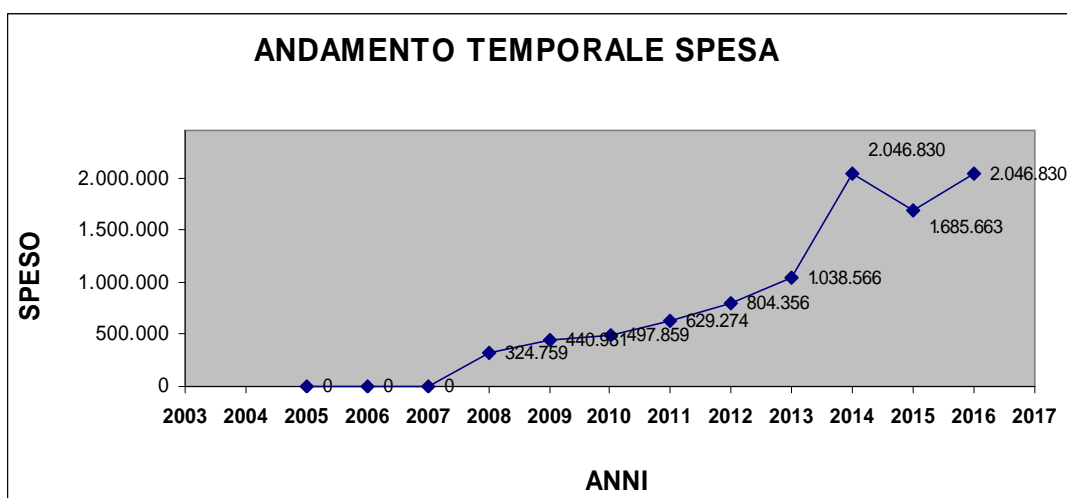


Grafico 11: Andamento temporale della spesa del Comune di Gallicchio

Tabella 15: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Gorgoglione con relativa spesa

COMUNE DI GORGOGLIONE					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1931/2005, DGR 350/2006, DGR 963/2006, DGR 1776/2007 e DGR 1061/2008			D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 973 del 14/04/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione urbana Piazza Castello			
		Riqualificazione urbana Piazza Castello. Opere di completamento.	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A1	P.01.02*	Riqualificazione urbana Via Mergoli			
		Riqualificazione urbana Via Mergoli. Opere di completamento.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A1	P.01.03	Riqualificazione urbana Centro Storico. € 15.277,41 l'economia di questo intervento che era di complessivi € 104.600,00 è stata accorpata al P.F2.01.01. € 15.277,41 di questo intervento sono stati spostati al P.F2.01.01	89.322,59	89.322,59	89.322,59
A1	P.06.02	Completamento strada rurale Gorgoglione - Cirigliano. Questo intervento deriva da P.01.04 Riqualificazione Via Fontana di complessivi € 120.000,00	80.000,00	80.000,00	59.995,18
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione e arredo zona Via Roma e Via Fontana	197.514,88	197.514,88	197.514,88
		Riqualificazione e arredo zona Via Roma e Via Fontana. Opere di completamento. Questo intervento viene fuori	27.762,53	27.762,53	15.270,07

		dall'economia dell'intervento precedente di € 12.485,12 e quella del P.01.03 di € 15.277,41			
A1	P.F2.01.02	Piano Ringhiere. A questo intervento è stata accorpata l'economia dell'int. P.08.02 della Fase I di € 16.753,76	66.753,76	50.000,00 16.753,76	66.753,76
A1	P.F2.01.03	Sistemazione area Scuola Materna	52.500,00	52.500,00	51.959,84
A1	P.F2.02.01	PIC - Casa Sicura.	150.000,00	150.000,00	135.000,00
A1	P.F2.03.01	PIC - Riqualificazione Formale delle facciate e delle coperture.	70.000,00	70.000,00	35.000,00
A1	P.03.01*	PIC Facciate e coperture. Ambito pilota.		153.400,00	
A1	P.03.02	PIC Facciate e Coperture. Ambito di priorità.	276.000,00	122.600,00	248.400,00
A1	P.04.01	PIC Casa sicura. Attivazione.	147.000,00	50.000,00 97.000,00	147.000,00
A2	P.F2.04.01	Completamento sistemazione Madonna del Pergamo. A questo intervento di € 50.000,00 è stata accorpata l'economia dell'int. P.05.01 di € 18.032,25	68.032,25	68.032,25	61.099,02
A2	P.F2.04.02	Miglioramento e fruizione aree forestali	12.269,97	7.062,19 5.207,78	11.330,72
		Risanamento ambientale accessibilità e sentieristica per la fruibilità della Madonna del Pergamo.		101.967,75	101.967,75
A2	P.05.01	Risanamento ambientale accessibilità e sentieristica per la fruibilità della Madonna del Pergamo. Opere di completamento. Questa economia di € 18.032,25 è stata spostata all'int. P.F2.04.01	101.967,75	0,00	0,00
A2	P.F2.05.01	Sistemazione strada Sant'Angelo	60.000,00	60.000,00	57.302,87
A2	P.F2.05.02	Sistemazione strade Cugno Teodoro e SC per Guardia Perticara	62.000,00	62.000,00	54.937,81
A2	P.06.01	Elettificazione Contrada Monte.	52.000,00	52.000,00	52.000,00
C1	P.F2.06.01	Sistemazione e potenziamento impianti sportivi Fosso Vallone e Pergamo. In questo intervento è stato incluso quello P.07.01 pari a € 50.000,00 più una economia fase I PO di € 3.852,28 ed € 6.688,35 di risorse comunali	69.852,28	50.000,00 3.852,28 16.000,00	64.644,22
C1	P.07.02	Sistemazione Palestra Comunale.	170.500,02	139.037,58	139.037,58
C1	P.07.03	Ristrutturazione, completamento ed abbattimento barriere architettoniche dell'impianto sportivo polivalente "Madonna del Pergamo".	24.500,00	24.500,00	20.647,72
C5	P.08.01	Sistemazione e riqualificazione vecchio cimitero.	190.000,00	173.000,00 17.000,00	174.897,44
C5	P.08.02	Sistemazione strutture ambulatoriali. La somma programmata in più di € 2.500,00 è stata reinvestita nelle risorse umane	99.500,00	99.500,00	82.746,24
C5	P.F2.07.01	Completamento Sistemazione e riqualificazione vecchio cimitero. A Questo intervento di € 72.000,00 sono stati aggiunti € 40.000,00 derivanti dal P.01.04 Riqualificazione Via Fontana di complessivi € 120.000,00	112.000,00	72.000,00 40.000,00	100.074,75
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse. Sono state reinvestite in questo intervento € 2.500,00 del P.08.02	116.930,00	116.930,00	86.466,53
	P.F2.08	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse.	56.266,00	56.266,00	33.237,96
TOTALI FASE I			1.597.720,36	1.597.720,36	1.483.836,47
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.004.951,67	1.004.951,67	884.125,90
TOTALI			2.602.672,03	2.602.672,03	2.367.962,37
Importi espressi in euro					

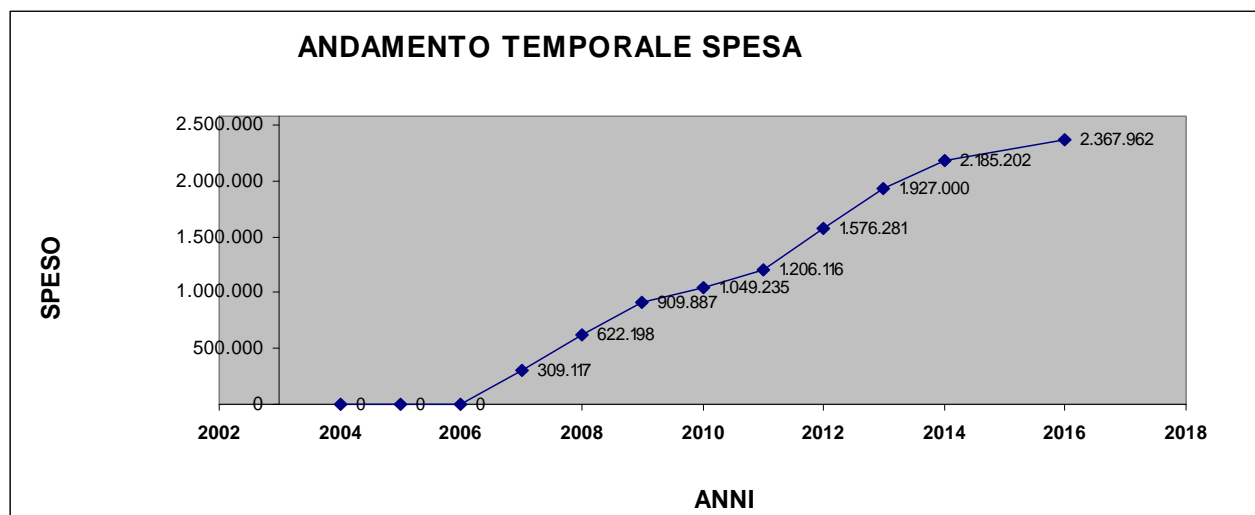


Grafico 12: Andamento temporale della spesa del Comune di Gorgogione

Tabella 16: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Grumento Nova con relativa spesa

COMUNE DI GRUMENTO NOVA					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 646/2006, DGR 282/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 1018 del 15/04/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	PIC Facciate e coperture. Opere di adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e delle coperture.	287.464,00	287.464,00	0,00
A1	P.02.01	PIC Casa Sicura.	142.500,00	142.500,00	42.750,00
A1	P.F2.04.06	Completamento intervento sistemazione piazza Aurora Sanseverino	260.000,00	260.000,00	219.543,10
A1	P.F2.07.01	Progetto di area vasta. Interventi di ricicatura funzionale Scavi di Grumentum - Lago del Pertusillo - Aree di particolare valenza paesistica ed ambientale. Il Lotto.	172.030,00	172.030,00	0,00
C1		330.000,00	330.000,00		
A1	P.03.01	Opere di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del Palazzo Giliberti di proprietà comunale.	376.000,00	226.000,00	368.009,80
C5		Lavori di consolidamento e ripristino dell'area destinata ad attività Socio Assistenziali di Palazzo Giliberti.		150.000,00	
A1	P.04.01	Interventi di sistemazione della Piazza Aurorra Sanseverino	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A1	P.04.02	Intervento di infrastrutturazione di Via Garibaldi - Via C. Danio - Via Toscano	150.000,00	150.000,00	142.540,96
A1	P.04.03	Intervento di infrastrutturazione del tratto Piazza Umberto I - Piazza Arciprete Caputi.	175.000,00	175.000,00	164.040,63
C5	P.05.01	Adeguamento edilizio e tecnologico ludoteca (ex mattatoio)	160.802,00	139.608,43	125.647,59
		Economie da ribasso d'Asta		21.193,57	0,00
C1	P.06.02	Adeguamento funzionale Palestre comunali	90.000,00	90.000,00	77.189,30
C1	P.F2.06.01	Adeguamento funzionale della piscina comunale, del campo sportivo (impianto adduzione idrica) e degli impianti del campo polivalente.	185.000,00	185.000,00	0,00
		98.034,00	98.034,00	0,00	
A2	P.08.01	Completamento pubblica illuminazione rurale.	90.000,00	90.000,00	0,00
A2	P.09.01	Lavori di completamento delle strutture turistiche alla località Bosco Maglie	30.000,00	30.000,00	0,00
A2	P.F2.08.02	Completamento pubblica illuminazione aree rurali	42.897,00	42.897,00	42.897,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	92.000,00	92.000,00	90.454,27
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALI FASE I			1.793.766,00	1.793.766,00	1.210.632,55
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.102.961,00	1.102.961,00	262.440,10
TOTALI			2.896.727,00	2.896.727,00	1.473.072,65

Importi espressi in euro

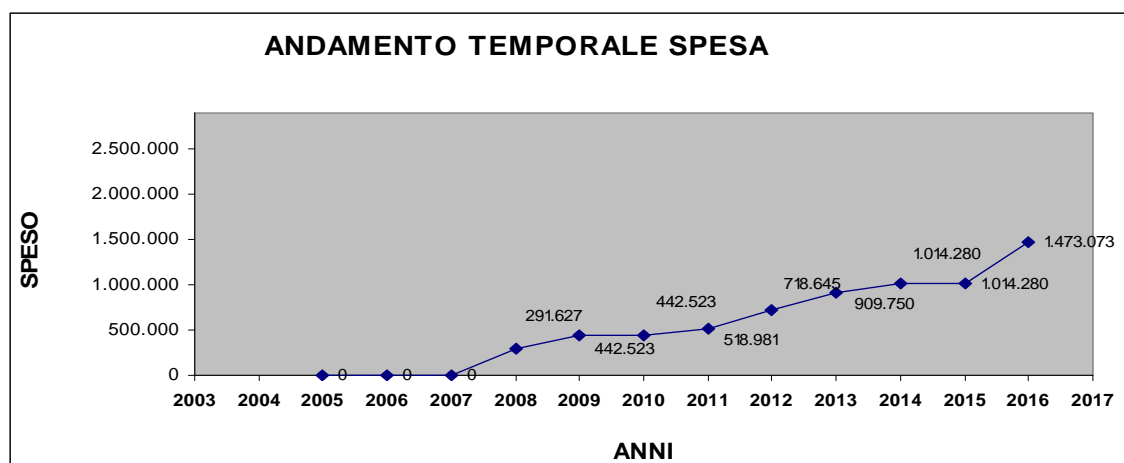


Grafico 13: Andamento temporale della spesa del Comune di Grumento Nova

Tabella 17: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Guardia Perticara con relativa spesa

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1930/2005 e DGR 1154/2009			D.P.C. Fase II - Approvato con DD n. 1894 del 06/09/2011		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.F2.01.01	Completamento Palazzo Montano. A questo intervento sono stati incorporati e rimodulati n. 5 interventi della fase I per complessivi € 470.000,00: P.05.01 per € 220.000,00, P.01.01 per € 80.000,00, P.03.01a per € 50.000,00, P.04.01 per € 50.000,00	1.000.000,00	530.000,00 470.000,00	380.000,00
A1	P.01.01b*	Realizzazione della cartografia numerica.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A1	P.02.01	Recupero e riutilizzo del Palazzo Montano. Recupero e riutilizzo del Palazzo Montano. Opere di completamento	300.000,00	274.899,26 25.100,74	274.899,26 0,00
A2	P.07.01*	Adeguamento acquedotto rurale	53.420,00	53.420,00	48.328,18
A2	P.07.02*	Sistemazione strade Fosso Papone e S. Lucia Lupara	100.000,00	100.000,00	74.039,08
A2	P.07.03	Sistemazione viabilità rurale	143.680,00	143.680,00	143.680,00
C1	P.F2.02.01	Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero. A questo intervento è stato accorpato l'int. P.08.02 della Fase I.	100.000,00	30.000,00 70.000,00	5.515,54 70.000,00
C1	P.08.01	Sistemazione campo sportivo	104.000,00	104.000,00	73.880,00
C5	P.09.01	Polo della solidarietà	236.000,00	236.000,00	0,00
C5	P.09.02	Sistemazione ambulatorio	15.000,00	15.000,00	0,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	16.748,18	16.748,18	0,00
TOTALI FASE I			1.088.100,00	1.088.100,00	750.826,52
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.116.748,18	1.116.748,18	455.515,54
TOTALI COMPLESSIVI			2.204.848,18	2.204.848,18	1.206.342,06

Importi espressi in euro

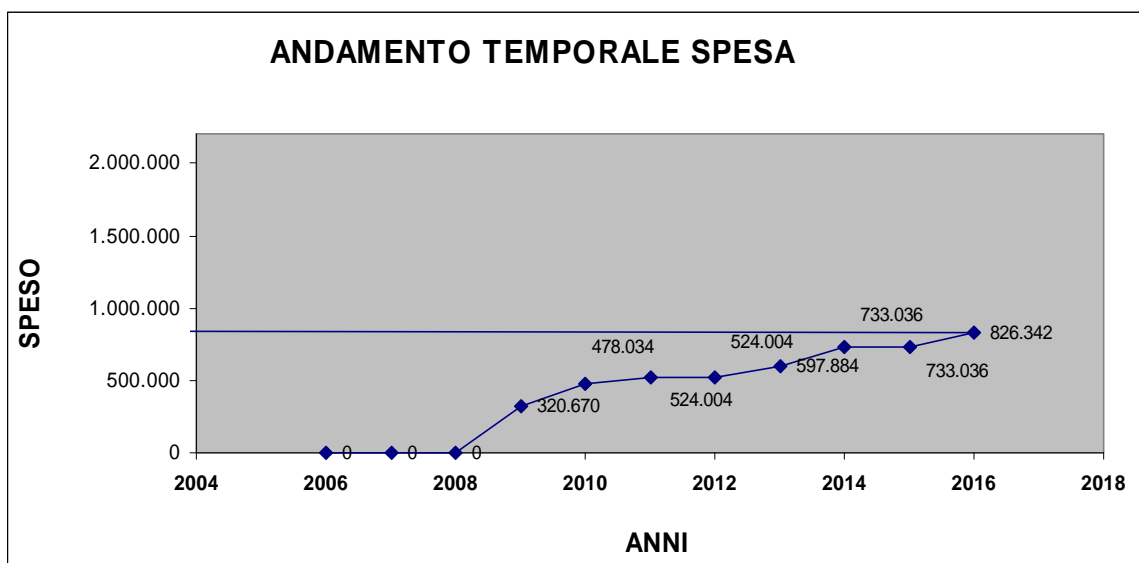


Grafico 14: Andamento temporale della spesa del Comune di Guardia Perticara

Tabella 18: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Laurenzana con relativa spesa

COMUNE DI LAURENZANA					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1300/2006, DGR 1928/2006 e DGR 349/2008			D.P.C. Fase II Approvato con DD 760 del 25/03/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione urbanistica Piazza S. Silvestro	158.403,10	158.403,10	158.403,10
A1	P.01.01a*	Riqualificazione urbanistica Piazza S. Silvestro. Opere di completamento	44.596,90	44.596,90	44.596,90
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione Piazza Dante Alighieri. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.01.02 - Riqualificazione Piazza Dante Alighieri della Fase I di € 47.000,00	153.000,00 47.000,00	153.000,00 47.000,00	200.000,00
A1	P.F2.01.02	Piano sistemazione marciapiedi	72.000,00	72.000,00	17.838,44
A1	P.02.01*	Completamento polifunzionale	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A1	P.02.02	Recupero Palazzo Graziadei	320.000,00	320.000,00	318.886,07
A1	P.F2.02.01	Rifunzionalizzazione Zone Castello. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.08.02 - Pista di Karting attrezzata della Fase I di € 280.000,00	350.000,00	70.000,00 280.000,00	303.245,58
A1	P.F2.02.02	Recupero Palazzo Montagnoli	142.715,79	142.715,79	0,00
A1	P.F2.02.03	Riqualificazione energetica e recupero dell'istituto comprensivo V. Alfieri. Con D.D. N. 1644 del 10/08/2012 è Stata Variata la scheda progetto prendendo parte dell'intervento P.F2.02.01 - Rifunzionalizzazione zone Castello e cioè € 50.000,00 e sono stati impegnati altri € 250.000,00	300.000,00	300.000,00	297.276,08
A1	P.02.03	Rifunzionalizzazione zona Castello. Prima l'intervento era: Pic facciate e coperture per € 100.000,00; PIC Casa Sciura per € 52.000,00, PIC Box interrati per € 190.000,00	342.000,00	100.000,00 52.000,00 95.000,00 95.000,00	13.283,60
A1	P.F2.03.01	PIC Box Interrati	95.000,00	95.000,00	0,00
A2	P.06.02	Riqualificazione area periferica zona S. Filomena	90.000,00	90.000,00	80.930,30
A2	P.06.03	Riqualificazione fruibilità zona Castello e Chiesa madre	135.000,00	135.000,00	69.448,51
A2	P.07.01	Sistemazione strada Santi Quaranta - Castelbello	170.000,00	170.000,00	51.000,00

A2	P.F2.04.01	Valorizzazione e fruibilità zona Abetina. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.06.01 - Valorizzazione e fruibilità zona Abetina della Fase I DI € 75.000,00	180.000,00	180.000,00	
			75.000,00	75.000,00	198.405,66
A2	P.F2.04.02	Riqualificazione e fruibilità zona Largo Fiera	30.000,00	30.000,00	28.946,82
C1	P.08.01*	Illuminazione campo di calcio	50.437,00	50.437,00	50.437,00
		Illuminazione campo di calcio. Opere di completamento migliorative			
C1	P.F2.05.01	Potenziamento piscina comunale. A questo intervento è stato incorporato l'int. P.08.03 - Potenziamento piscina comunale della I Fase di € 54.363,00	101.637,00	101.637,00	
			54.363,00	54.363,00	156.000,00
C5	P.09.01*	Realizzazione Eliporto	50.000,00		0,00
C5	P.09.02	Casa Ospitalità per anziani. Recupero ex casa mandamentale	482.500,00	482.500,00	482.500,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	84.000,00	84.000,00	64.363,00
	P.F2.06	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	75.805,00	75.805,00	12.240,00
TOTALI FASE I			2.046.937,00	1.996.937,00	1.453.848,48
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.676.520,79	1.676.520,79	1.213.952,58
TOTALI COMPLESSIVI			3.723.457,79	3.673.457,79	2.667.801,06
Questo importo è stato detratto dal totale complessivo in quanto l'intervento P.F2.02.03 è stato originariamente portato in DPC con un finanziamento di soli € 50.000,00. Successivamente con variazione della Scheda Progetto, lo stesso intervento è stato incrementato con € 250.000,00 finanziati extra DPC. Di conseguenza pur facendo parte integrante dello stesso intervento non concorrono alla dotazione finanziaria complessiva assegnata per i DPC			250.000,00	250.000,00	195.485,13
TOTALI COMPLESSIVI			3.473.457,79	3.423.457,79	2.472.315,93
Importi espressi in euro					

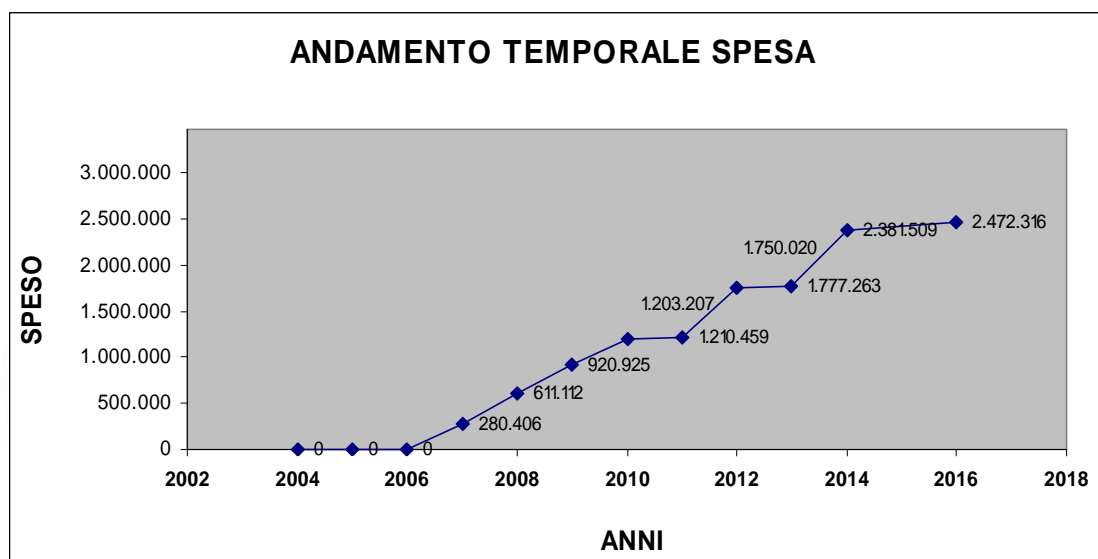


Grafico 15: Andamento temporale della spesa del Comune di Laurenzana

Tabella 19: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Marsiconuovo con relativa spesa

COMUNE DI MARSICONUOVO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1551/2006, 1774/2007 e 469/2009			D.P.C. Fase II Approvato con DD 253 del 10/02/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Completamento intervento funzionale area S. Donato	70.000,00	70.000,00	69.596,73
A1	P.01.02	Riqualificazione percorsi prioritari centro storico	230.000,00	230.000,00	230.000,00

A1	P.02.02	Collegamento verticale Viale Regina Margherita - Rione Civita. Questo intervento prima non c'era. È stata rimodulata la S.P.	610.000,00	610.000,00	91.500,00
A1	P.03.01	Completamento salone S. Francesco	40.000,00	40.000,00	39.880,89
A1	P.02.02	Adeguamento Chiesa S. Michele per Museo	30.000,00	30.000,00	27.000,00
A1	P.02.04	Completamento ex Seminario e Palazzo Vescovile per casa anziani. Questo intervento per € 175.000,00 in A1 ed € 163.305,00 in C5 è stato trasferito alla P.F2.02.04			
C5					
A1	P.03.	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato ex liceo Scientifico	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A1	P.03A.05	Adeguamento riqualificazione barriere architettoniche Casa Palazzo Pignatelli	164.554,00	164.554,00	164.079,19
A1	P.F2.01.04	Sistemazione delle strade San Nicola, Via Capano, Salita Tocco e aree limitrofe	140.310,00	140.310,00	140.133,98
A1	P.F2.01.06	Sistemazione largo San Gianuario e Via Sant'Angelo	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A1	P.F2.02.03	Lavori di riqualificazione urbana dell'area della villa comunale con l'utilizzo di parcheggi esistenti a valle mediante un sistema di ascensori e recupero funzionale dello spazio sottostante l'area gioco per la realizzazione di un auditorium e l'ampliamento e adeguamento parco giochi.	1.535.031,00	150.000,00	1.350.000,00
				193.174,00	
				90.062,00	
				440.000,00	
				260.000,00	
				366.764,00	
35.031,00					
A1	P.F2.02.04	Lavori di completamento fabbricato ex seminario e palazzo vescovile per realizzazione casa di riposo per anziani. Prima questo intervento non c'era. Con la rimodulazione del DPC è stato inserito prendendo risorse della fase I e della Fase II	916.502,00	8.377,30	576.361,22
				151.500,00	
				18.339,39	
				200.000,00	
				18.312,34	
				208.517,85	
				91.650,20	
				62.173,94	
				91.650,20	
65.980,78					
A2	P.05.01	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e riqualificazione ambientale dell'area Fontanelle-San Donato.	125.000,00	125.000,00	106.687,66
A2	P.06.01*	Interventi di riqualificazione dei centri rurali	70.000,00	70.000,00	69.942,69
A2	P.06.02	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Tempa ecc. + Opere di completamento	250.000,00	250.000,00	249.661,33
A2	P.06.03	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Pergola, San Vito, Ginestole. + Opere di completamento	200.000,00	200.000,00	199.632,46
A2	P.06.05	Sist. strade illuminaz. pubblica centri rurali Cappuccini, San Giovanni,Agri	80.000,00	80.000,00	79.910,61
A2	P.06.04	Sist. strade illuminaz. pubblica centri rurali Campitelli, Calabritto,Campo di lupo etc	80.000,00	80.000,00	65.208,85
A2	P.06.06*	Riqualificazione centro di Pergola	70.000,00	70.000,00	69.339,05
A2	P.06.07*	Riqualificazione centro di Galaino	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A2	P.F2.06.09	Valorizzazione dei borghi rurali		183.999,12	183.999,12
		Valorizzazione dei borghi rurali. Opere di completamento	200.000,00	16.000,88	16.000,88
C1	P.07.01	Sistemazione impianti sportivi centro abitato	31.941,00	31.941,00	9.582,90
C1	P.07.02	Completamento impianti sportivi Pergola . Realizzazione palestra	100.000,00	100.000,00	89.827,13
C1	P.07.04	Completamento impianti sportivi Galaino	100.000,00	100.000,00	61.439,10
C5	P.08.01	Adeguamento Casa di Riposo in Via Campitelli	30.000,00	30.000,00	29.691,42
C5	P.08.02	Adeguamento centro servizi socio - assistenziali ex scuola Elementare	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C5	P.08.03	Adeguamento Centro Servizi Galaino	35.000,00	35.000,00	34.668,36
C5	P.08.04*	Realizzazione piscina Comunale con vasche riabilitative	470.000,00	470.000,00	469.619,52

C5	P.08.05	Piscina Comunale - Completamento I° Lotto	330.000,00	330.000,00	193.116,88
		Risorse umane ed attrezzature connesse	113.000,00	113.000,00	113.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	25.622,00	25.622,00	10.955,92
TOTALI FASE I			3.364.495,00	3.364.495,00	2.598.384,77
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			2.937.465,00	2.937.465,00	2.397.451,12
TOTALI COMPLESSIVI			6.301.960,00	6.301.960,00	4.995.835,89
Importi espressi in euro					

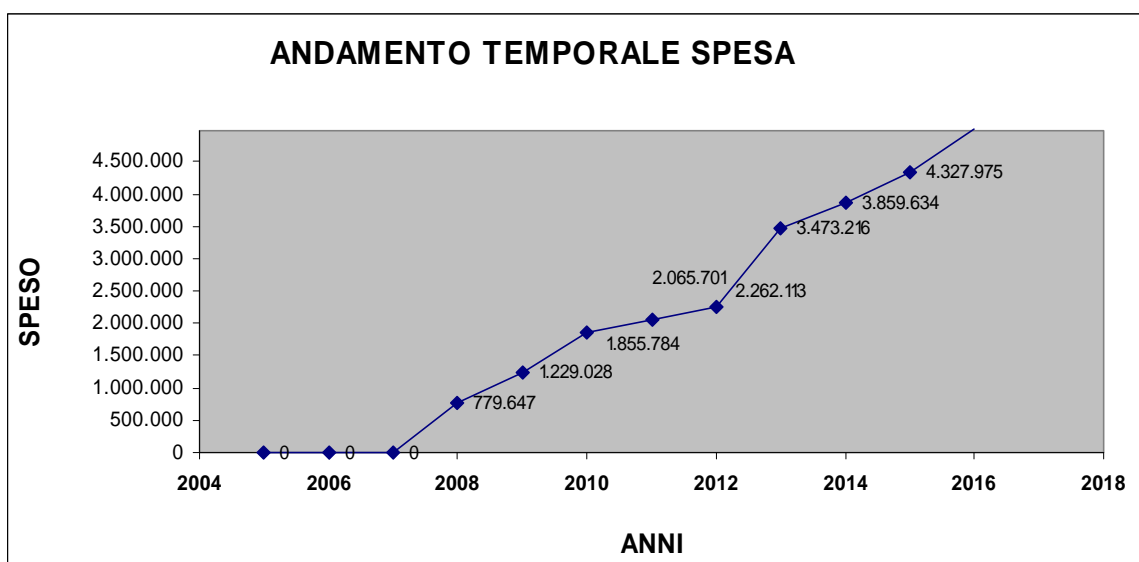


Grafico 16: Andamento temporale della spesa del Comune di Marsiconuovo

Tabella 20: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Marsicovetere con relativa spesa

COMUNE DI MARSICOVETERE					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1469/2006			D.P.C. Fase II Approvato con DD 137 del 26/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.02.01	Sistemazione Piazza Morlino e Zecchettin	835.525,74	835.525,74	698.255,77
		Sistemazione Piazza Morlino e Zecchettin. Opere di completamento. Le economie di € 51.744,23 di questo intervento più € 12.730,03, le economie delle opere di completamento, sono state cedute al P.02.05			137.269,97
A1	P.02.02	Restauro Portici	83.172,16	83.172,16	83.172,16
		Restauro Portici. Opere di completamento	16.827,84	16.827,84	6.827,84
A1	P.02.03	Realizzazione Fontana Monumentale	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A1	P.02.04a	Rimodellamento Via Roma e arredo urbano. Le economie di € 10.587,83 di questo intervento sono state cedute al P.02.05	159.412,17	159.412,17	159.412,17
A1	P.02.04b	Completamento lavori di rimodellamento Via Roma - Villa d'Agri. Le economie di € 12.240,76 di questo intervento sono state cedute al P.02.05	42.759,23	42.759,23	42.759,23
A1	P.02.05	Lavori di pavimentazione stradale, segnaletica ed arredo urbano di via Roma e viabilità urbana di Piazza Zecchettin. Questo intervento è stato inserito recuperando le economie dei seguenti lavori: P.02.01 Riqualificazione e arredo urbano Piazza Zecchettin (€ 51.744,23) e opere di completamento (€ 12.730,03), P.02.04 Rimodellamento Via Roma (€ 10.587,83) e opere di completamento (€ 12.240,76).	87.302,15	87.302,15	71.215,94
A1	P.F2.02.08	Manutenzione edificio delegazione comunale	240.000,00	240.000,00	157.175,58

A1	P.F2.02.11	Manutenzione ex scuola elementare Piazza Zecchettin	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A1	P.F2.03.03	Riqualificazione strade centro storico Borgo Castello ed area circostante ex convento S. Maria di Costantinopoli	460.000,00	314.851,10	314.851,10
A1	P.F2.03.03	Riqualificazione strade centro storico Borgo Castello ed area circostante ex convento S. Maria di Costantinopoli. Opere di completamento		145.148,90	109.852,87
A2	P.03.01	Riqualificazione Borgo Castello	513.000,00	513.000,00	346.367,25
A2	P.05.01	Riqualificazione ex convento Santa Maria di Costantinopoli	80.000,00	80.000,00	50.867,06
A2	P.05.02	Ripristino e restauro convento. è stata variata la scheda progetto P.05 dall'intervento Riqualificazione dell'Area dell'ex Convento di S. Maria di Loreto in località S. Maria dell'Aspro sono stati creati due nuovi progetti	215.000,00	215.000,00	0,00
A2	P.05.02a	Riqualificazione urbana area esterna nuovo centro parrocchiale Villa d'Agri. è stata variata la scheda progetto P.05 dall'intervento Riqualificazione dell'Area dell'ex Convento di S. Maria di Loreto in località S. Maria dell'Aspro sono stati creati due nuovi progetti	138.540,00	38.681,38	100.277,09
				99.858,62	
A2	P.04.01	Opere di civiltà nelle campagne	82.577,16	82.577,16	55.357,37
A2	P.04.01b	Opere di civiltà nelle campagne – Opere di completamento			0,00
A2	P.04.02*	Sistemazione sponda destra del torrente Molinara	25.882,84	25.882,84	18.445,38
A2	P.06.01	Lavori di ripristino strutturale e restauro conservativo ex convento Santa Maria di Loreto.	250.000,00	38.681,38	85.548,58
				35.000,00	
				176.318,62	
A2	P.F2.04.03	Riqualificazione piazzetta lato Barricelle	200.000,00	160.902,74	160.902,74
		Riqualificazione piazzetta lato Barricelle. Opere di completamento		39.097,26	0,00
C1	P.07.01	Completamento palazzetto dello sport	123.178,70	119.040,38	103.572,64
C1	P.07.01b	Completamento Palazzetto dello sport –Opere di completamento		4.138,32	0,00
C1	P.07.02	Manutenzione Campo sportivo Villa d'Agri	55.000,00	55.000,00	43.930,97
C1	P.08.01	Sistemazione area sportiva Barricelle	231.780,00	178.294,76	178.294,76
		Sistemazione area sportiva Barricelle. Opere di completamento		53.485,24	0,00
C1	P.09.01	Ampliamento area di tiro a volo.	23.941,30	23.941,30	23.679,54
C1	P.F2.06.05	Interventi integrativi Campo sportivo	25.521,34	25.521,34	0,00
C1	P.F2.06.06	Interventi integrativi Palazzetto dello Sport	140.000,00	99.807,24	99.807,24
		Interventi integrativi Palazzetto dello Sport. Opere di completamento		40.192,76	33.147,05
C5	P.02.05	Ampliamento cimitero comunale (ex Punto ludico Op. P.02.05)	466.500,00	466.500,00	69.975,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	25.622,00	25.622,00	10.955,92
		Risorse umane ed attrezzature connesse	80.000,00	80.000,00	53.657,46
TOTALI FASE I			3.585.399,29	3.585.399,29	2.403.886,18
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.261.143,34	1.261.143,34	1.056.692,50
TOTALI COMPLESSIVI			4.846.542,63	4.846.542,63	3.460.578,68
Importi espressi in euro					

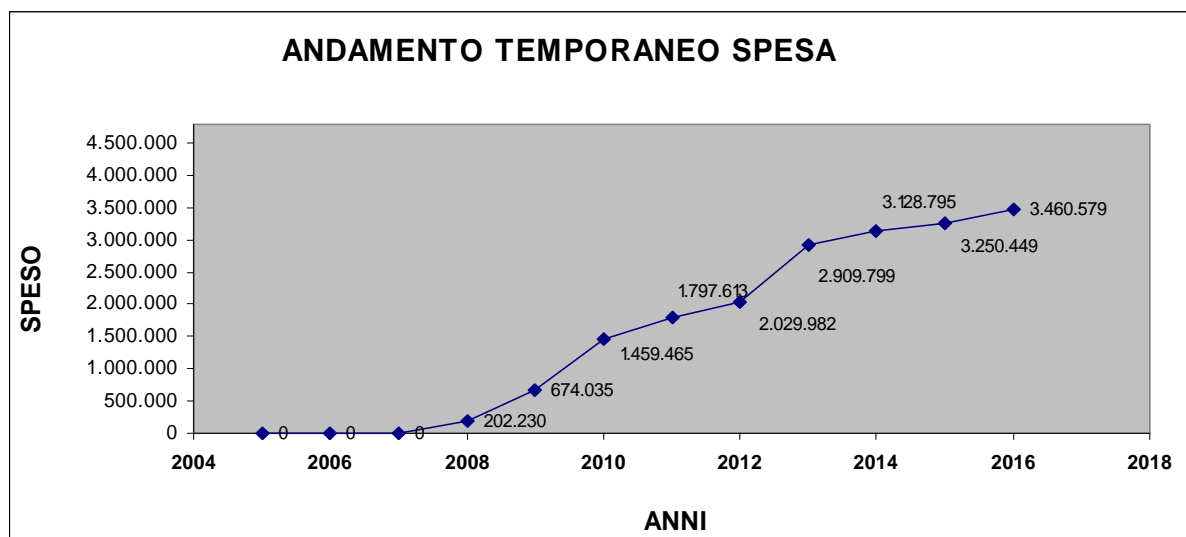


Grafico 17: Andamento temporaneo della spesa del Comune di Marsicovetere

Tabella 21: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Missanello con relativa spesa

COMUNE DI MISSANELLO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1470/2006 e 284/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 62 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione Via Roma, Vico I^ Roma e Vico II^ Roma	107.500,00	107.500,00	107.500,00
A1	P.01.02	Riqualificazione Via Procida, Via Veglia, Piazzetta Persecuzione.	107.500,00	107.500,00	96.750,00
A1	P.03.01	PIC Facciate e coperture - Attivazione ambito pilota 1.	256.000,00	256.000,00	145.000,00
A1	P.03.02	PIC Facciate e coperture - OO.PP. Edificio Scolastico	34.000,00	34.000,00	0,00
A1	P.04.01.a	Risparmio energetico Casa Comunale	36.631,67	36.631,67	0,00
		Risparmio energetico Edificio Scolastico.	22.740,35	22.740,35	0,00
		Risparmio energetico Ex Scuola Materna	627,98	627,98	0,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione ed arredo urbano	40.000,00	40.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	Recupero contenitori - Acquisizioni Centro Storico. E' stata variata la scheda progetto e di questo € 50.000,00 sono passati al P.F2.03.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A1	P.F2.03.01	Decoro e accessibilità Municipio	140.000,00	140.000,00	40.705,70
A1	P.F2.03.02	Decoro e fruibilità Edificio Scolastico	33.333,33	33.333,33	33.333,33
A1	P.F2.04.01	PIC - Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	90.000,00	90.000,00	0,00
A2	P.06.01	Acquedotto piano Argenzio	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A2	P.06.02	Lavori di ripristino e sistemazione strada interpodereale Fontana Isca - Fondo Valle dell'Agri	663,83	30.000,00	30.000,00
			29.336,17		
A2	P.05.01	"Sulle tracce di Levi pittore e scrittore" - sistemazione località foresta	136.000,00	136.000,00	122.400,00
A2	P.05.02	"Fra calanchi ed ulivi"	45.000,00	45.000,00	0,00
A2	P.F2.05.01	Sistemazione strada Aia del Cupolo. È variata la Scheda Progetto e l'intervento è stato portato da € 120.000,00 a € 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A2	P.F2.05.01b	È variata la Scheda Progetto che prima era di € 120.000,00 ora restano 100.000,00 cedendo all'int. P.F2.05.01 € 20.000,00	100.000,00	100.000,00	56.578,00
A2	P.F2.05.02	Sistemazione strada Caselle	80.000,00	80.000,00	61.618,32
A2	P.F2.05.03	Sistemazione strada rurale Tonsante e Acquedotto Paschiere. È variata la scheda progetto e questo intervento	100.000,00	100.000,00	100.000,00

		da € 50.000,00 è passato ad € 100.000,00			
C1	P.07.01	Lavori di sistemazione delle zone di gioco degli impianti sportivi in località Paschiere	114.900,00	89.189,51	89.189,51
		Lavori di sistemazione delle zone di gioco degli impianti sportivi in località Paschiere. Opere di completamento		25.710,49	7.713,15
C1	P.07.02	Lavori di sistemazione delle zone di gioco degli impianti sportivi in località Paschiere	80.000,00	80.000,00	69.337,46
C1	P.F2.06.01	Potenziamento Polo sportivo e ricreativo in località Paschiere	50.000,00	50.000,00	0,00
C5	P.08.01	Polo della solidarietà	225.000,00	225.000,00	206.317,66
C5	P.08.02	Attivazione Ludoteca	23.600,00	23.600,00	0,00
C5	P.F2.07.01	Sistemazione esterna e potenziamento centro sociale ex asilo	50.000,00	50.000,00	0,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse			
	P.F2.08.01	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	52.192,00	52.192,00	35.690,14
TOTALI FASE I			1.372.500,00	1.372.500,00	1.027.207,78
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			765.525,33	765.525,33	357.925,49
TOTALI COMPLESSIVI			2.138.025,33	2.138.025,33	1.385.133,27

Importi espressi in euro

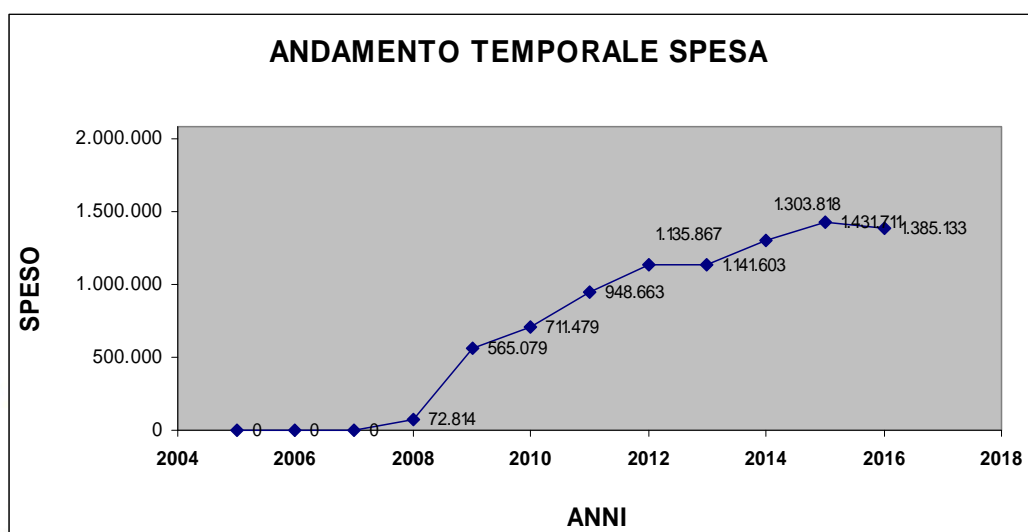


Grafico 18: Andamento temporale della spesa del Comune di Missanello

Tabella 22: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Moliterno con relativa spesa

COMUNE DI MOLITERNO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1382/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 1895 del 10/09/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.02.01	Biblioteca comunale G. Racioppi e mediateca comprensoriale. Opere complementari ed accessorie Palazzo Valinoti.	40.000,00	40.000,00	36.000,00
A1	P.02.01a	Biblioteca comunale G. Racioppi e mediateca comprensoriale. Opere complementari ed accessorie Palazzo Valinoti. Sistemazione infissi	10.000,00	10.000,00	9.999,50
A1	P.02.02*	Recupero architettonico e funzionale Fondaci	40.000,00	40.000,00	28.113,20
A1	P.02.03	Opere complementari ed accessorie teatro comunale	40.000,00	40.000,00	35.801,17
A1	P.02.04a	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. I Tratto	1.112.775,00	977.775,00	214.542,45

	P.02.04b	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. II Tratto		75.000,00	74.795,33
	P.02.04c	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. III Tratto		60.000,00	60.000,00
A1	P.03.01	Viabilità e accesso al Borgo Medioevale. Salita Chiesa Madre	100.000,00	100.000,00	97.157,83
A1	P.03.02*	Arredo urbano nel centro storico	50.000,00	50.000,00	48.943,50
A1	P.03.03	Riqualificazione paesaggistica in località "Sotto il Castello"	100.000,00	73.907,60	73.907,60
		Riqualificazione paesaggistica in località "Sotto il Castello". Opere di completamento		26.092,40	0,00
A1	P.04.01*	Arredo urbano nelle zone di completamento	70.000,00	70.000,00	60.826,69
A1	P.04.02*	Manutenzione straordinaria palazzo Giliberti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A1	P.04.02a	Completamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria Palazzo Giliberti.	50.000,00	50.000,00	49.472,17
A1	P.04.03	Miglioria del Patrimonio ed arredo in ambito urbano. Via Rosario - Piazzetta Bianculli, etc.	100.000,00	100.000,00	98.298,08
A1	P.04.04	Completamento del Palazzo Parisi, candidato a sede del Parco Nazionale Val d'Agri	100.000,00	90.000,00	90.000,00
A1	P.04.04b	Completamento del Palazzo Parisi, candidato a sede del Parco Nazionale Val d'Agri ed estendimento e migliora urbanizzazione in ambito urbano e rurale. Intervento di completamento		10.000,00	9.999,50
A1	P.F2.01.03	Progetto integrato III Età: Riqualificazione area Parco del Seggio. E' stata modificata la Scheda Progetto ed € 250.000,00 sono passati alla fase 1	320.000,00	320.000,00	0,00
A1	P.F2.01.06	Riqualificazione immobile del centro storico - Palazzo DIMARIA	60.000,00	60.000,00	18.000,00
A1	P.F2.04.07	Riqu. funzionale delle strutture e delle aree pubbliche in ambito urbano in Largo Gandhi	40.000,00	40.000,00	35.358,63
A1	P.F2.04.08	Centro raccolta differenziata	16.000,00	16.000,00	0,00
A2	P.05.01*	Opere di civiltà nelle campagne. I° Lotto	60.000,00	60.000,00	54.000,00
A2	P.05.02	Opere di civiltà nelle campagne. II° Lotto	39.988,68	39.988,68	39.988,68
		Opere di civiltà nelle campagne. II° Lotto. Opere di completamento	10.011,32	10.011,32	10.007,25
A2	P.05.03	Riqualificazione area Pineta. Camper	40.000,00	29.745,94	29.745,94
		Riqualificazione area Pineta. Camper. Opere di completamento		10.254,06	0,00
A2	P.05.04	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale.	90.546,00	66.690,42	66.690,42
		Interventi di mobilità ciclistica e pedonale. Economie		23.855,58	16.277,64
A2	P.05.04a	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale. Itinerario ciclabile tra Pineta S. Francesco e Centro Sportivo Comunale. I° Lotto.	53.000,00	41.563,74	41.563,74
		Interventi di mobilità ciclistica e pedonale. Itinerario ciclabile tra Pineta S. Francesco e Centro Sportivo Comunale. I° Lotto. Opere di completamento		11.436,26	9.902,08
A2	P.05.05	Riqualificazione Paesaggistica aree Urbane	190.000,00	190.000,00	186.468,34
A2	P.F2.05.06	Riqualificazione degli spazi compresi tra Piazza Matteotti e Santa Croce	65.000,00	65.000,00	65.000,00
A2	P.F2.05.07	Miglioramento e realizzazione percorsi pedonali Cancellone - S. Cataldo	100.000,00	70.193,29	70.193,29
		Miglioramento e realizzazione percorsi pedonali Cancellone - S. Cataldo. Opere di completamento		29.806,71	8.897,13
A2	P.F2.05.08	Messa in sicurezza strade Comunali	25.000,00	25.000,00	22.055,16
C1	P.06.01*	Copertura campi da tennis comunali	77.468,53	77.468,53	77.468,53
C1	P.06.02*	Fruibilità piscina comunale	26.151,47	26.151,47	16.856,05
C1	P.06.03	Erba sintetica campo polifunzionale	70.000,00	70.000,00	68.243,31
C1	P.06.04b	Interventi prioritari sulla piscina comunale. II Lotto.	81.235,89	81.235,89	52.120,77
	P.06.04c	Rifacimento manto erboso campo di calcio "O. Venezia"	25.000,00	25.000,00	24.900,34
	P.06.04d	Sistemazione campo polivalente, Via della Pineta ed arredi vari	15.000,00	15.000,00	12.636,78

	P.06.04e	intervento di riqualificazione strutture sportive in località Paggerelle	64.010,87	64.010,87	64.010,87
C1	P.06.04a	Interventi prioritari sulla piscina comunale. I Lotto.	144.753,24	144.753,24	117.013,28
		Opere di Miglioramento e recupero degli immobili e delle aree attrezzate del centro sportivo comunale. I Lotto Tennis e beach volley	23.600,00	23.600,00	19.478,57
		Opere di Miglioramento e recupero degli immobili e delle aree attrezzate del centro sportivo comunale. II Lotto Area piscina comunale	20.000,00	20.000,00	19.764,00
C1	P.F2.06.05	Opere di Miglioramento e recupero degli immobili e delle aree attrezzate del centro sportivo comunale. III Lotto Campo polivalente in Via Moro	26.400,00	26.400,00	26.398,23
C5	P.01.01*	Lavori di Adeguamento impianti, sistemazione esterna del centro diurno per anziani. Acquisto pulmino per portatori handicap	50.000,00	50.000,00	45.000,00
C5	P.01.02	Adeguamento struttura centro diurno per anziani	100.000,00	100.000,00	0,00
A1	P.01.03	Progetto integrato III età - Riqualificazione area Parco del Seggio	1.010.000,00	400.000,00	475.432,42
C5				360.000,00	
				250.000,00	
C5	P.01.04	Adeguamento e ampliamento mensa a servizio polo socio - assistenziale	35.000,00	35.000,00	33.844,80
	P.01.04b	Adeguamento e ampliamento mensa a servizio polo socio - assistenziale. Intervento di completamento	80.400,00	80.400,00	0,00
C5	P.F2.01.05	Riqualificazione immobile ex Gifra 1^ Intervento	30.000,00	30.000,00	22.818,19
C5	P.F2.01.07	Sistemazione ed ampliamento cimitero	100.000,00	100.000,00	99.996,71
C5	P.F2.01.08	Opere di miglioramento sismico Centro Smile	35.000,00	35.000,00	23.959,01
C5	P.F2.01.09	Sistemazione Cine-Teatro Pino	47.169,88	47.169,88	14.150,98
		Risorse umane ed attrezzature connesse	105.659,00	105.659,00	105.300,20
		Risorse umane ed attrezzature connesse	48.000,00	48.000,00	48.000,00
TOTALI FASE I			4.231.000,00	4.231.000,00	2.585.328,46
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			956.169,88	956.169,88	494.069,90
TOTALI COMPLESSIVI			5.187.169,88	5.187.169,88	3.079.398,36

Importi espressi in euro

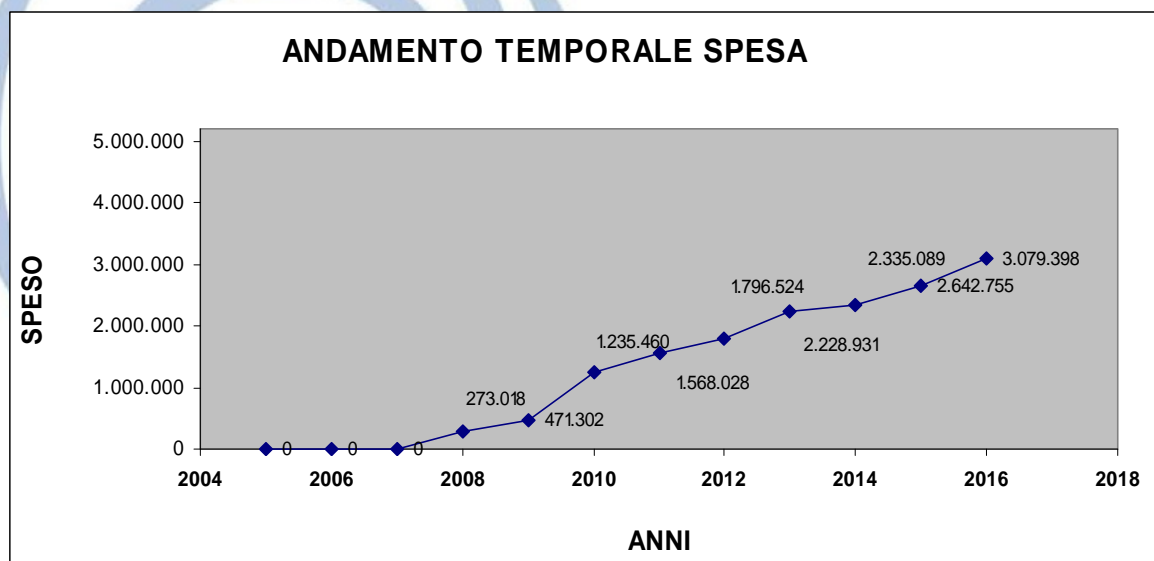


Grafico 19: Andamento temporale della spesa del Comune di Moliterno

Tabella 23: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Montemurro con relativa spesa

COMUNE DI MONTEMURRO					
DPC Fase I Appr. DGR 864/2006, 1929/2006 e 553/2008		D.P.C. Fase II Approvato con DD 758 del 25/03/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Pic Facciate e coperture Largo Spinelli	145.350,00	145.350,00	130.815,00
A1	P.01.02	Pic Facciate e coperture Piazza IV Novembre	127.500,00	105.280,20	105.280,20
		Pic Facciate e coperture Piazza IV Novembre. Opere di completamento		22.219,80	0,00
A1	P.02.01	Sistemazione scalinata discesa Capo Le Tempe	62.711,68	62.711,68	66.258,71
A1	P.02.02	Riqualficazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre	443.756,19	389.242,58	389.242,58
		Riqualficazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre. Opere di completamento		54.513,36	54.513,36
	P.02.02a	Riqualficazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre. Opere di completamento. Arredo urbano Piazza IV Novembre	16.243,81	16.243,81	16.191,48
A1	P.02.03	Riqualficazione ambientale e naturalistica quartiere San Rocco per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Nelle precedenti approvazioni erano 2 interventi il P.02.03a di € 177.000,00 totali di cui € 40.000,00 a carico del P.O. e il P.02.03b di € 168.500,00 tutti a carico del P.O.. Ora è un unico intervento	208.500,00	40.000,00	0,00
A1	P.02.04	Realizzazione parcheggi in Via Sorgia	207.490,00	163.139,94	163.139,94
		Realizzazione parcheggi in Via Sorgia. Opere di completamento		44.350,06	13.305,02
A1	P.F2.06.01	Lavori di completamento dell'edificio scolastico "Ten. Robilotta"	700.000,00	643.681,79	643.681,79
		Lavori di completamento dell'edificio scolastico "Ten. Robilotta". Opere di completamento		56.318,21	56.318,21
A2	P.03.01	Lavori di realizzazione parco e verde pubblico attrezzato. Discesa Scaliero	150.000,00	123.682,53	123.682,53
		Lavori di realizzazione parco e verde pubblico attrezzato. Discesa Scaliero. Opere di completamento		26.317,47	11.317,47
A2	P.F2.03.02	Recupero ambientale e naturalistico fontana dell'Afio e attigua pineta	192.000,00	100.000,00	0,00
				92.000,00	0,00
C1	p.04.01	Miglioramento campo sportivo. Costruzione gradinate campo di calcio	99.000,00	99.000,00	99.000,00
C1	P.04.02	Miglioramento campo sportivo. Adeguamento campi palla a volo e tennis	80.000,00	55.765,65	55.765,65
		Miglioramento campo sportivo. Adeguamento campi palla a volo e tennis. Opere di completamento		24.234,35	0,00
C5	P.05.01	Strutture socio sanitarie assistenziali .	271.501,00	271.501,00	271.483,00
C5	P.05.02	Completamento e attrezzature per Struttura socio sanitarie assistenziali	197.853,00	197.853,00	0,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	53.449,32	53.449,32	53.449,32
TOTALI FASE I			2.089.905,68	2.089.905,43	1.579.994,94
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			945.449,32	945.449,32	753.449,32
TOTALI COMPLESSIVI			3.035.355,00	3.035.354,75	2.333.444,26

Importi espressi in euro

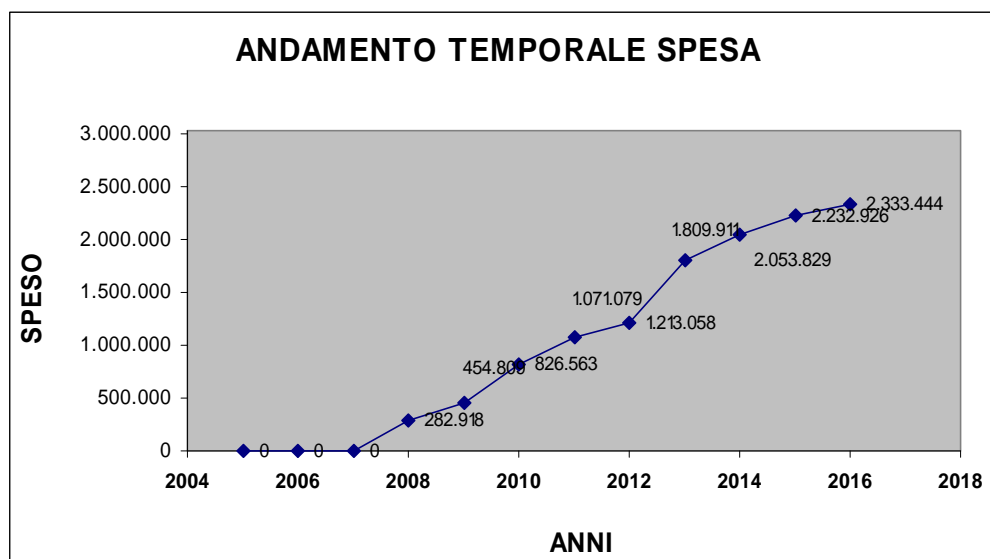


Grafico 20: Andamento temporale della spesa del Comune di Montemurro

Tabella 24: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Paterno con relativa spesa

COMUNE DI PATERNO					
DPC Fase I Appr. DGR 1279/2006 e 2032/2006		D.P.C. Fase Approvato con D.D. N. 7132.2012/D.02672 del 29/11/2012			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione rioni Limanti e Pantano	90.000,00	90.000,00	68.545,35
A1	P.02.01*	Riqualificazione rioni Raia, Carboni e Giardini	90.000,00	90.000,00	66.643,17
A1	P.F2.01.01	Costruzione Casa Comunale	600.000,00	0,00	0,00
	P.F2.01.02	Riqualificazione impianto pubblica illuminazione	206.000,00	206.000,00	176.324,27
A1	P.03.01*	Riqualificazione Via Petazzo, Castagne e Acquareggente	32.347,45	32.347,45	32.347,45
		Riqualificazione Via Petazzo, Castagne e Acquareggente. Opere di completamento	17.652,55	17.652,55	0,00
A1	P.03.02	Realizzazione marciapiedi Via Castagne Rotabile e Acquareggente.	180.000,00	180.000,00	51.280,86
A1	P.03.03	Realizzazione di una piazza belvedere con sottostanti parcheggi pubblici in Via Tempa. Questo intervento è stato accorpato al P.06.01 per € 190.000,00	0,00	0,00	0,00
A1	P.04.01	Riqualificazione Piazza Isabella Morra e Via G. Fortunato. Con interventi di architettura paesaggistico - ambientale.	769.759,63	769.759,63	472.633,70
A2		Riqualificazione Piazza Isabella Morra e Via G. Fortunato. Con interventi di architettura paesaggistico - ambientale.	164.321,99	164.321,99	164.321,99
A2	P.02.02	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'area dismessa in località Giardini	200.000,00	200.000,00	169.611,70
A2	P.05.01	Viabilità rurale Via Le Sorti e Chiusulelle	54.880,00	42.871,11	42.871,11
A2	P.05.01b	Viabilità Rurale località Le Sorti e Chiusulelle – opere di completamento		12.008,89	9.368,10
A2	P.05.02	Riqualificazione area località Spineta. Questo intervento è stato spostato al P.06.01 per € 10.000,00	0,00	0,00	0,00
C1	P.01.02	Riqualificazione complesso sportivo Polivalente in località Pantano	50.000,00	50.000,00	49.999,13
C1	P.06.01	Realizzazione tribuna calcio.	80.000,00	80.000,00	66.261,45
C1	P.06.02	Sistemazione area impianti sportivi con interventi di adeguamento funzionale delle strutture esistenti. Con DD N. 1776 è stata variata la scheda progetto spostando, l'importo di € 190.000,00 e l'importo di € 10.000,00 di cui all'intervento precedente e impegnando ex novo €	450.000,00	190.000,00	0,00
				10.000,00	10.000,00
				250.000,00	250.000,00

		250.000,00 e non € 300.000,00			
C1	P.06.03	Realizzazione campo di tiro a volo - Costa della Gaveta	50.000,00	50.000,00	0,00
C5	P.04.02	Recupero funzionale ed adeguamento impiantistico ex asilo in piazza Isabella Morra	270.000,00	210.083,67	210.083,67
		Recupero funzionale ed adeguamento impiantistico ex asilo in piazza Isabella Morra. Opere di completamento		59.916,33	0,00
C5	P.07.01	Ristrutturazione ed adeguamento ex complesso scolastico in comunità alloggio	140.000,00	140.000,00	119.435,37
C5	P.07.02	Acquisto arredo comunità alloggio	65.638,38	65.638,38	19.691,51
		Risorse umane e redazione DPC	70.000,00	68.672,00	57.547,00
		Risorse umane e redazione DPC	1.332,19	0,00	0,00
TOTALI FASE I			2.774.600,00	2.773.272,00	1.860.641,56
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			807.332,19	206.000,00	176.324,27
TOTALI COMPLESSIVI			3.581.932,19	2.979.272,00	2.036.965,83

Importi espressi in euro

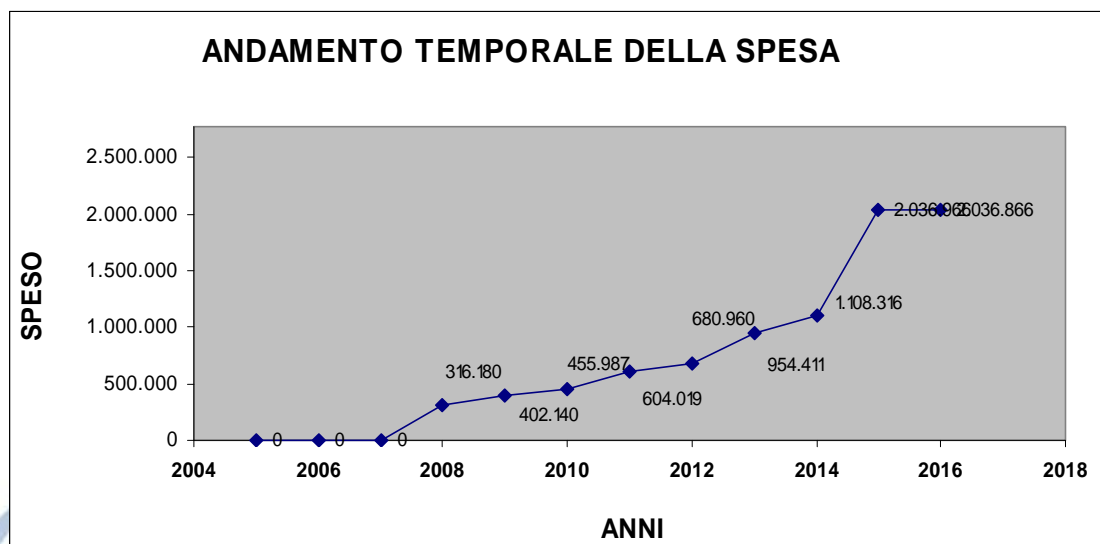


Grafico 21: Andamento temporale della spesa del Comune di Paterno

Tabella 25: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Pietrapertosa con relativa spesa

COMUNE DI PIETRAPERTOSA					
DPC Fase I presentato e in valutazione			DPC Fase II: nel DPC Fase I sono stati presentati anche gli interventi Fuori tetto finanziario che dovrebbero confluire nel DPC Fase II		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Recupero ex Scuola Via Garibaldi. Questo è un unico intervento di complessivi € 704.722,89 che ricade su tre misure A1, C1 e C5, con importi diversi. Quindi troviamo lo stesso codice progetto in tre sezioni	397.117,60		
	P.01.02	PIC - Adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e coperture	250.000,00		
A2	P.03.01	Messa in sicurezza viabilità rurale	140.000,00		
C1	P.01.01	Recupero ex Scuola Via Garibaldi. Questo è un unico intervento di complessivi € 704.722,89 che ricade su tre misure A1, C1 e C5, con importi diversi. Quindi troviamo	143.265,94		

		lo stesso codice progetto in tre sezioni			
C5	P.01.01	Recupero ex Scuola Via Garibaldi. Questo è un unico intervento di complessivi € 704.722,89 che ricade su tre misure A1, C1 e C5, con importi diversi. Quindi troviamo lo stesso codice progetto in tre sezioni	164.339,35		
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	82.403,74	24.721,12	24.721,12
TOTALI FASE I			1.177.126,63	24.721,12	24.721,12
TOTALI COMPLESSIVI			1.177.126,63	24.721,12	24.721,12
Importi espressi in euro					

Tabella 26: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Roccanova con relativa spesa

COMUNE DI ROCCANOVA					
DPC Fase I Appr. DGR 2623/2005 e 654/2006			D.P.C. Fase II - PRESENTATO MA IN FASE DI ISTRUTTORIA		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Arredo urbano e Sistemazione Piazze	66.000,00	66.000,00	62.998,24
A1	P.02.01	Acquisizione e recupero immobili ex frantoio	250.000,00	250.000,00	0,00
A1	P.02.02	Acquisizione e recupero di alcune cantine	20.000,00	20.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	Acquisizione e recupero dell'immobile ex Frantonio	150.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.02.02	Acquisizione e recupero di alcune cantine	50.000,00	0,00	0,00
A1	P.03.01	PIC Facciate e Coperture. Attivazione ambito Pilota	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A1	P.03.02	PIC Facciate e Coperture. Attivazione Ambito Priorità	125.000,00	125.000,00	125.000,00
A1	P.03.04	Eliminazione detrattore visivo viadotto	53.000,00	53.000,00	51.860,97
A1	P.F2.03.01	Parco delle cantine. Risistemazione strada di accesso al Parco c/da Manche	50.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.03.01	Attivazione ambito pilota	50.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.03.02	Attivazione ambito priorità maggiore	260.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.03.03	Attivazione ambito di priorità minore	50.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.03.04	Eliminazione del detrattore visivo "Viadotto"	100.000,00	0,00	0,00
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura	42.800,00	42.800,00	38.520,00
A1	P.F2.04.01	Recupero e riutilizzo dimore centro storico per Borgo albergo	250.000,00	0,00	0,00
A1	P.05.01	Pic Box Interrati zona A.	268.725,00	268.725,00	264.111,72
A2	P.F2.05.01	Sistemazione strada interpodereale di San Jorio, Gimone, Valdarra, Fontanelle, Montagnola	50.000,00	0,00	0,00
A2	P.06.01	Creazione Parco delle cantine	97.000,00	97.000,00	95.535,99
A2	P.06.02	Riqualficazione a valle del centro abitato Parco Carazita	189.000,00	189.000,00	174.199,04
A2	P.07.01	Sistemazione strada interpodereale Marchese Calderaro	100.000,00	100.000,00	94.358,04
C1	P.08.01	Realizzazione palazzetto sport e centro polifunzionale	326.000,00	326.000,00	324.226,36
C5	P.08.02	Realizzazione palazzetto sport e centro polifunzionale	324.000,00	324.000,00	323.000,00
C5	P.09.01	Centro diurno per anziani	106.000,00	106.000,00	113.908,78
		Centro diurno per anziani (attrezzature)	51.000,00	51.000,00	
		Risorse umane ed attrezzature connesse	142.475,00	142.475,00	147.632,50
		Risorse umane ed attrezzature connesse	25.000,00	0,00	0,00
TOTALI FASE I			2.211.000,00	2.211.000,00	1.865.351,64
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.035.000,00	0,00	0,00

TOTALI COMPLESSIVI	3.246.000,00	2.211.000,00	1.865.351,64
Importi espressi in euro			

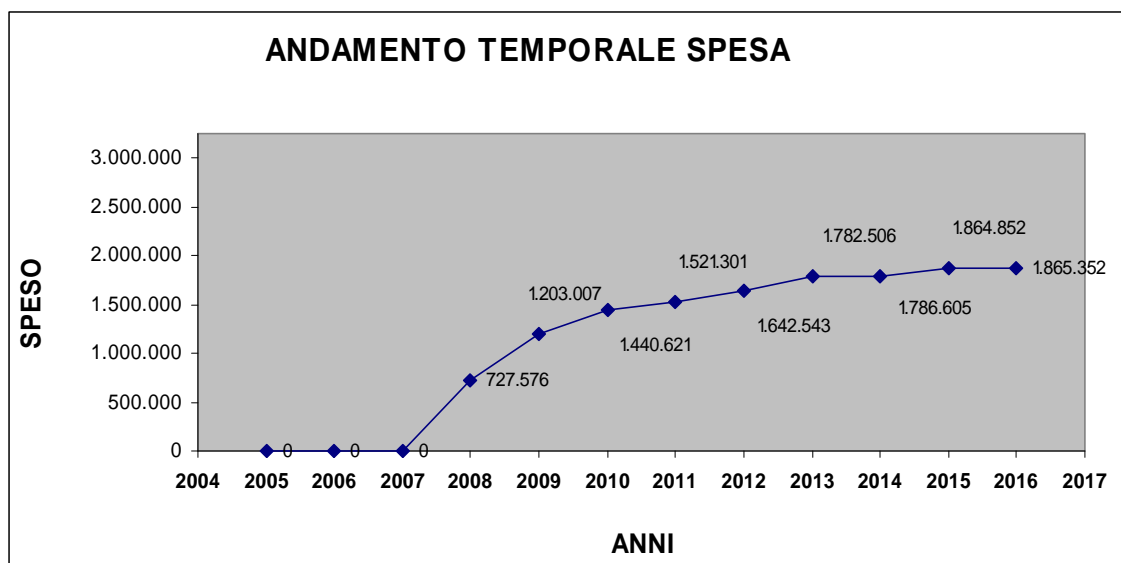


Grafico 22: Andamento temporale della spesa del Comune di Roccanova

Tabella 27: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di San Chirico Raparo con relativa spesa

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 797/2005, 797/2006, DGR 1775/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 60 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.04.01	Recupero palazzo Barletta	270.000,00	270.000,00	203.350,62
A1	P.04.02	PIC Riqualificaz. Facciate e Coperture	315.000,00	305.400,00	0,00
A1	P.04.05	Riqualificazione Via e Piazza Roma	296.016,90	296.016,90	289.977,69
A1	P.04.07	Riqualificazione della villa comunale e recupero fontana S. Rocco	70.000,00	70.000,00	62.059,94
A1	P.04.08	Realizzazione collegamento pedonale centro storico e area sportiva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A1	P.04.13	Promozione turistica del Progetto "Città Basiliana"	33.000,00	15.000,00	0,00
A1	P.04.13a	Percorso narrativo Basiliano		18.000,00	0,00
A1	P.F2.01.01	Casa di Riposo per anziani. Completamento I^ Lotto.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A2	P.03.01	Riqualificazione Area Torre San Vito	100.000,00	100.000,00	99.517,00
A2	P.03.15	Restauro del convento Santa Maria (ex PIC Casa Sicura)	130.000,00	691.700,00	622.530,00
C5	P.08.01	Casa di riposo per anziani.	561.700,00		
A2	P.F2.02.01	Infrastrutturazione turistica Monte Raparo			
C1	P.08.02	Adeguamento impianti sportivi esistenti e centro polisportivo	374.900,00	374.900,00	354.664,15
C1	P.08.05	Centro socio assistenziale per assistenza ed orientamento al lavoro.	220.000,00	220.000,00	167.267,92
C1	P.F2.	Attrezzature sportive a corredo del centro polisportivo esistente. Prima questo intervento era Infrastrutturazione turistica Monte Raparo per complessivi € 360.293,42 di cui € 30.000,00.	30.000,00	30.000,00	0,00
C5	P.F2.03.01	Casa per Anziani II^ Lotto	435.000,00	435.000,00	321.974,42
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	141.384,00	141.384,00	141.384,00
	P.F2.04.01	Risorse Umane ed attrezzature connesse	58.776,48	58.776,48	58.297,77

TOTALI FASE I	2.552.000,90	2.542.400,90	1.980.751,32
TOTALI FASE II - PREMIALITA'	673.776,48	673.776,48	530.272,19
TOTALI COMPLESSIVI	3.225.777,38	3.216.177,38	2.511.023,51

Importi espressi in euro



Grafico 23: Andamento temporale della spesa del Comune di San Chirico Raparo

Tabella 28: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di San Martino d'Agri con relativa spesa

COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1947/2006		D.P.C. Fase II Approvato con DD 58 del 22/01/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Dalla Piazza al Convento.	700.000,00	700.000,00	624.857,50
A1	P.02.01	Completamento recupero ex convento Sant'Antonio	150.000,00	150.000,00	117.327,63
A1	P.F2.01.01	Completamento, recupero ed attrezzaggio ex Convento	150.000,00	150.000,00	45.000,00
A1	P.F2.01.02	Completamento finiture ex convento. Questo intervento è stato inserito ex novo e deriva dalle economie dell'intervento P.01.01 Dalla Piazza al Convento per € 75.142,50 e da quelle dell'intervento P.02.01 Completamento e recupero ex convento Sant'Antonio per € 32.672,12	107.814,67	107.814,67	97.815,36
A2	P.05.01	Lavori di sistemazione della villetta Comunale	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A2	P.05.02	Lavori di sistemazione ed arredo Pineta	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A2	P.05.03	Sistemazione area circostante santuario Madonna della Rupe	50.000,00	50.000,00	48.349,50
A2	P.05.04	Sistemazione area verde e piazza località San Pietro	50.000,00	42.636,46	42.636,46
		Sistemazione area verde e piazza località San Pietro. Opere di completamento		7.363,54	0,00
A2	P.05.05	Sistemazione area Croce	20.000,00	20.000,00	19.275,74
A2	P.05.06	Sistemazione aree periferiche	45.000,00	41.550,00	41.550,00
		Sistemazione aree periferiche. Opere di completamento		3.450,00	0,00
A2	P.F2.02.01	Riqualificazione urbana e ambientale zona villetta. Prima l'intervento era Infrastrutturazione turistica Monte Raparo per € 25.000,00 ed è stato incrementato di altri € 25.000,00 presi dalle risorse umane	50.000,00	50.000,00	0,00
C1	P.F2.03.01	Nuovo impianto polivalente località San Pietro. A questo intervento è stato incorporato l'intervento P.07.01 della Fase I per € 279.000,00	500.000,00	279.000,00	377.953,50
C5	P.F2.04.01	Casa di residenza per anziani. A questo intervento è stato incorporato l'intervento P.08.01 della Fase I per € 355.000,00	224.000,00	224.000,00	520.697,50
		Risorse umane ed attrezzature connesse	355.000,00	355.000,00	
		Risorse umane ed attrezzature connesse	90.000,00	90.000,00	101.656,52
		Risorse umane ed attrezzature connesse. A questo intervento sono stati decurtati € 25.000,00 passati all'intervento P.F2.02.01	57.410,00	57.410,00	37.079,84

TOTALI FASE I	1.330.000,00	1.330.000,00	1.220.653,35
TOTALI FASE II - PREMIALITA'	1.444.224,67	1.444.224,67	1.078.546,20
TOTALI COMPLESSIVI	2.774.224,67	2.774.224,67	2.299.199,55

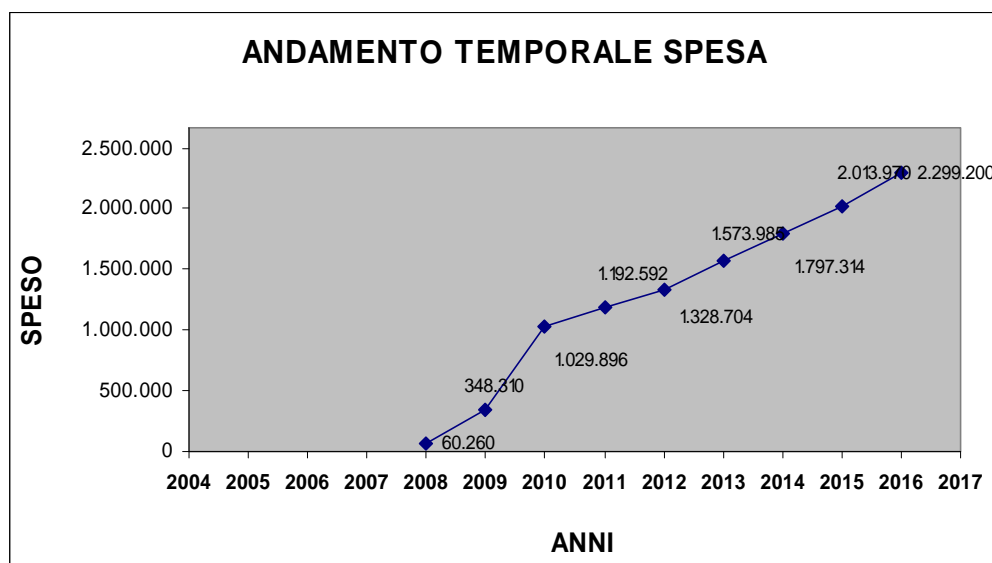


Grafico 24: Andamento temporale della spesa del Comune di San Martino d'Agri

Tabella 29: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Sant'Arcangelo con relativa spesa

COMUNE DI SANT'ARCANGELO					
D.P.C. Fase I Aprr. con DGR 506/2006 e 1894/2006		D.P.C. Fase II Approvato con DD 59 del 22/01/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Collegamento orizzontale Corso Umberto - Rione Valle	130.000,00	130.000,00	128.746,18
A1	P.01.02	Riqualificazione Corso Umberto - La Piazzetta	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A1	P.01.03	Riqualificazione ed arredo urbano San Brancato - Corso e Piazza Levi.	230.000,00	540.000,00	539.999,69
A2	P.06.02	Sulle tracce di Levi.	310.000,00		
A1	P.02.01	Recupero ex mercato coperto	340.900,00	380.000,00	380.000,00
C5	P.02.02	Recupero ex mercato coperto - Attrezzature.	39.100,00		
A1	P.03.01	Pic Riqualificazione formale facciate e coperture	800.000,00	795.819,51	800.000,00
				4.180,49	
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura	227.000,00	227.000,00	227.000,00
A1	P.F2.01.04	Riqualificazione rione Castello		246.287,28	246.287,28
		Riqualificazione rione Castello. Opere di completamento	350.000,00	103.712,72	20.308,55
A1	P.F2.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture		350.000,00	405.000,00
		PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture. Finanziamento integrativo	450.000,00	100.000,00	
A2	P.06.01	Il percorso dei calanchi.	150.000,00	100.000,00	67.900,26
A2	P.07.01	Lavori di sistemazione e miglioramento viabilità rurale	130.000,00	101.531,57	101.531,57
A2	P.07.01b	Completamento lavori di sistemazione e miglioramento viabilità rurale		28.468,43	27.753,29
A2	P.F2.03.01	Riqualificazione e arredo urbano in San brancato. La Piazza Levi	500.000,00	401.946,04	401.946,04

		Riqualificazione e arredo urbano in San brancato. La Piazza Levi. Opere di completamento		98.053,96	98.053,96
C1	P.08.01	Lavori di costruzione di una piscina comprensoriale	707.200,00	707.200,00	707.200,00
C1	P.F2.04.01	Potenziamento Centro sportivo. Completamento piscina comprensoriale	564.009,25	564.009,25	564.009,25
C1	P.F2.04.01a	Potenziamento Centro sportivo. Completamento piscina comprensoriale. Opere di completamento	135.990,75	135.990,75	122.391,67
C5	P.08.01b	Lavori di completamento piscina comprensoriale. Acquisto attrezzature	61.000,00	61.000,00	60.872,16
C5	P.09.01	Struttura socio - assistenziale per anziani	829.000,00	829.000,00	828.341,07
C5	P.F2.05.01	Potenziamento Struttura socio assistenziale	600.000,00	530.119,47	530.169,47
		Potenziamento Struttura socio assistenziale. Opere di completamento		69.880,53	20.964,16
		Risorse umane ed attrezzature connesse	180.100,00	180.100,00	145.278,86
		Risorse umane ed attrezzature connesse	26.966,00	26.966,00	18.480,00
TOTALI FASE I			4.234.300,00	4.184.300,00	4.114.623,08
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			2.626.966,00	2.626.966,00	2.427.610,38
TOTALI COMPLESSIVI			6.861.266,00	6.811.266,00	6.542.233,46
Importi espressi in euro					

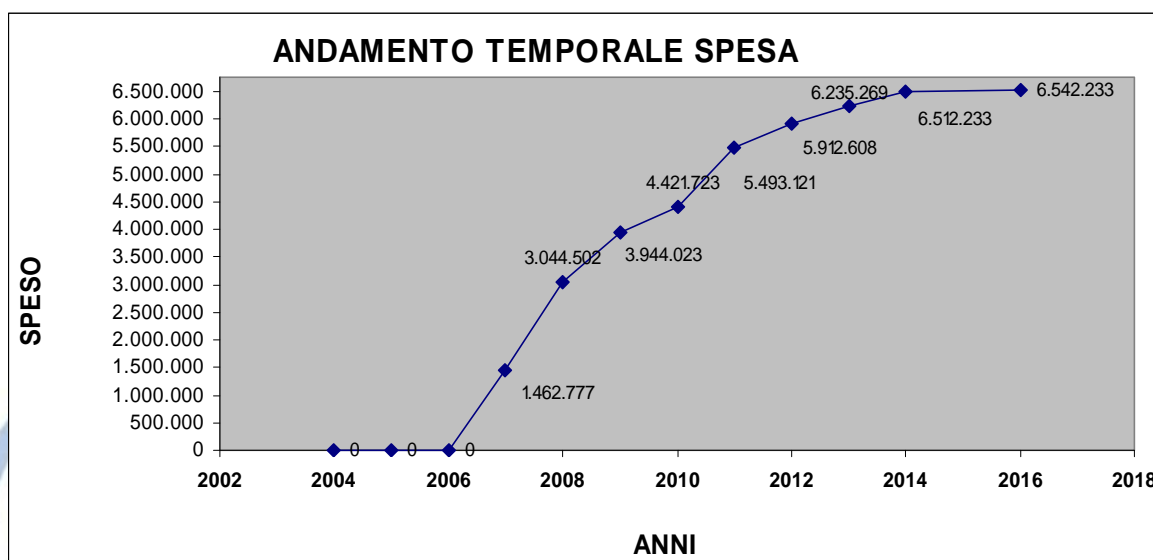


Grafico 25: Andamento temporale della spesa del Comune di Sant'Arcangelo

Tabella 30: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Sarconi con relativa spesa

COMUNE DI SARCONI					
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 283/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 576 del 25/03/2010 e 1911 del 13/09/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Pic Facciate e coperture	300.000,00	300.000,00	270.000,00
A1	P.03.01	Pic Box interrati.	135.000,00	135.000,00	135.000,00
A1	P.04.01	Sistemazione viabilità urbana e arredo, cablaggio reti e abbattimento barriere architettoniche.	200.000,00	150.360,82	150.360,82
		Sistemazione viabilità urbana e arredo, cablaggio reti e abbattimento barriere architettoniche. Opere di completamento		49.639,18	49.639,18
A1	P.04.02	Adeguamento norme di sicurezza impianto pubblica illuminazione nel centro abitato	125.397,00	100.367,71	100.367,71
		Adeguamento norme di sicurezza impianto pubblica illuminazione nel centro abitato. Opere di completamento		25.029,29	25.029,29
A2	P.05.01	Risanamento ambientale parco fluviale Maglie	0,00	0,00	0,00
A2	P.06.01	Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali	99.176,00	74.858,13	74.858,13
		Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali. Opere di collegamento		24.317,87	24.317,15
A1	P.F2.01.02	PIC Casa Sicura Messa in sicurezza, impiantistica e cablaggio	115.000,00	115.000,00	34.500,00
A2	P.F2.04.03	Adeguamento Impianto di pubblica illuminazione del centro abitato (2° Lotto)	75.000,00	68.154,99	68.154,99
		Adeguamento Impianto di pubblica illuminazione del centro abitato (2° Lotto). Opere di completamento		6.845,01	0,00
A2	P.F2.04.04	Sistemazione viabilità urbana ed abbattimento barriere architettoniche del Centro Abitato (2° Lotto)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A2	P.F2.05.01	Risanamento Ambientale area parco fluviale Maglia e riqualificazione tratturo turistico per il lago del Pertusillo (2^ Lotto). A questo intervento è accorpato l'intervento P.05.01 Fase I di € 190.000,00 che viene finanziato contestualmente.	110.000,00	110.000,00	0,00
			190.000,00	190.000,00	0,00
A2	P.F2.06.02	Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali 2^ lotto	114.754,01	104.700,00	94.645,99
		Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali 2^ lotto. Opere di completamento		10.054,01	0,00
C1	P.07.01	Sistemazione Campi da tennis, calcetto e calcio	196.089,00	163.000,47	163.000,47
		Sistemazione Campi da tennis, calcetto e calcio. Opere di completamento		33.088,53	33.088,53
C1	P.F2.07.02	Adeguamento Palestra comunale e Campo Sportivo	115.000,00	87.708,43	87.708,43
		Adeguamento Palestra comunale e Campo Sportivo. Opere di completamento		27.291,57	25.672,43
C5	P.08.01	Ristrutturazione locali ex scuola media per centro assistenziale ricreativo per fasce deboli	234.739,00	216.739,00	216.739,00
		Ristrutturazione locali ex scuola media per centro assistenziale ricreativo per fasce deboli. Opere di completamento		18.000,00	0,00
C5	P.F2.06	Adeguamento area cimiteriale	100.000,00	87.978,89	87.978,89
		Adeguamento area cimiteriale. Opere di completamento		12.021,11	12.021,11
		Risorse umane ed attrezzature connesse	65.000,00	65.000,00	63.605,20
		Risorse umane ed attrezzature connesse	67.096,00	67.096,00	62.025,46
TOTALI FASE I			1.355.401,00	1.355.401,00	1.306.005,48
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			936.850,01	936.850,01	522.707,30

TOTALI COMPLESSIVI	2.292.251,01	2.292.251,01	1.828.712,78
Importi espressi in euro			

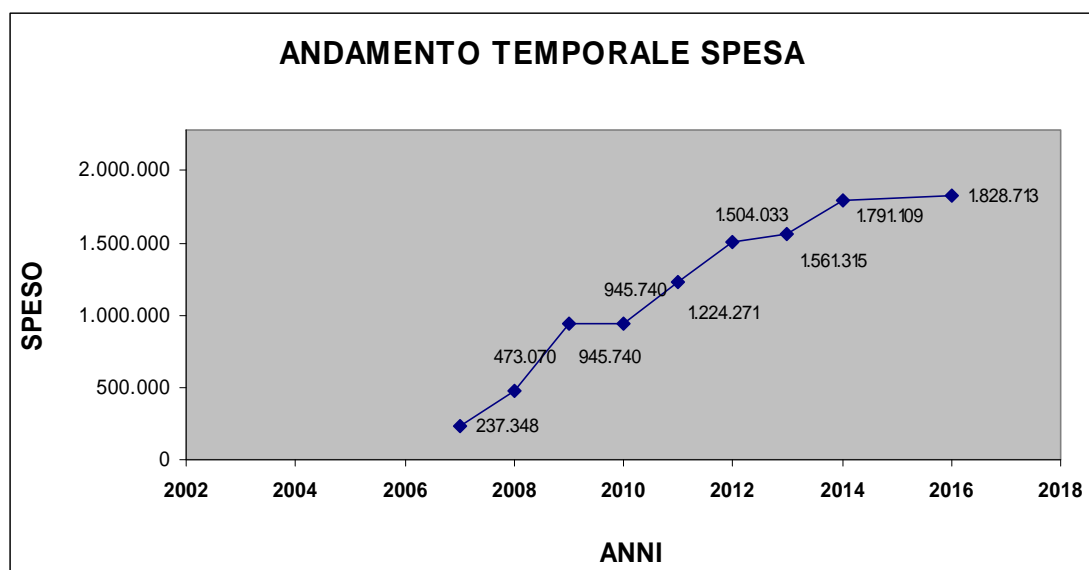


Grafico 26: Andamento temporale della spesa del Comune di Sarconi

Tabella 31: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Sasso di Castalda con relativa spesa

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA					
D.P.C. Fase I Appr. DGR 653/2006, 863/2006 e 273/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 968 del 14/04/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e arredo urbano rione Manca. L'intervento prima era di € 65.940,00 l'economia di € 12.727,88 è stata utilizzata per l'intervento P.01.03a	53.212,12	53.212,12	53.212,12
A1	P.01.02	Riqualificazione e arredo urbano nel Centro Storico. Rione Ospizio, Via Concezione, Via Pietà, Via del Popolo, Via S. Nicola e chiesetta S. Antonio Abate. L'intervento prima era di € 65.940,00 l'economia di € 23.943,47 è stata utilizzata per l'intervento P.01.03a	226.056,53	226.056,53	226.056,53
A1	P.01.03a	Sistemazione dell'area adiacente i box interrati.	36.671,35	36.671,35	36.666,31
A1	P.02.01	Recupero palazzo De Luca 2° Lotto.			126.820,20
	P.02.01a	Recupero palazzo De Luca. Opere di completamento	150.000,00	150.000,00	23.179,80
A1	P.03.01	Pic Facciate e coperture.	135.000,00	135.000,00	135.000,00
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura.	133.160,00	133.160,00	39.948,00
A1	P.05.01	Pic Box Interrati	50.000,00	50.000,00	40.613,44
A1	P.F2.01.01	Acquisizione e sistemazione urbanistico edilizia di fabbricati degradati del Centro Storico	250.000,00	250.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	PIC Facciate e coperture	160.000,00	160.000,00	48.000,00
A1	P.F2.03.01	PIC Casa Sicura	140.000,00	140.000,00	42.000,00
A1	P.F2.04.01	PIC Box Interrati	65.000,00	65.000,00	0,00
A1	P.F2.04.02	Lavori di completamento teatro comunale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A2	P.06.01	Riqualificazione Campeggio Madonna del Sasso	100.000,00	100.000,00	84.395,20
A2	P.06.01b	Lavori di compl. elettrificazione impianti e strutture ricettive - comprensorio sciistico Arioso Fossa Cupa.	90.000,00	90.000,00	89.559,73
A2	P.06.02	Completamento riqualificazione località Costara	50.000,00	50.000,00	42.566,67

A2	P.06.03	Itinerari in quota	90.000,00	90.000,00	0,00
A2	P.07.01	Rete idrica località Turri e sistemazione strade	100.000,00	100.000,00	81.184,66
A2	P.07.02	Lavori di adeguamento viabilità rurale Aciriello e Isca Cerasa	33.500,00	33.500,00	29.813,95
A2	P.F2.05.01	Sistemazione aree periurbane Zona Castello e Vallone della Manca	200.000,00	200.000,00	121.616,31
C1	P.08.01	Lavori di ristrutturazione impianti sportivi esistenti	231.600,00	194.757,03	194.757,03
C1	P.08.01b	Completamento lavori di ristrutturazione impianti sportivi esistenti		36.842,97	11.052,92
C1	P.F2.06.01	Sistemazione e potenziamento Impianti Sportivi leggeri nel centro urbano	50.000,00	50.000,00	49.924,26
C1	P.F2.06.02	Nuovo intervento in seguito alla rimodulazione della scheda da definirsi	50.000,00	50.000,00	0,00
C5	P.09.01.a	Centro diurno per anziani e fasce deboli	385.000,00	385.000,00	385.000,00
C5	P.09.01.b	Riqualificazione area di pertinenza del centro diurno per anziani.	41.826,00	41.826,00	41.825,46
C5	P.F2.07.01	Completamento e potenziamento Centro Diurno per Anziani e fasce deboli in località Aia la Croce	138.616,16	138.616,16	138.616,16
C5	P.F2.07.01	Completamento e potenziamento Centro Diurno per Anziani e fasce deboli in località Aia la Croce. Opere di completamento	31.383,84	31.383,84	31.383,84
C5	P.F2.07 bis	Lavori di riqualificazione dell'area cimiteriale. Questo intervento prima non c'era. E' stata modificata la Scheda Progetto	100.000,00	100.000,00	30.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	76.220,00	76.220,00	70.321,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	60.192,00	60.192,00	49.481,84
TOTALI FASE I			1.982.246,00	1.982.246,00	1.711.973,02
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.195.192,00	1.195.192,00	561.022,41
TOTALI COMPLESSIVI			3.177.438,00	3.177.438,00	2.272.995,43

Importi espressi in euro



Grafico 27: Andamento temporale della spesa del Comune di Sasso di Castalda

Tabella 32: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Satriano di Lucania con relativa spesa

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA					
D.P.C. Fase I Appr. DGR 1299/2006			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1491 del 28/06/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione P.zza Umberto I - Lavori di ristrutturazione Pubblica Illuminazione strade di accesso alla Piazza Umberto I	210.000,00	210.000,00	195.484,51
A1	P.02.01	Lavori di ristrutturazione ex Scuola Materna e realizzazione Casa della Solidarietà.	230.000,00	230.000,00	577.950,19
C5			360.000,00	360.000,00	
A1	P.02.02	Restauro Palazzo Guarino	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A1	P.02.03	Riqualificazione Piazza Garibaldi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
A1	P.03.01	PIC. Riqualificazione formale Facciate e coperture.	168.000,00	168.000,00	168.000,00
A1	P.03.02	Il Borgo Albergo completamento parcheggi c.so Trieste	30.000,00	30.000,00	27.000,00
A1	P.03.03	Costruzione autorimessa C.so Trieste. Parcheggi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
A1	P.F2.01.01	PIC Facciate e coperture centro storico. Questo intervento è scomparso e passa di fatto nella S.P. 02 per € 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.01.02	Riqualificazione verde pubblico Paschiero	79.000,00	79.000,00	79.000,00
A1	P.F2.01.03	Riqualificazione piazza Umberto I. 2^ Lotto	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A1	P.F2.01.04	Adeguamento impianto di pubblica illuminazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A1	P.F2.01.06	Il Lotto Castello	300.000,00	300.000,00	246.311,61
A1	P.F2.01.07	Adeguamento immobili Comunali Caserma dei Carabinieri	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A2	P.01.02	Lavori di riqualificazione Piazza S. Andrea	48.000,00	48.000,00	43.200,00
A2	P.01.03	Lavori di riqualificazione Largo Pantanelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00
A2	P.02.04	Completamento lungofiume	25.000,00	25.000,00	22.500,00
A2	P.04.01b	Riqualificazione Parco Belvedere	45.000,00	45.000,00	44.432,96
A2	P.04.01c	Completamento Via dei Pellegrini.	20.000,00	20.000,00	19.884,24
A2	P.04.01a	Riqualificazione Parco Spera	25.000,20	25.000,20	24.869,86
A2	P.04.02	Realizzazione infrastrutturale stradale per il Miglioramento della viabilità urbana. Fondovalle.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A2	P.04.03	Miglioramento viabilità Via dei Pellegrini.	40.000,00	28.500,00	38.059,50
				11.500,00	
A2	P.F2.02.01	Via dei Pellegrini - Pietra del Corvo	100.000,00	100.000,00	99.941,09
A2	P.F2.02.02	Isola ecologica	55.000,00	55.000,00	55.000,00
A2	P.F2.02.03	Viale Angelo Pascale - Ultima fase	42.000,00	42.000,00	42.000,00
A2	P.F2.02.04	Completamento isola ecologica	30.000,00	30.000,00	29.722,00
C1	P.05.01	Sistemazione campo sportivo.	140.000,00	140.000,00	139.934,38
C1	P.05.02	Ampliamento ed adeguamento strutture sportive. Adeguamento piscina in località Cannonica	138.500,00	138.500,00	138.085,66
C1	P.05.03	Realizzazione impianto di illuminazione	23.825,00	15.000,00	23.825,00
				8.825,00	
A1	P.F2.01.05 P.F2.03.04	Campo di calcetto. Prima l'intervento era Adeguamento ed abbattimento barriere architettoniche sede comunale	90.000,00	90.000,00	90.000,00
C5	P.F2.03.01	Miglioramento tecnologico Casa della Solidarietà	120.000,00	120.000,00	78.621,52
C5	P.F2.03.02	Completamento Asilo Nido	130.390,00	130.390,00	101.841,60
C5	P.F2.03.03	Adeguamento Istituto Comprensivo	70.000,00	70.000,00	53.798,10
		Risorse umane ed attrezzature connesse	75.998,00	75.998,00	75.183,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	35.000,00	35.000,00	34.721,04
TOTALI FASE I			2.069.323,20	2.069.323,20	2.028.409,30
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.331.390,00	1.301.390,00	1.160.956,96
TOTALI COMPLESSIVI			3.400.713,20	3.370.713,20	3.189.366,26

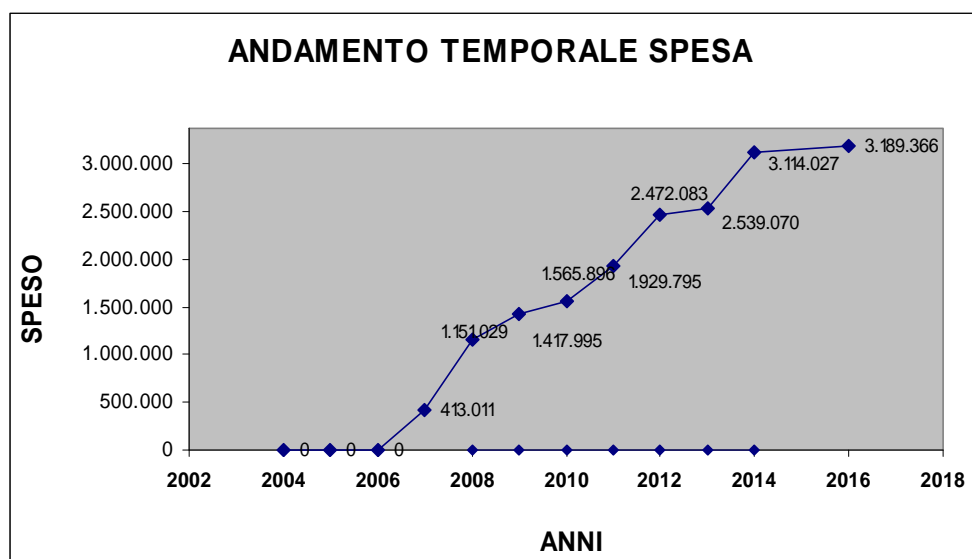


Grafico 28: Andamento temporale della spesa del Comune di Satriano di Lucania

Tabella 33: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Spinoso con relativa spesa

COMUNE DI SPINOSO					
D.P.C. Fase I Appr. DGR 1277/2006 e 2034/2006		D.P.C. Fase II Approvato con DD 530 del 03/03/2010			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Acquisizione palazzo Ranone	320.000,00	320.000,00	364.745,08
A1	P.01.0b*	Messa in sicurezza del Palazzo Ranone	45.000,00	45.000,00	
A1	P.01.02	Pic Facciate e coperture Piazza Plebiscito	25.000,00	25.000,00	7.500,00
A1	P.01.03	Riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza Plebiscito e del sottostante edificio polifunzionale.	497.743,00	497.743,00	120.966,00
A2		Riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza Plebiscito	308.697,00	308.697,00	
A1	P.F2.01.01	Restauro e consolidamento della Chiesa Madre e recupero percorsi sottostanti	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	P.F2.01.02	Completamento PIC Adeguamento tipologico delle facciate e delle coperture. Questo intervento prima non c'era. È stata variata la scheda progetto delle risorse umane detraendo l'importo di € 11.498,00. Di conseguenza alle risorse umane restano € 14.462,00. Con altra variazione viene accorpato l'imp. di € 11.498,00 al P.F2.02.01			
	P.F2.01.03	Realizzazione interventi di contenimento dei consumi energetici sulla casa comunale. Questo intervento prima non c'era. È stato eliminato l'intervento P.F2.06.03 Lavori di infrastrutturazione del Monte Raparo di € 25.000,00 e realizzato questo	25.000,00	25.000,00	0,00
A2	P.F2.06.01	Riqualificazione di un tratto spondale del lago del Pertusillo per la realizzazione di attrezzature finalizzate alla balneazione	250.000,00	250.000,00	0,00
A2	P.F2.06.02	Riqualificazione e completamento infrastrutture turistiche Monte Raparo	99.631,64	99.631,64	0,00

A2	P.F2.06.03	Lavori di infrastrutturazione turistica Monte Raparo. Questo intervento è stato eliminato. Al suo posto verrà realizzato il P.F2.01.03 Realizzazione interventi di contenimento dei consumi energetici sulla casa comunale per € 25.000,00	0,00	0,00	0,00
C1	P.02.02	Illuminazione artificiale campo sportivo	45.000,00	45.000,00	42.457,46
C1	P.02.03	Adeguamento funzionale campo di calcetto e tennis. L'economia di questo intervento di € 8.946,03 passa all'Int. P.F2.02.01	31.053,97	31.053,97	31.053,97
C1	P.F2.02.01	Palestra Comunale. Questo intervento proviene dalla Fase I. Con variazione successiva sono stati inseriti: l'economia dell'int. P.02.03 di € 8946,00, l'ec. Dell'int. P.F2.01.03 di € 11.498,00, l'intero importo dell'int. P.F2.02.01 di € 125.000,00	315.444,00	170.000,00 11.498,00 125.000,00 8.946,00	0,00
	P.F2.02.04	Palestra Comunale nell'area degli impianti sportivi. Con variazione viene accorpato l'imp. di € 11.498,00 al P.F2.02.01			
C5	P.03.01	Casa di riposo per anziani.	310.000,00	310.000,00	309.187,96
		Risorse umane ed attrezzature connesse	70.360,00	60.960,00	35.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse. È stata variata la scheda progetto detraendo l'importo di € 11.498,00 e spostandolo all'intervento P.F2.01.02 PIC facciate e coperture. Di conseguenza alle risorse umane restano € 14.462,00	14.462,00	14.462,00	6.284,20
TOTALI FASE I			1.652.853,97	1.643.453,97	910.910,47
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			864.537,64	719.093,64	166.284,20
TOTALI COMPLESSIVI			2.517.391,61	2.362.547,61	1.077.194,67
Importi espressi in euro					

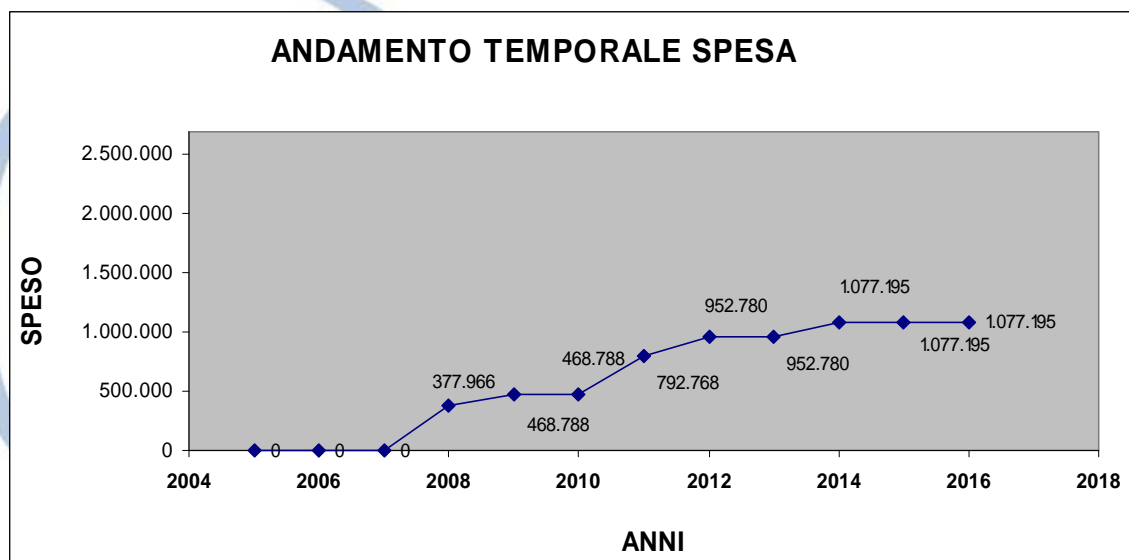


Grafico 29: Andamento temporale della spesa del Comune di Spinoso

Tabella 34: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Stigliano con relativa spesa

COMUNE DI STIGLIANO					
DPC Fase I presentato e in valutazione			DPC Fase II: nel DPC Fase I sono stati presentati anche gli interventi Fuori tetto finanziario che dovrebbero confluire nel DPC Fase II		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione aree centro urbano	200.000,00		
	P.01.02	Riqualificazione e completamento Piazza Garibaldi	150.000,00		
	P.01.03	Riqualificazione ed arredo area via Principe di Napoli	120.000,00		
	P.01.04	Risanamento e riqualificazione prospetti palazzo comunale	170.000,00		
	P.01.05	Riqualificazione ed arredo area circostante palazzo comunale	100.000,00		
	P.03.01	PIC Casa Sicura	150.000,00		
	P.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	350.000,00		
	P.04.02	Riqualificazione area Chiazza	98.936,81		
A2	P.04.01	Riqualificazione Area Centro Sociale	150.000,00		
	P.04.02	Riqualificazione Area Chiazza	56.791,33		
	P.04.03	Via del Grano - Ristrutturazione Mulino Desortis	80.000,00		
	P.05.01	Riqualificazione Borgata Serra di Croce	50.000,00		
	P.06.02	Realizzazione complesso sciistico	275.000,00		
C1	P.06.01	Consolidamento e riqualificazione stadio per il gioco del calcio	150.000,00		
	P.06.02	Realizzazione di un complesso sciistico	217.952,60		
	P.06.03	Realizzazione campo di bocce	50.000,00		
C5	P.07.01	Riqualificazione edificio ex INAM per la realizzazione di un centro di ascolto	150.000,00		
	P.07.02	Riqualificazione e completamento edificio ex INAM (piani superiori)	446.885,62		
	P.12.01	Risorse Umane ed attrezzature connesse	223.214,66	66.954,40	66.954,40
		TOTALE DPC FI	3.188.781,02	66.954,40	66.954,40
		TOTALE DPC FII	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO DPC	3.188.781,02	66.954,40	66.954,40

Tabella 35: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Tramutola con relativa spesa

COMUNE DI TRAMUTOLA					
D.P.C. Fase I Appr. DGR 1278/2006 e 1778/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 562 del 09/03/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Pic Facciate e coperture	450.000,00	450.000,00	443.701,20
A1	P.02.01*	Riqualificazione aree degradate	250.000,00	250.000,00	249.968,62
A1	P.02.02	Pubblica illuminazione centro abitato		50.484,02	50.484,02
	P.02.02a	Pubblica illuminazione centro abitato. Opere di completamento	70.000,00	19.515,98	19.515,98
A1	P.02.03	Lavori di riqualificazione ed arredo urbano, sistemazione piazzette Via Gioberti, Vico San Felice, Via Alighieri, Vico Castagne.		64.208,80	64.208,80
		Lavori di riqualificazione ed arredo urbano, sistemazione piazzette Via Gioberti, Vico San Felice, Via Alighieri, Vico Castagne. Opere di completamento	80.000,00	15.791,20	10.100,84

A1	P.F2.01.02	PIC Facciate e coperture. Questo Intervento è finanziato con una rimodulazione della Fase I e precisamente dall'imp. Dell'ex int. P.02.04 Pavimentazione e illuminazione pubblica, arredo cablaggio reti Piazzette ed assi prioritari	320.000,00	320.000,00	318.884,00
A1	P.F2.02.04	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Garibaldi	115.000,00	115.000,00	114.038,88
A1	P.F2.02.05	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Emanuele	90.000,00	1.224,00	71.900,02
		Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Emanuele. Opere di completamento		70.676,02	
A1	P.F2.02.06	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Emanuele. Opere di completamento	184.200,00	184.200,00	113.014,33
A1	P.F2.02.07	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Veneto	100.000,00	77.283,34	77.283,34
		Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Veneto. Opere di completamento		22.716,66	21.522,50
A1	P.F2.02.08	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Cavour - Via M. Pagano	75.000,00	75.000,00	22.500,00
A1	P.F2.02.09	Completamento illuminazione artistica del centro storico e del centro abitato	140.000,00	140.000,00	136.109,71
A1	P.F2.02.10	Risanamento ambientale e recupero urbano del centro storico	300.000,00	300.000,00	262.158,94
A1	P.F2.03.01	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici della scuola primaria	65.565,28	11.989,16	11.989,16
		Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici della scuola primaria. Opere di completamento		7.576,12	7.576,12
A1	P.F2.03.02	Recupero ex mulino San Carlo	100.000,00	100.000,00	36.311,00
A1	P.F2.03.03	Consolidamento e messa in sicurezza Palazzo terzella. Questa scheda è stata rimodulata e da € 55.000,00 ad € 15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.689,00
A1	P.F2.03.04	Ristrutturazione servizi igienici ed adeguamento impianto termico Scuola Materna Via Ferroni	75.394,00	64.277,88	64.277,88
		Ristrutturazione servizi igienici ed adeguamento impianto termico Scuola Materna Via Ferroni. In questo intervento è stato incluso il P.F2.07.04: Ristrutturazione servizi igienici ed adeguamento impianto termico scuola materna Via Ferroni		11.116,12	8.522,73
A2	P.05.01	Risanamento zona sorgente Capo d'Acqua	150.000,00	120.685,52	120.685,52
		Risanamento zona sorgente Capo d'Acqua. Opere di completamento		29.314,48	27.190,01
A2	P.06.01*	Completamento pubblica illuminazione zone rurali	70.000,00	70.000,00	67.098,68
A2	P.06.02	Pubblica illuminazione rurale	125.000,00	95.488,54	95.488,54
A2	P.06.02b	Pubblica illuminazione rurale (completamento)		29.511,46	29.511,46
A2	P.F2.06.03	Sistemazione viabilità nelle zone rurali	80.000,00	80.000,00	75.111,30
C1	P.07.01*	Completamento infrastrutture sportive in località Castiglione	33.310,00	33.310,00	32.763,44
C1	P.07.01b	Adeguamento campo di calcetto	10.000,00	10.000,00	3.000,00
C1	P.07.02	Recupero agibilità e messa a norma impianti sportivi in località Castiglione Area 167	61.000,00	61.000,00	61.000,00
C1	P.07.03	Potenziamento della fruibilità delle attrezzature sportive parco Caranna ed adeguamento della viabilità di collegamento agli impianti sportivi. + Opere di completam.	210.689,00	210.689,00	203.112,88
C5	P.08.01	Completamento strutturale per la trasformazione di una sala cinematografica in un Centro sociale polifunzionale denominato Centro 2000 Pace e Speranza	72.000,00	72.000,00	65.499,47
C5	P.08.01a	Completamento strutturale per la trasformazione di una sala cinematografica in un Centro sociale polifunzionale denominato Centro 2000 Pace e Speranza	188.000,00	188.000,00	56.400,00
C5	P.08.02	Completamento attrezzaggio centro assistenza fasce deboli.	103.856,00	103.856,00	103.855,90

		Sala "Spolidoro Lenni" + Opere di completamento			
C5	P.F2.08.01	Adeguamento ed ampliamento del Cimitero Comunale	262.333,44	262.333,44	262.333,44
		Adeguamento ed ampliamento del Cimitero Comunale. Opere di completamento	7.666,56	7.666,56	7.232,77
		Risorse umane ed attrezzature connesse	130.000,10	130.000,10	95.132,72
TOTALI FASE I			2.003.855,10	2.003.855,10	1.798.718,08
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.930.159,28	1.930.159,28	1.748.524,12
TOTALI COMPLESSIVI			3.934.014,38	3.934.014,38	3.547.242,20
Importi espressi in euro					



Grafico 30: Andamento temporale della spesa del Comune di Tramutola

Tabella 36: Stato di attivazione degli interventi previsti dalla I e II fase del DPC di Viggiano con relativa spesa

COMUNE DI VIGGIANO					
D.P.C. Fase I Appr. DGR 647/2006 e 1301/2006		DPC FASE II - NON E' STATO ANCORA PRESENTATO			
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Program.to	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	PIC Casa Sicura. Adeguamento statico e impiantistica.	358.000,00	358.000,00	322.200,00
A1	P.01.02	PIC Facciate e coperture. Riqualificazione percorsi urbani.	217.000,00	217.000,00	195.300,00
A1	P.01.03	Riqualificazione Centro storico. Abbattimento barriere architettoniche ed arredo urbano.	312.000,00	312.000,00	236.724,96
A1	P.01.04	Pic Box Interrati rioni Croci e S. Oronzo	438.750,00	438.750,00	0,00
A2	P.02.01	Sistema ecomusei Val d'Agri. Ostello verde	300.000,00	300.000,00	216.256,47
A2	P.02.02	Riqualificazione dell'area ex colonia	241.000,00	241.000,00	129.167,30
C1	P.03.01	Palestra Comunale	376.900,00	376.900,00	0,00
C5	P.04.01	Struttura polivalente da destinare ad attività culturali e socio assistenziali	475.100,00	475.100,00	295.444,89
		Risorse umane ed attrezzature connesse	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALI FASE I			2.798.750,00	2.798.750,00	1.475.093,62
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			0,00	0,00	0,00
TOTALI COMPLESSIVI			2.798.750,00	2.798.750,00	1.475.093,62
Importi espressi in euro					

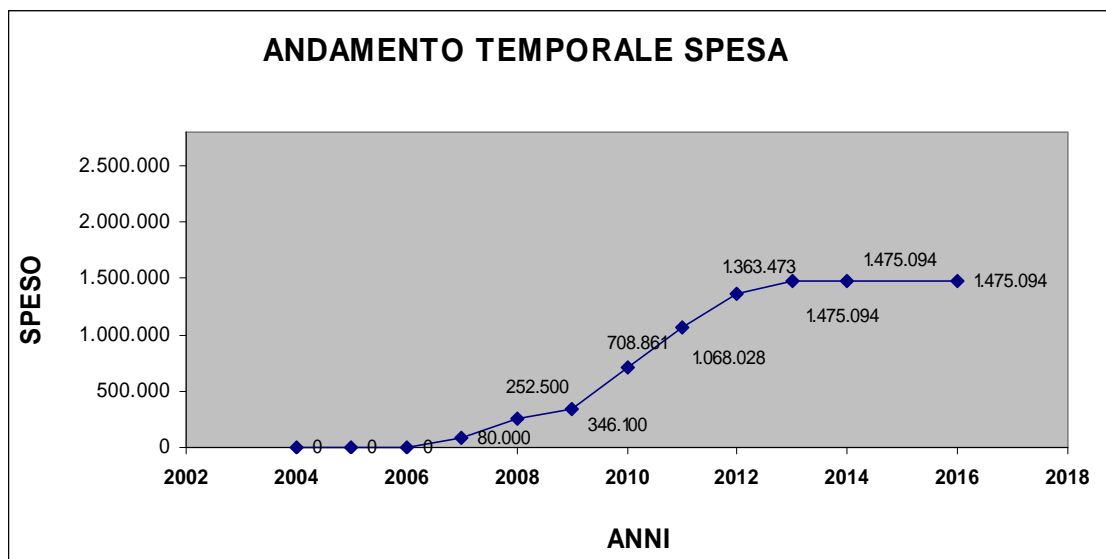


Grafico 31: Andamento temporale della spesa del Comune di Viggiano



L'EDILIZIA SCOLASTICA A TUTTO IL 31/12/2016 CONSTA DI N. 66 INTERVENTI TOTALI E DI QUESTI N. 43 INTERVENTI SONO CONCLUSI.

	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO AL 31/12/2016	SPESO AL 31/12/2015	AVANZAMENTO % SPESA
IMPORTO TOTALE	8.086.849,68	7.699.999,79	5.239.181,82	4.966.063,80	5,50%
€ 6.000.000,00 Importo stanziato per Ed. Sc. Con DGR 417/2006 al netto di € 54.515,61 del Comune di Gorgoglione che ha trasferito al DPC int. P.01.03	5.945.484,39				
5 NUOVI COMUNI	2.141.365,29				

Tabella 37: Quadro di sintesi edilizia scolastica

RIEPILOGO EDILIZIA SCOLASTICA						
N. INT.	PROGRAMMATO	FINANZIATO	SPESO AL 31/12/2015	SPESO AL 31/12/2016	% AVAN.TO SPESA SU FINANZ.TO	% AVAN.TO SPESA RISPETTO AL 31/12/15
66	6.000.000,00	6.000.000,00	4.966.063,80	4.984.181,82	83,07%	0,36%
66	6.000.000,00	6.000.000,00	4.966.063,80	4.984.181,82	83,07%	0,36%

Tabella 38: Quadro di sintesi edilizia scolastica

L'EDILIZIA DI CULTO A TUTTO IL 31/12/2016 CONSTA DI N. 102 INTERVENTI TOTALI E DI QUESTI N. 66 INTERVENTI SONO CONCLUSI.

	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO AL 31/12/2016	SPESO AL 31/12/2015	AVANZAMENTO % SPESA	% SPESA SU IMPEGNATO
IMPORTO TOTALE	13.814.650,09	12.900.249,36	11.137.052,74	10.415.938,69	6,92%	86,33%
5 NUOVI COMUNI	914.400,20	0,00	0,00	0,00		
INT. A COMPLET.	1.637.034,81	1.637.034,81	1.273.632,31	922.390,48		

Tabella 39: Quadro di sintesi edilizia di culto

RIEPILOGO EDILIZIA DI CULTO							
ENTE ATTUATORE	N. INT.	PROGRAMMATO	FINANZIATO	SPESO AL 31/12/2015	SPESO AL 31/12/2016	% AVAN.TO SPESA SU FINANZ.TO	% AVAN.TO SPESA RISPETTO AL 31/12/15
ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO E MARSICONUOVO	28	12.900.249,89	12.900.249,36	10.415.938,69	11.137.052,74	86,33%	6,92%
DIOCESI DI TURSI LAGONEGRO	21						
DIOCESI DI TRICARICO	20						
DIOCESI DI ACERENZA	4						
Mi.B.A.C.	14						
COMUNE DI SANT'ARCANGELO	2						
COMUNE DI CALVELLO	2						
TOTALI	91	12.900.249,89	12.900.249,36	10.415.938,69	11.137.052,74	86,33%	6,92%

Tabella 40: Quadro di sintesi edilizia di culto

LA VIABILITA' A TUTTO IL 31/12/2016 CONSTA DI N. 18 INTERVENTI TOTALI E DI QUESTI N. 6 INTERVENTI SONO CONCLUSI.

	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO AL 31/12/2016	SPESO AL 31/12/2015	AVANZAMENTO % SPESA	% SPESA SU IMPEGNATO
IMPORTO TOTALE	56.492.479,41	30.848.972,70	21.841.013,41	16.251.064,98	34,40%	70,80%
5 NUOVI COMUNI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		

Tabella 41: Quadro di sintesi viabilità

RIEPILOGO VIABILITA'							
ENTE ATTUATORE	N. INT.	PROGRAMMATO	FINANZIATO	SPESO AL 31/12/2015	SPESO AL 31/12/2016	% AVAN.TO SPESA SU FINANZ.TO	% AVAN.TO SPESA RISPETTO AL 31/12/15
PROVINCIA DI PZ	13	26.338.479,41	25.058.479,41	10.565.690,75	16.155.639,18	64,47%	52,91%
PROVINCIA DI MT	3	4.255.000,00	4.255.000,00	4.189.132,09	4.189.132,09	98,45%	0,00%
COMUNE DI ABRIOLO	1	1.150.493,29	1.150.493,29	1.150.493,29	1.150.493,29	100,00%	0,00%
COMUNE DI CALVELLO	1	385.000,00	385.000,00	345.748,85	345.748,85	89,80%	0,00%
TOTALI	18	32.128.972,70	30.848.972,70	16.251.064,98	21.841.013,41	70,80%	34,40%

Tabella 42: Quadro di sintesi viabilità
