



PROGRAMMA
OPERATIVO

VAL D'AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA



Estratto Report sullo stato di attuazione

del Programma Operativo
Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra


Aggiornato al 31 dicembre 2018



Introduzione

Il Report sullo stato di attuazione del Programma Operativo Val d'Agri, aggiornato al 31.12.2018, nel riportare la situazione relativa alla realizzazione degli interventi programmati, senza entrare nel dettaglio degli avanzamenti specifici di spesa legati alle singole misure e alle risorse utilizzate per le spese di gestione ed assistenza tecnica, fa registrare, rispetto alle risorse finanziate (impegnato) di circa 298 milioni di euro, un trend di spesa pari a circa 236 milioni di euro nel 2018, evidenziando un incremento di spesa di oltre 6 milioni di euro rispetto all'anno precedente, così come sintetizzato nel grafico successivo.

Grafico 1 : Trend di spesa complessivo del Programma Operativo Val d'Agri

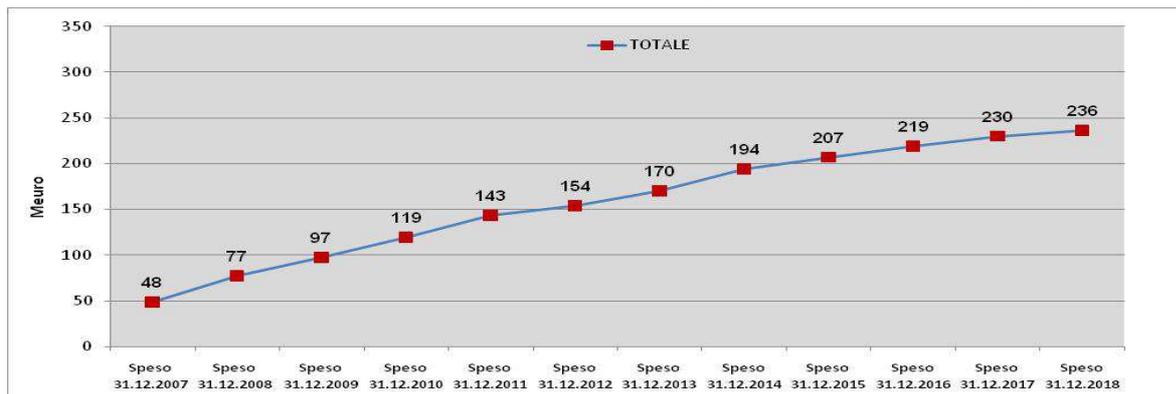

Per quanto attiene le operazioni infrastrutturali attuate dai Comuni nelle Tematiche A.1, A.2, C.1 e C.5, nel 2018 la spesa ammonta a circa 83,2 milioni di euro pari al 75% delle somme impegnate. Nel mese di novembre 2018 sono stati finanziati gli interventi di cui ai DPC dei cinque nuovi comuni.

L'edilizia di culto fa registrare una spesa che raggiunge l'81,45% rispetto alle risorse impegnate. L'intero programma sull'Edilizia di culto ha portato alla individuazione di complessivi 114 progetti.

Per quanto concerne gli interventi attivati con il programma di edilizia scolastica volti al recupero e alla messa in sicurezza, risulta speso il 75,67% delle somme finanziate con 49 interventi completati sui 74 previsti.

Per la viabilità risultano impegnate risorse per un importo pari a circa 36 Meuro ed a tutto il 2018 si è registrata una spesa di oltre 23,3 Meuro.

Gli investimenti per il turismo, legati alla realizzazione di un sistema turistico territoriale, anche se non fanno registrare significativi avanzamenti di spesa rispetto all'anno precedente sono, tuttavia, in avanzata fase di progettazione e realizzazione.

Il progetto Obiettivo Inclusione delle persone disabili ha visto la conclusione di 63 tirocini formativi e si registra la prosecuzione del progetto per i soggetti già beneficiari con il rinnovo dei tirocini per le annualità 2018 e 2019.

L'ultima parte del presente lavoro, invece, è dedicata al sostegno alle attività produttive. Per sostenere esclusivamente programmi di investimento aziendali, processi aggregativi, certificazioni di qualità e interventi formativi, sono stati attivati circa 36 bandi e programmate risorse finanziarie per circa 88 milioni di euro.

Nel corso del 2018 sono proseguite le erogazioni dei programmi di investimento ancora in corso volti alla "Creazione di attività imprenditoriali" e alla "Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese esistenti".

1. Operazioni infrastrutturali

1.1 Interventi infrastrutturali attuati dai Comuni

Il P.O. "Val d'Agri", ha destinato **350 mln** di euro per la realizzazione di interventi inerenti specifiche **Tematiche**:

- A** - Riqualficazione dei Centri Urbani – Architettura Paesaggistica e ambientale, Valorizzazione risorse naturali per **100 mln**;
- B** - Infrastrutture essenziali - Viabilità per **60 mln**;
- C** - Sport, Cultura, Scuola, Servizi Socio – Assistenziali per **55 mln**;
- D** - Regimi di Aiuto, Imprese e territorio, Assistenza Tecnica per **135 mln**.

Una parte della dotazione finanziaria complessiva del Programma è stata assegnata direttamente ai Comuni del comprensorio affinché avessero la possibilità di programmare e realizzare interventi infrastrutturali nelle **Tematiche A.1, A.2, C.1 e C.5**.

Lo strumento attraverso il quale i Comuni hanno deciso la propria strategia di sviluppo e la destinazione delle risorse finanziarie loro assegnate è il Documento Programmatico (DPC) che ogni amministrazione ha redatto.

Un percorso, quello dei DPC, che l'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri – Senese, già Struttura di Progetto "Val d'Agri", in questi anni, ha presidiato mediante attività di valutazione e approvazione degli stessi.

Per quanto concerne le risorse programmate, attribuite nella prima fase e successivamente con la ripartizione delle premialità accantonate ad inizio Programma (II fase), i DPC (inclusa anche la dotazione finanziaria dei 5 nuovi Comuni), si prevedono Interventi per un importo complessivo di oltre **€ 115.000.000,00** (di questi 7 milioni e 600 mila è la somma assegnata ai 5 nuovi Comuni).

Ad oggi è stato finanziato oltre il **96,53%** delle risorse programmate, mentre la spesa ammonta a circa 83 milioni e 242 mila euro pari al **75%** delle somme impegnate. Al 31/12/2018 si è registrato, rispetto allo scorso anno, un aumento percentuale di spesa del **4.00%** circa.

Come si evince da tabelle e grafico che seguono, relativamente ai 5 nuovi Comuni, lo "speso" al 31/12/2018, quasi pari a zero, comprende solo le risorse loro assegnate per la redazione dei DPC. Per la realizzazione degli interventi approvati nei DPC, il 21 novembre u.s. si è provveduto a garantire la copertura finanziaria degli stessi.

Tabella 1: Finanziamento DPC 5 nuovi Comuni

Comune	Finanziato al 31/12/2018	Speso al 31/12/2016	Speso al 31/12/2017	Speso al 31/12/2018	% di spesa su impegnato al 31/12/2018
ACCETTURA	1.566.527	36.231	36.231	36.231	2,31%
CASTELMEZZANO	921.563	19.286	19.286	19.286	2,09%
CIRIGLIANO	736.915	15.475	15.475	15.475	2,10%
PIETRAPERTOSA	1.177.197	24.721	24.721	24.721	2,10%
STIGLIANO	3.188.782	66.954	66.954	66.954	2,10%
TOTALI	7.590.984	162.668	162.668	162.667	2,14%

Tabella 2: Interventi previsti dai DPC Fase I e Fase II, ripartiti per singolo comune

QUADRO TEMPORALE DI SPESA DPC				
Comune e anno di Finanziamento DPC	Finanziato	Speso al 31/12/2016	Speso al 31/12/2017	Speso al 31/12/2018
ABRIOLA 2006	3.668.285	2.671.622	3.211.002	3.211.002
ACCETTURA 2018	1.566.527	36.231	36.231	36.231
ALIANO 2006	3.103.719	2.362.551	2.667.948	2.765.382
ANZI 2006	3.181.762	2.255.749	2.315.749	2.530.958
ARMENTO 2006	2.399.630	1.235.039	1.307.266	1.579.267
BRIENZA 2007	4.924.187	2.918.315	3.120.867	3.159.091
BRINDISI MONTAGNA 2006	2.763.692	1.637.286	1.884.062	2.250.739
CALVELLO 2006	3.474.513	1.912.696	1.933.047	2.066.068
CASTELMEZZANO 2018	921.563	19.286	19.286	19.286
CASTELSARACENO 2006	3.172.033	2.146.944	2.338.400	2.488.400
CIRIGLIANO 2018	736.915	15.475	15.475	15.475
CORLETO PERTICARA 2005	4.372.611	2.975.668	3.333.990	3.399.030
GALLICCHIO 2007	2.456.805	2.046.830	2.165.613	2.199.461
GORGOGNONE 2005	2.585.918	2.367.921	2.386.169	2.406.855
GRUMENTO NOVA 2006	2.896.727	1.473.073	1.951.477	1.951.477
GUARDIA PERTICARA 2005	2.150.356	1.206.342	1.341.929	1.520.830
LAURENZANA 2006	3.673.458	2.667.801	2.918.503	2.918.503
MARSICONUOVO 2006	6.268.829	4.995.836	5.575.667	5.753.929
MARSICOVETERE 2006	4.815.463	3.460.579	3.683.844	3.827.434
MISSANELLO 2006	2.138.025	1.385.133	1.461.269	1.499.832
MOLITERNO 2007	5.186.769	3.079.398	3.791.025	4.032.297
MONTEMURRO 2006	3.035.355	2.333.444	2.477.401	2.539.560
PATERNO 2006	3.580.604	2.036.966	2.555.090	2.555.090
PIETRAPERTOSA 2018	1.177.197	24.721	24.721	24.721
ROCCANOVA 2005	2.211.000	1.865.352	1.877.963	1.877.963
SAN CHIRICO RAPARO 2005	3.225.777	2.511.024	2.807.423	2.807.423


SAN MARTINO D'AGRI 2006	2.774.225	2.299.200	2.412.504	2.417.796
SANT'ARCANGELO 2006	6.811.266	6.542.233	6.648.041	6.648.041
SARCONI 2007	2.282.197	1.828.713	1.840.385	1.902.954
SASSO DI CASTALDA 2006	3.301.568	2.272.995	2.317.000	2.345.384
SATRIANO DI LUCANIA 2006	3.730.313	3.189.366	3.306.954	3.306.954
SPINOSO 2006	2.507.992	1.077.195	1.222.271	1.278.245
STIGLIANO 2018	3.188.782	66.954	66.954	66.954
TRAMUTOLA 2006	3.934.014	3.547.242	3.678.453	3.700.809
VIGGIANO 2006	2.798.750	1.475.094	1.475.094	2.138.429
TOTALI	111.016.827 *	73.940.276	80.169.074	83.241.871

* La differenza tra le Risorse programmate pari a € 115.000.000 ca e le risorse finanziate è da attribuire a una serie di situazioni quali: DPC (Fase II – premialità) non presentati da alcuni comuni e Interventi valutati non maturi o maturi condizionati.

Si riporta di seguito un grafico di raffronto tra le risorse finanziate e le risorse spese per ogni singolo comune, tenendo conto altresì della data di approvazione del DPC (riportata a lato).



Grafico 2 : Trend di spesa complessivo delle operazioni infrastrutturali realizzate dai Comuni

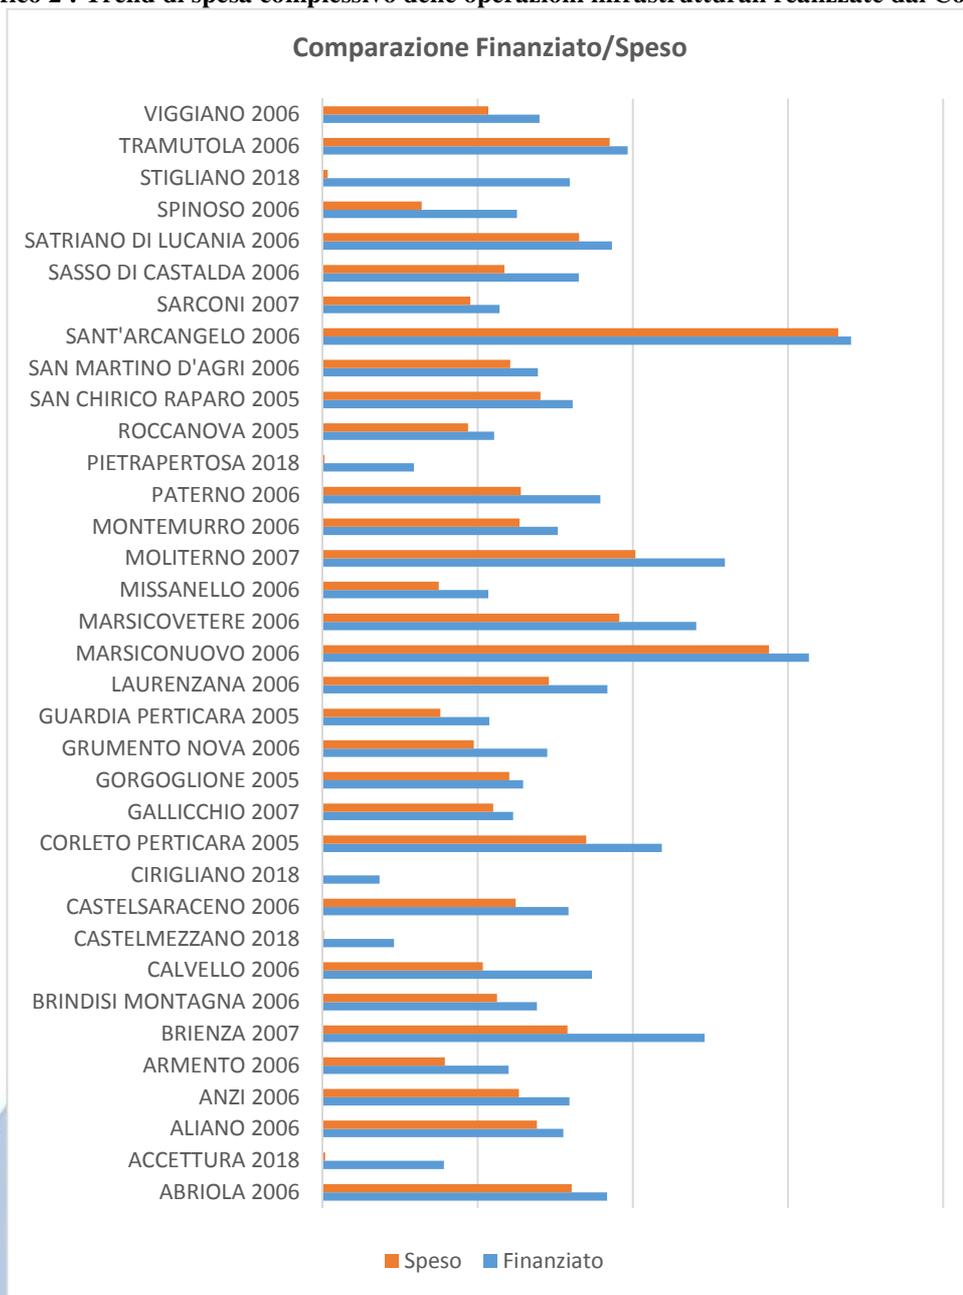

Di seguito si riportano le tabelle dei singoli Comuni con indicazione degli interventi previsti nella Fase I e Fase II (premierità), evidenziando il livello della spesa al 31/12/2018.

L' eventuale scostamento tra le risorse finanziate e il livello della spesa riferito ad ogni singolo intervento concluso, è una economia accertata.

Legenda Tabella

	Interventi finanziati F1
	Interventi finanziati F2 (premierità)
	Interventi conclusi

Scheda programmatica 1: Interventi previsti nel DPC Del comune di Abriola

COMUNE DI ABRIOLA				
DPC. Fase I Appr. con DGR 1068/2006 e DGR 1926/2006			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1944 del 13/09/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.03	Riqualificazione luoghi caratteristici del centro urbano. Via dei Fuochi	200.000,00	200.000,00
A1	P.01.04	Parceggio a servizio della struttura sportiva polifunzionale e scuola media. L'importo di € 15.925,99 è stato spostato alla P.F2.01.03	0,00	0,00
A1	P.F2.01.01	Lavori di manutenzione viabilità interna (ex Centro storico recupero piazze)	39.462,48	39.462,48
A1	P.F2.01.01a	Lavori di manutenzione viabilità interna (ex Centro storico recupero piazze). Opere di completamento	10.537,52	9.521,95
A1	P.F2.01.02	Ristrutturazione Palazzo Passarelli. A questo intervento è stato accorpato quello della Fase I per € 381.282,43	811.282,43	730.154,18
A1	P.F2.01.03	Lavori di completamento ristrutturazione Palazzo Passarelli. Questo intervento è scaturita dalla rimodulazione del DPC del 30/11/2016	324.210,49	239.063,33
A1	P.F2.01.05	Riqualificazione luoghi caratteristici del centro abitato - Piazza Marconi. A questo intervento è stato accorpato quello della Fase I per € 134.340,12	134.340,12 15.000,00	145.027,03
A1	P.02.02	Salone Comunale. Con DD del 30/11/16, è stata variata la S. P. Parte di questo intervento.	62.861,33	106.215,29
A1	P.02.01a	Salone Comunale. Opere di completamento	12.843,32	0,00
A1	P.02.03	Riqualificazione zona ingresso del paese	8.725,80	2.617,74
A2	P.04.01	Riqualificazione ambientale Area Burgaro. Parco fluviale	484.029,10	484.028,80
A2	P.04.02	Riqualificazione ambientale Area Tintiera - recupero paesaggistico	71.970,90	71.970,90
A2	P.F2.04.02	Area Tintiera (recupero paesaggistico)	80.000,00	9.651,36
A2	P.F2.04.03	Area Arioso (recupero paesaggistico)	99.500,00	70.672,29
A2	P.06.02	Strada Rurale Cascinali - Saucino	39.000,00	38.905,38
A2	P.F2.06.03	Adeguamento strada rurale Contrada Cerreta - Braida	55.486,77	54.185,77

A2	P.F2.06.04	Adeguamento strada rurale Contrada Valloni - Pisciole	30.000,00	0,00
A2	P.F2.06.05	Adeguamento strada rurale Torrente Marsicano	20.000,00	0,00
C1	P.08.01	Completamento struttura polifunzionale in Via Gelsi - I^ Lotto	166.165,68	165.755,50
C1	P.08.02	Completamento struttura polifunzionale in Via Gelsi - II^ Lotto	162.180,10	162.180,10
C1	P.08.09	Completamento ristrutturazione palestra comunale	18.354,31	18.353,06
C1	P.F2.08.06	Ristrutturazione Campo Sportivo Comunale	51.000,00	36.893,20
C1	P.F2.08.08	Miglioramento Impiantistica Palestra Comunale	54.500,00	46.767,46
C5	P.08.04	Centro diurno per anziani	50.000,00	50.000,00
C5	P.08.05	Ampliamento cimitero comunale - 2^ stralcio	471.998,51	424.798,66
A1		Gestione DPC	88.500,00	22.750,00
C5	P.F2.08.07	Manutenzione straordinaria Villa Comunale. Arredo Parco Giochi	95.336,16	82.027,77
C5	P.F2.08.10	Museo Todisco	11.000,00	0,00
TOTALI FASE I			1.836.629,05	1.747.575,43
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.831.655,97	1.463.426,82
TOTALI COMPLESSIVI			3.668.285,02	3.211.002,25
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 2: Interventi previsti nel DPC del comune di Accettura

COMUNE DI ACCETTURA				
DPC Fase I Finanziato con DD N. 3585 del 21/11/2018		DPC Fase II: nel DPC Fase I sono stati presentati anche gli interventi Fuori tetto finanziario che dovrebbero confluire nel DPC Fase II		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e arredo Largo San Vito	170.000,00	
	P.01.02	Riqualificazione e adeguamento Via Rione Torre e Via Cesare Battisti	270.000,00	
	P.02.01	PIC - Adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e coperture	138.988,33	
A2	P.03.01	Completamento e sistemazione strada Le Rocche	134.000,00	
	P.03.02	Completamento strada Ferrari	110.000,00	
	P.03.03	Completamento strada Camilio	50.000,00	
C1	P.04.01	Miglioramento campo calcio A5 in località San Pietro. Realizzazione tappeto in erba sintetica, costruzione copertura e tribuna, sistemazione spogliatoi esistenti da annessare alla struttura	239.000,00	
C5	P.05.01	Realizzazione di una nuova struttura da adibire a centro sociale polifunzionale (1^ lotto funzionale)	330.000,00	
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	120.769,66	36.230,90
		Somma impegnata (428/2012)	3.769,10	
TOTALI FASE I			1.566.527,09	36.230,90
TOTALI COMPLESSIVI			1.566.527,09	36.230,90
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 3: Interventi previsti nei DPC del Comune di Aliano

COMUNE DI ALIANO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1552 del 31-10-2006, 2^ Appr. DGR 1777 del 28-12-2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 969 del 14/04/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione Piazzetta Roma	95.000,00	28.500,00
A1	P.01.02	Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII	65.000,00	65.000,00
A1	P.01.03	Riqualificazione Piazza Garibaldi	47.883,59	47.883,59
		Riqualificazione Piazza Garibaldi. Opere di completamento	17.116,41	18.570,68
A1	P.01.04	Riqualificazione Rione Levi - Riconversione Museo delle Tele.	47.300,00	46.062,13
A1	P.01.05	Toponomastica	17.700,00	17.700,00
A1	P.F2.01.01	Lavori di riqualificazione Via Mercato e Zona Carmine	170.000,00	105.309,04
A1	P.F2.01.02	Lavori di riqualificazione zona vico Roma e ripristino Mercato Coperto	200.000,00	199.958,85
A1	P.02.01	Completamento Sala Polifunzionale Via Cisterna.	90.000,00	80.146,34
A1	P.02.02a	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo Caporale	140.000,00	140.000,00
A1	P.02.03a	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo De Franchi	150.000,00	135.384,00
A1	P.02.04	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo Scardaccione	110.000,00	106.714,00
A1	P.02.04a	Attivazione di divulgazione e valorizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali realizzate con i fondi PO.		
A1	P.03.01a	PIC - Facciate e coperture. I Fase	155.000,00	90.000,00
A2	P.F2.02.01	Lavori di sistemazione strada rurale Calanche - San Leuce.	60.000,00	44.337,33
A2	P.06.01a	Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello Nuovo	76.829,73	76.829,73
		Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello Nuovo. Opere di completamento	23.170,27	9.960,39
A2	P.06.02a	Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello di sotto	80.116,22	80.116,22
		Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello di sotto. Opere di completamento	19.883,78	19.651,25
A2	P.06.03a	Il percorso dei calanchi	36.655,79	36.655,79
		Il percorso dei calanchi. Opere di completamento	13.344,21	13.344,21

A2	P.07.01a	Acquedotto rurale in località Leo	74.794,45	74.794,45
		Acquedotto rurale in località Leo. Opere di completamento	25.205,55	25.094,15
A2	P.07.01b	Acquedotto rurale in località Alvanello	30.000,00	29.998,93
A2	P.07.02	Sistemazione strade Aliano-Pantano e S.C. Leo-SS 598	64.962,38	64.962,38
A2	P.07.02b	Sistemazione strade Aliano-Pantano e S.C. Leo-SS 598. Opere di completamento	15.037,62	15.037,40
A2	P.07.03a	Sistemazione strade Contrada Serre	33.000,00	32.992,86
C1	P.08.01a	Copertura e potenziamento campo di calcetto	118.536,20	118.536,20
			15.911,06	15.911,06
C1	P.08.01b	Copertura e potenziamento campo di calcetto. Opere di completamento.	11.463,80	11.332,53
			10.088,94	10.062,68
C1	P.08.02a	Realizzazione campo da tennis, pallavolo e pallacanestro.	30.657,32	30.657,32
		Realizzazione campo da tennis, pallavolo e pallacanestro. Opere di completamento	9.342,68	9.342,61
C1	P.08.03a	Realizzazione palestra ad uso pedagogico.	89.332,59	89.332,59
		Realizzazione palestra ad uso pedagogico. Opere di completamento	11.267,41	0,00
C1	P.F2.03.01	Completamento Tendostruttura	70.000,00	69.336,54
C1	P.F2.03.02	Sistemazione Campo Sportivo	20.000,00	19.740,42
C1	P.F2.03.03	Campo Calcetto Alianello Nuovo	23.779,20	23.779,20
		Campo Calcetto Alianello Nuovo. Opere di completamento	6.220,80	6.220,80
C5	P.09.01	Riconversione ex Municipio in struttura socio sanitaria. Punto Salute. Lavori edili	50.000,00	45.091,68
C5		Riconversione ex Municipio in struttura socio sanitaria. Punto Salute. Acquisto attrezzature	3.084,00	3.084,00
C5	P.09.01a	Riconversione ex Municipio in struttura socio sanitaria. Punto Salute. Opere di completamento	46.916,00	0,00
C5	P.09.02a	Centro socio assistenziale- 1° Lotto Funzionale	199.426,86	199.426,86
		Centro socio assistenziale- 1° Lotto Funzionale. Opere di completamento	54.373,14	54.372,55
C5	P.09.02b	Centro socio assistenziale- 2° Lotto Funzionale	60.000,00	55.830,09

C5	P.F2.04.01	Completamento centro sociale diurno palazzo Scardaccione	63.422,32	63.422,32
	P.F2.04.01a	Completamento centro sociale diurno palazzo Scardaccione. Opere conclusive	36.577,68	32.748,70
C5	P.F2.04.02	Sistemazione monumentale zona Tomba Carlo Levi	140.479,68	140.479,68
	P.F2.04.02a	Sistemazione monumentale zona Tomba Carlo Levi. Opere di completamento	39.520,32	36.362,47
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	100.000,00	100.000,00
	P.F2.05.01	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	35.319,00	25.307,96
TOTALI FASE I			2.238.400,00	1.998.378,67
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			865.319,00	767.003,31
TOTALI COMPLESSIVI			3.103.719,00	2.765.381,98
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 4: Interventi previsti nei DPC del Comune di Anzi

COMUNE DI ANZI				
DPC Fase I Approvazione con D.G.R. 1276 del 04/09/2006		DPC Fase II - Approvazione con D.D. n. 7132/2012/D.00314 del 09/03/2012		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Ripristino pavimentazione in Via Lacava, Piazza Dante Alighieri e Via Garibaldi	420.000,00	420.000,00
A1	P.F2.01.05	Arredo urbano nel centro storico	200.000,00	173.209,21
A1	P.F2.01.10	Restauro conservativo dei locali al primo piano di palazzo Zampaglione (sala consiliare e locale antistante)	200.000,00	94.247,18
A1	P.F2.01.11	Riattamento della copertura del parcheggio urbano in località Madonna delle Grazie da destinare a tetto solare fotovoltaico e parco giochi per l'infanzia con completamento della viabilità di accesso	170.000,00	153.000,00
A1	P.01.02	Riqualificazione del salone dell'Annunziata e laghetto antistante	209.614,85	209.978,00
A2	P.F2.02.05	Adeguamento e miglioramento della viabilità rurale nel territorio comunale	200.000,00	57.244,50
A1	P.01.03	Riqualificazione e restauro locale seminterrato del Palazzo Zampaglione	220.000,00	188.680,36
A1	P.01.04	Realizzazione rampe di accesso 1° e 2° livello parcheggio Madonna delle Grazie	150.000,00	121.846,84
A2	P.02.01	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale campo Polivalente località Convento.	138.000,00	41.400,00
C1				
A2	P.02.02	Riqualificazione ambientale area limitrofa sede municipale con fine spazio relax.	100.000,00	30.000,00
A2	P.02.03	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale Area S. Maria e ammodernamento strada di collegamento.	100.000,00	100.000,00
A2	P.02.04	Adeguamento e miglioramento viabilità comunale Vallone dell'Inferno.	160.000,00	160.000,00
A1	P.03.01	Potenziamento centro sportivo località S. Donato e intervento di riqualificazione ambientale.	111.770,40	386.032,88
C1		Potenziamento centro sportivo località S. Donato e intervento di riqualificazione ambientale.	275.000,00	
C1	P.F2.03.05	Completamento dell'adeguamento funzionale ed impiantistico del campo sportivo comunale	30.000,00	0,00
C5	P.04.01	Potenziamento infrastrutture socio - assistenziali ed acquisto	40.000,00	40.000,00

		pulmino.		
C5	P.04.02	Completamento strutturale ed adeguamento funzionale dei locali di palazzo Zampaglione per finalità socio - assistenziali.	293.460,00	293.460,00
C5	P.04.03	Completamento funzionale locali comunali (ex ufficio tecnico) da destinare a centro diurno anziani e ludoteca.	13.058,06	0,00
C5	P.04.03a	Interventi per il contenimento dei consumi energetici dei locali per attività soci - assistenziali e sanitarie ubicate nell'edificio dell'istituto comprensivo.	68.508,52	34.159,36
		Gestione DPC e PIC	27.440,00	20.000,00
		Gestione DPC e PIC	54.910,01	7.700,00
TOTALI FASE I			2.326.851,83	2.045.557,44
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			854.910,01	485.400,89
TOTALI COMPLESSIVI			3.181.761,84	2.530.958,33
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 5: Interventi previsti nei DPC del Comune di Armento

COMUNE DI ARMENTO				
D.P.C. Fase I approvato con DGR n. 645/2006 e 750/2009			D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 57 del 22/01/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01a	Canalizzazione acque meteoriche in Piazza Umberto I	60.000,00	46.473,32
A1	P.01.01b	Canalizzazione acque meteoriche in Piazza Umberto I (Completamento)	Autorizzato utilizzo economie	0,00
A1	P.01.02	Completamento zona S. Vitale	20.000,00	18.868,10
A1	P.01.03	Lavori di riqualificazione Largo Fontanelle	53.000,00	43.487,14
A1	P.01.04	Riqualificazione zona a valle di Piazza Umberto I	167.787,11	151.008,40
A1	P.01.04	Riqualificazione zona a valle di Piazza Umberto I. Opere di completamento	32.212,89	0,00
A1	P.03.01a	PIC Facciate e Coperture. Attivazione ambito pilota 1	35.000,00	34.992,22
A1	P.03.01b	PIC Facciate e Coperture. Attivazione asse di Priorità 1	198.000,00	159.980,18
A1	P.04.01	PIC Casa Sicura	150.000,00	150.000,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione asse da San Luca a San Vitale	258.000,00	162.273,23
A1	P.F2.02.01	PIC - Casa Sicura	50.000,00	20.857,54
A1	P.F2.03.01	PIC - Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	50.000,00	0,00
A2	P.06.01	Completamento acquedotto rurale in località "Serra Pascarelli"	90.000,00	74.229,45
A2	P.06.02	Acquedotto rurale loc. Itlei, Tempa Candore, Tempa Virgilio e Valle Grande	282.000,00	192.525,51
A2	P.F2.04.01	Antichi tratturi Ippoturismo sentieristica	80.000,00	56.697,39
A2	P.F2.05.01	Miglioramento viabilità ed acquedotto rurale C.da Capannone - Serra Mauta e Piano di Campo - Sant'Eramo	100.000,00	76.111,92
C1	P.07.01a	Sistemazione campo di calcetto	12.200,00	9.895,70
C1	P.07.01b	Completamento campo di calcetto e sistemazione campo sportivo	7.800,00	3.935,23
C1	P.07.02	Centro polivalente zona Lavinaro	205.000,00	0,00
		Centro polivalente zona Lavinaro. Attrezzaggio	66.000,00	0,00
C1	P.F2.07.01	Centro sociale polivalente Lavinaro. Questo intervento ha un costo pari a € 112.900,00, però è maturo condizionato per cui	0,00	0,00

		l'impegno non è stato ancora fatto		
C5	P.F2.07.02	Centro sociale polivalente Lavinaro. Questo intervento ha un costo pari a € 145.600,00, però è maturo condizionato per cui l'impegno non è stato ancora fatto	0,00	0,00
C5	P.08.01a	Realizzazione di una ludoteca	59.000,00	50.653,72
C5	P.08.02a	Realizzazione di una biblioteca e Mediateca Multimediale	141.000,00	130.534,54
C5	P.08.03	Adeguamento funzionale Sala Falcone - Borsellino	72.000,00	63.661,71
C5	P.08.04a	Centro sociale polivalente Lavinaro	66.000,00	0,00
C5	P.F2.06.01	Potenziamento Ludoteca e Mediateca.	20.000,00	19.747,95
		Oneri di programmazione	73.800,00	73.800,00
	P.F2.09	Risorse umane ed attrezzature connesse	50.830,00	39.533,47
TOTALI FASE I			1.790.800,00	1.204.045,22
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			608.830,00	375.221,50
TOTALI			2.399.630,00	1.579.266,72
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 6: Interventi previsti nel DPC del Comune di Brienza

COMUNE DI BRIENZA				
D.P.C. Fase I approvato con DGR n. 544/2007 e 1471/2008		D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 974 del 14/04/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Illuminazione artistica del Borgo	37.827,97	37.872,97
A1	P.01.02	Riqualificazione Piazza Guglielmo Marconi e Via S. Giovanni Bosco	586.059,52	586.059,52
A1	P.01.02	Riqualificazione Piazza Guglielmo Marconi e Via S. Giovanni Bosco. Opere di completamento	113.940,48	98.918,90
A1	P.01.03	Toponomastica e arredo urbano centro storico	50.000,00	48.934,17
A1	P.01.04	Riqualificazione Via Maruggi	75.794,79	75.794,79
A1	P.01.04a	Riqualificazione e completamento Via Maruggi e Vico Belledonne	24.205,21	23.882,87
A1	P.02.01	Ristrutturazione palazzo Paternoster	500.000,00	409.925,30
A1	P.02.02	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Palazzo Comunale (sede Municipale)	100.000,00	100.000,00
A1	P.02.03	Completamento comparto 24/30	440.000,00	207.807,15
A1	P.F2.05.05	Riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I e ponte di collegamento alla viabilità principale. Parte di questo intervento per € 400.000,00 è stato accorpato al P.F2.08.02	200.000,00	148.401,40
A2	P.05.01*	Restauro Mulini e Ponticelli (Cofinanziamento PIT)	9.411,00	9.411,04
A2	P.06.01*	Recupero e sistemazione area Cappella Madonna degli Angeli	21.789,00	21.789,00
A2	P.06.02a	Ripristino viabilità contrada "Monte"	49.667,44	49.667,44
A2	P.06.02b	Lavori di illuminazione contrada Monte	86.041,68	86.041,68
A2	P.06.02.c	Lavori di illuminazione Contrada Monte. Opere di completamento	13.958,32	13.958,32
A2	P.06.03a	Riqualificazione area antistante Chiesa Madonna degli Schiavi	30.000,00	30.000,00
A2	P.06.03b	Ristrutturazione centro socio educativo per disabili "La Fattoria Burgentina"	40.279,13	40.279,13
A2	P.06.03c	Sistemazione strada di collegamento ex scuola elementare Pergola"	55.518,24	55.518,24

A2	P.06.04	Lavori di completamento e riqualificazione della contrada Monte e della Contrada Schiavi. Questo intervento non esisteva. Scaturisce dalle economie di altri interventi	32.880,15	32.880,15
A2	P.F2.06.03	Sistemazione strada rurale Monte	192.435,80	192.435,80
A2	P.F2.06.03a	Sistemazione strada rurale Monte. Opere di completamento	57.564,20	56.851,19
A2	P.F2.06.07	Illuminazione rurale Contrade Castellone e Visciglietta	80.000,00	80.000,00
A2	P.F2.06.08	Illuminazione rurale Contrada Chiuse	61.429,65	61.429,65
		Illuminazione rurale Contrada Chiuse. Opere di completamento	19.168,01	19.168,01
A2	P.F2.08.02	Riqualificazione edificio scolastico ex Scuola Media per realizzazione Centro sociale Polifunzionale. A questo intervento è stato accorpato l'int. P.05.02 Opere per la protezione e la fruizione paesistica del territorio per € 78.000,00; l'int. P.07.01 Lavori di completamento impianto sportivo polivalente e riqualificazione ambientale del campo di calcio e sistemazione aree circostanti per € 525.000,00; parte dell'int. P.F2.05.05 Riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I e ponte di collegamento alla viabilità principale per € 400.000,00 più € 70.000,00 dell'int. P.F2.05.06 Riqualificazione asta fluviale centro urbano.	1.355.243,00	0,00
C1	P.07.01	Lavori di completamento impianto sportivo polivalente e riqualificazione ambientale del campo di calcio e sistemazione aree circostanti.	562.435,05	562.435,05
		Lavori di completamento impianto sportivo polivalente e riqualificazione ambientale del campo di calcio e sistemazione aree circostanti. Opere di completamento	37.564,95	33.808,45
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	90.973,00	75.820,69
TOTALI FASE I			2.958.345,93	2.600.804,86
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.965.840,66	558.286,05
TOTALI			4.924.186,59	3.159.090,91
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 7: Interventi previsti nei DPC del Comune di Brindisi Montagna

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA				
D.P.C. Fase I approvato con DGR n. 796/2006 e 1927/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 0063 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01.a1	Riqualificazione urbana zona Chiesa Maria SS. Delle Grazie.	10.000,00	9.948,88
A1	P.01.01.a2	Riqualificazione urbanistica ed arredo urbano aree urbane e periurbane	187.735,76	187.735,76
A2	P.01.01.a3	Riqualificazione urbanistica ed arredo urbano zona caserma	47.264,24	47.264,24
A1	P.02.01a	Recupero e riutilizzo ex scuola Materna Comunale e opere di completamento	290.000,00	290.000,00
A1	P.03.01	P.I.C. Facciate e coperture centro storico	90.000,00	27.000,00
A1	P.04.01	P.I.C. Casa Sicura	42.500,00	21.250,00
A1	P.05.01	P.I.C. Box Interrati	64.715,52	64.715,52
		P.I.C. Box Interrati. Opere di completamento	15.284,48	0,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione centro storico Via Porta Pia e Corso Garibaldi Via Monte Picone	140.000,00	139.997,57
A1	P.F2.02.01	Potenziamento Centro ex Scuola Materna Comunale	200.000,00	181.409,44
A1	P.F2.03.01	PIC - Facciate e delle coperture	60.000,00	0,00
A1	P.F2.04.01	PIC - Casa Sicura	60.000,00	0,00
A1	P.F2.05.01	PIC - Box Interrati. Con DD 1281 del 18/07/2017 è stato eliminato questo intervento	0,00	0,00
A1	P.F2.06.01	Fruizione zona castello e aree limitrofe	180.000,00	159.059,34
A2	P.06.01*	Fruizione torretta castello	150.000,00	136.877,23
A2	P.07.01a	Sistemazione strada Casoni - Porcili - Potenza e completamento	80.000,00	79.365,00
A2	P.07.02b	Sistemazione strada Serra - Ponte dell'Inferno e completamento	80.000,00	79.665,33
A2	P.F2.06.02	Riqualificazione aree urbane e periurbane. Zona Fontana Grande	120.000,00	0,00
A2	P.F2.07.01	Sistemazione strada Aia Chiaffa - Casone	132.582,78	132.582,78
A2	P.F2.07.01a	Sistemazione strada Aia Chiaffa - Casone. Opere di completamento	7.417,22	0,00

C1	P.08.01*	Costruzione Struttura sportiva polivalente - Campo calcetto e opere di completamento	146.000,00	145.746,86
C1	P.08.02	Completamento e Potenziamento campo di calcio	38.300,00	38.300,00
C1	P.08.03	Ripristino funzionale Palestra Comunale	5.000,00	4.939,42
C1	P.F2.08.01	Completamento impianto sportivo polivalente. Campo di calcetto	50.000,00	50.000,00
C1	P.F2.08.02	Potenziamento e completamento strutture sportive per la terza età	50.000,00	0,00
C5	P.09.01a	Sistemazione ed attrezzaggio centro di inserimento sociale	183.000,00	165.666,08
C5	P.09.02a	Ristrutturazione immobile da adibire a centro socio - Assistenziale	68.852,10	68.852,10
C5		Ristrutturazione immobile da adibire a centro socio - Assistenziale. Op. completam.	11.147,90	11.080,99
C5	P.F2.09.01	Potenziamento centro inserimento sociale. Con DD 1281 del 18/07/2017 sono stati accorpati gli interventi P.F2.05.01 e P.F2.09.02	80.000,00	80.018,52
			20.000,00	
			10.000,00	
C5	P.F2.09.02	Potenziamento Centro socio assistenziale. Con DD 1281 del 18/07/2017 è stato eliminato questo intervento	0,00	0,00
		Gestione risorse umane ed attrezzature connesse	75.500,00	75.499,33
	P.F2.10	Gestione risorse umane ed attrezzature connesse	68.392,00	53.764,13
TOTALI FASE I			1.585.300,00	1.453.906,74
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.178.392,00	796.831,78
TOTALI			2.763.692,00	2.250.738,52
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 8: Interventi previsti nel DPC del Comune di Calvello

COMUNE DI CALVELLO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 657/2006 e 902/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 1891 del 10/09/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione area Eredi Andriuzzi	190.000,00	150.171,80
A1	P.01.02	Pubblica Illuminazione centro storico	40.000,00	15.444,00
A1	P.01.03	Arredo urbano Via Roma	50.000,00	15.000,00
A1	P.01.04*	Valorizzazione patrimonio culturale (Progetto Mirabilia)	12.800,00	12.295,00
A1	P.01.06	Miglioramento accessibilità ai rioni Vallone e Castello	60.000,00	41.980,88
A1	P.01.07	Valorizzazione elemento di pregio significativo - Portale in bronzo per la Chiesa Madre	60.000,00	40.763,98
A1	P.01.05	Riqualificazione area monumento ai caduti dei moti 1821-1822.	15.000,00	14.962,54
A1	P.01.10	Completamento toponomastica	17.000,00	0,00
A1	P.03.01a	P.I.C. Facciate e coperture. Attivazione ambito di priorità 1	515.000,00	257.500,00
		Oneri e spese per la gestione dei PIC		
A1	P.04.01	P.I.C. Casa Sicura. Attivazione	63.200,00	18.960,00
A1	P.05.01	P.I.C. Box Interrati. Intervento Via sotto gli Orti.	90.000,00	27.000,00
A1	P.F2.01.11	Riqualificazione urbana del centro storico. Riqualificazione Piazza Garibaldi S. Maria del Plano	110.000,00	90.798,07
A1	P.F2.02.01	Lavori di completamento funzionale del convento S. Maria del Plano e realizzazione museo della ceramica.	290.000,00	390.774,66
			180.000,00	
A2	P.06.01*	Riqualificazione canale S. Lucia	40.000,00	12.000,00
A2	P.06.02*	Valorizzazione Monte Saraceno. Questo intervento è stato spostato al P.F2.06.02	0,00	0,00
A2	P.06.03*	Riqualificazione naturalistica ed ambientale in località Cacciatizze - Autiero.	142.400,00	119.353,56
A2	P.06.06	Ecopunto. Completamento Ecopunto	28.000,00	0,00
A2	P.07.01a	Sistemazione strada Interpodereale Sorbaro Lago Todaro - Potentissima.	130.000,00	39.000,00
A2	P.07.01b	Sistemazione strada interpodereale Paolino - S. Lucia	130.000,00	89.792,98

A2	P.F2.06.02	Valorizzazione Monte Saraceno e riqualificazione e sistemazione del percorso piazzale	50.000,00	86.129,88
			62.600,00	
A2	P.F2.06.04	Completamento Cacciatizze	22.000,00	19.800,00
A2	P.F2.06.05	Completamento Autiero	56.000,00	0,00
C1	P.08.01	Completamento polo sportivo ricreativo (Parco Cittadino) ed impianti sportivi leggeri	337.900,00	277.859,64
C1	P.F2.08.02	Realizzazione parcheggio a servizio del parco attrezzato - Via Moro	40.000,00	0,00
C1	P.F2.08.03	Realizzazione parcheggio a servizio della piscina - Piazza Gramsci	50.000,00	0,00
C5	P.09.01*	Cofinanziamento alloggio anziani	40.000,00	0,00
C5	P.09.02	Centro sociale ed assistenziale. Casa Famiglia.	200.000,00	108.103,47
C5	P.09.03*	Completamento centro socio educativo. Allestimento Ludoteca.	58.800,00	29.173,20
C5	P.09.06	Ippoterapia.	140.200,00	120.669,60
C5	P.F2.09.08	Completamento arredi parco giochi S. Giuseppe	40.000,00	33.984,09
C5	P.F2.09.09	Realizzazione campo ippico	72.500,00	0,00
C5	P.F2.09.10	Completamento ippoterapia	35.000,00	0,00
C5	P.F2.09.11	Arredo Area ludica - Via Aldo Moro	11.713,00	4.524,00
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	72.000,00	50.026,55
	P.F2.10	Risorse Umane ed attrezzature connesse	22.400,00	0,00
TOTALI FASE I			2.432.300,00	1.440.057,20
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.042.213,00	626.010,70
TOTALI COMPLESSIVI			3.474.513,00	2.066.067,90
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 9: Interventi previsti nel DPC del Comune di Castelmezzano

COMUNE DI CASTELMEZZANO				
DPC Fase I finanziato con DD N. 3586 del 21/11/2018			DPC Fase II: è stato appena presentato il DPC Fase I ed è in fase di valutazione	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	150.507,84	
	P.01.01	Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico	255.000,00	
A2	P.01.01	Riqualificazione e riutilizzazione aree urbane e periurbane di accesso al centro storico	148.487,83	
C5	P.03.01	Completamento centro comprensoriale polifunzionale	300.000,00	
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	64.286,58	19.285,97
		Somma impegnata (428/2012)	3.280,76	
TOTALI FASE I			921.563,01	19.285,97
TOTALI COMPLESSIVI			921.563,01	19.285,97
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 10: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Castelsaraceno

COMUNE DI CASTELSARACENO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1468/2006 e 348/2008		D.P.C. Fase II Approvato con DD 1909 del 13/09/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione facciata municipio e arredo urbano.	112.347,96	112.347,96
A1	P.01.01a	Lavori di sistemazione e arredo urbano Via De Gasperi	14.637,30	13.998,74
A1	P.01.02	Riqualificazione ambientale delle Vie V. Emanuele - Ciro Fontana - Solferino e Via Planula	139.756,28	139.756,28
		Riqualificazione ambientale delle Vie V. Emanuele - Ciro Fontana - Solferino e Via Planula. Opere di completamento. L'economia di questo intervento di € 52.263,72 è stata trasferita al P.06.01	0,00	0,00
A1	P.01.03a	Riqualificazione zona Nord-Est Centro Storico: riqualificazione area Rupe". Di questo intervento € 50.000,00 sono stati trasferiti alla P.06.01, € 50.000,00 al P.01.04 ed € 35.000,00 al P.01.05	15.000,00	0,00
A1	P.01.04	Progetto per lo sviluppo di un sistema di ospitalità diffusa. Questo intervento deriva da parte dello P.01.03a	50.000,00	9.150,00
A1	P.01.05	Interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo della Torre Saracena. Questo intervento deriva da parte dello P.01.03a	35.000,00	0,00
A1	P.01.06	Riparazione e ripristino funzionale di Via Planula. Questo intervento deriva da parte dello P.01.03a e dall'economia dello P.01.02	50.000,00 52.263,72	82.482,81
A1	P.02.01	P.I.C. Facciate e delle Coperture.	430.000,00	424.012,42
A1	P.F2.01.03a	Riqualificazione itinerario zona Nord est Centro storico Area Via Ciro Fontana. Questo intervento di € 40.000,00 è stato accorpato al P.F2.05.06 Miglioramento e adeguamento funzionale cimitero	0,00	0,00
A1	P.F2.01.03c	Riqualificazione itinerario zona Nord est Centro storico recupero unità abitative. Questo intervento di € 50.000,00 è stato accorpato al P.F2.05.06 Miglioramento e adeguamento funzionale cimitero	0,00	0,00
A1	P.F2.02.01	PIC. Facciate e delle Coperture. Parte di questo intervento è passato al P.F2.02.01a	70.987,58	70.987,58
A1	P.F2.02.01a	Lavori di riqualificazione ed arredo urbano del centro abitato e dei nuclei rurali Frusci e Miraldo. 1° Lotto. Barriere stradali. Prima l'intervento era PIC facciate e coperture. Poi è stato scisso in due.	290.958,42	288.360,43


A2	P.05.01a	Intervento di protezione paesistica e riqualificazione ambientale del fiume Racanello - Itinerario dei mulini	61.629,00	59.198,27
		Intervento di protezione paesistica e riqualificazione ambientale del fiume Racanello - Itinerario dei mulini. Opere di completamento	15.371,00	0,00
A2	P.05.02a	Intervento di riqualificazione ambientale e valorizzazione dei tratturi Regi	50.000,00	50.000,00
A2	P.05.03	Lavori di sostituzione e sistemazione infissi esterni del centro didattico ambientale Bosco Favino.	30.000,00	30.000,00
A2	P.06.01	Lavori di Manutenzione straordinaria strada Miraldo.	80.000,00	80.000,00
A2	P.06.02	Sistemazione viabilità rurale e/o illuminazione pubblica zone Miraldo, Giordanello, Frusci ed altre	230.774,96	230.774,96
		Sistemazione viabilità rurale e/o illuminazione pubblica zone Miraldo, Giordanello, Frusci ed altre. Opere di completamento	28.466,56	27.382,38
A2	P.06.02a	Lavori completamento sistemazione viabilità rurale Contrada Miraldo	41.540,69	41.540,69
A2	P.F2.05.05	Riqualificazione Ambientale. Lavori di manutenzione straordinaria della Villa comunale sita sul Largo Canal di Flora	60.000,00	60.000,00
A2	P.F2.05.06	Miglioramento e adeguamento funzionale cimitero. Questo intervento nella prima approvazione non c'era. Con variazione della scheda progetto sono stati eliminati gli interventi P.F2.01.03a di € 40.000,00 e P.F2.01.03c di € 50.000,00,	90.000,00	89.196,70
A2	P.F2.06.03	Sistemazione Strade Rurali Miraldo	100.000,00	98.538,50
A2	P.F2.06.04	Sistemazione Strade Rurali S. Lorenzo	40.000,00	40.000,00
A2	P.F2.06.05	Lavori di sistemazione museo della Pastorizia	88.104,84	88.104,84
A2	P.F2.06.05A	Lo sviluppo di Castelsaraceno attraverso la risorsa della montagna. Allestimento ed adeguamento funzionale Museo della Memoria, delle tecniche e dei saperi. Per questo intervento sono state utilizzate le economie dell'int. P.F2.06.05 di € 11.895,16 e un impegno ex novo di € 120.000,00	131.895,16	116.122,54
C1	P.07.01	Sistemazione attrezzature sportive in località Frusci e completamento	133.020,00	133.020,00
C1	P.07.02*		202.430,00	92.974,50
C5	P.08.01	Complesso Sportivo, Socio Assistenziale e di volontariato	417.400,00	
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	93.450,00	93.450,00
	P.F2.10	Risorse Umane ed attrezzature connesse	17.000,00	17.000,00

TOTALI FASE I	2.283.087,47	1.620.089,01
TOTALI FASE II - PREMIALITA'	888.946,00	868.310,59
TOTALI COMPLESSIVI	3.172.033,47	2.488.399,60
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 11: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Cirigliano

COMUNE DI CIRIGLIANO				
DPC Fase I finanziato con DD N. 3610 del 22/11/2018			DPC Fase II: è stato appena presentato il DPC Fase I ed è in fase di valutazione	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e arredo urbano Piazza IV Novembre Corso Umberto 1°	115.000,00	
	P.01.02	Recupero zona antico lavatoio	30.000,00	
	P.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	250.330,59	
A2	P.03.01	Riqualificazione edificio comunale turistico località "Acquafurr"	60.000,00	
	P.04.01	Sistemazione strada località "Tempa di Falco - Salegrino"	130.000,00	
C1	P.05.01	Sistemazione impianti sportivi	100.000,00	
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	51.584,00	15.475,20
TOTALI FASE I			736.914,59	15.475,20
TOTALI COMPLESSIVI			736.914,59	15.475,20
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 12: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Corleto Perticara

COMUNE DI CORLETO PERTICARA				
D.P.C. Fase I Appr. Con DGR 1680/2005, DGR 648/2006 e DGR 903/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 755 del 25/03/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione urbana Rione Costa.	62.782,58	62.782,58
		Riqualificazione urbana Rione Costa. Opere di completamento	17.217,42	17.217,42
A1	P.01.02	Riqualificazione Urbana Vico Plebiscito	40.000,00	40.000,00
A1	P.01.03	Riqualificazione ed Arredo Urbano Centro Storico	275.282,63	275.282,63
A1	P.01.03a	Riqualificazione ed Arredo Urbano Centro Storico. Opere di miglioramento e di completamento.	74.717,37	68.989,18
A1	P.01.04	Riqualificazione urbanistica e arredo urbano Via Ariosto collegamento rione Costa.	74.000,00	74.000,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione centro storico. Via Nazionale, Corso Lacava, Piazza Plebiscito e Piasseggiata sotto gli archi del ponte.	150.000,00	142.389,50
A1	P.F2.02.01	Sistemazione sala polifunzionale Zi Nick	40.000,00	40.000,00
A1	P.03.01*	PIC Facciate e coperture. Attivazione Ambito Pilota	50.000,00	250.000,00
A1	P.03.02	PIC Facciate e coperture. Attivazione Ambito Priorità	200.000,00	
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura	122.000,00	115.600,46
A1	P.F2.04.01	PIC - Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	180.000,00	81.702,45
A1	P.05.01*	PIC Box Interrati. Intervento Via Albini. Nella prima e nella seconda approvazione l'intervento era PIC Box interrati. Intervento Pilota per gli stessi importi. Nella Prima e nella seconda approvazione questo intervento era presente per un totale di € 210.000,00 di cui € 120.000,00 a carico del PO e € 90.000,00 a carico di privati. Nella terza approvazione scompare.	120.000,00	120.000,00
A1	P.F2.08.01	Recupero ex Municipio. Questo intervento è a completamento dei due interventi P. 02.01a di € 220.000,00 totali di cui € 175.000,00 a carico PO e € 45.000,00 comunali e P.02.01b di € 47,260,00 tutti a carico del PO della prima fase. Con DD N. del 13/01/2011 è stata apportata una ulteriore modifica al DPC facendo scomparire gli interventi P.F2.03.01 Sistemazione Piazza Coperta Municipio di € 105.000,00 e P.F2.03.02 Sale Mostra sulla storia Risorgimentale e post unitaria lucana - Intesa Zanardelli di € 300.000,00.	682.260,00	0,00
				52.500,00
				0,00
				0,00
A1	P.F2.08.01a	Lavori sistemazione piazza coperta Municipio	105.000,00	105.000,00

		Sentieristica Ippoturismo e Antichi tratturi.	47.314,52	47.314,52
A2	P.06.01	Sentieristica Ippoturismo e Antichi tratturi. Opere di completamento	17.685,48	17.685,48
A2	P.07.01a*	Sistemazione Area Spunnituro - I Stralcio	100.000,00	99.413,36
A2	P.07.01b	Sistemazione Area Spunnituro. Completamento	296.000,00	296.000,00
		Lavori di Realizzazione Acquedotto Bandiera.		52.452,35
A2	P.07.02	Lavori di Realizzazione Acquedotto Bandiera. Opere di completamento migliorative	67.000,00	14.412,57
A2	P.F2.07.01	Sistemazione strada Zaccanella	132.800,00	0,00
A2	P.F2.07.02	Sistemazione acquedotto rurale "Montagna Rasa" e "Saulo Montagna"	33.851,36	33.851,36
		Sistemazione acquedotto rurale "Montagna Rasa" e "Saulo Montagna". Opere di completamento	16.148,64	16.030,65
A2	P.F2.07.03	Messa in sicurezza viabilità rurale	50.000,00	50.000,00
	P.08.01	Palestra Polivalente	66.817,23	66.817,23
C1	P.08.01a	Palestra Polivalente. Opere di completamento	7.359,41	0,00
C1	P.08.03	Sistemazione Campo di Tiro a volo	64.000,00	63.290,92
C5	P.09.01	Completamento Casa per Anziani	530.000,00	530.000,00
C1	P.F2.09.01	Polo sportivo ricreativo. Questo intervento è di completamento con il P.08.02 Polo ricreativo Gersa della I Fase e scompare la quota pubblica di € 77.486,50.	250.000,00	299.997,03
			50.000,00	
C1	P.F2.09.02	Lavori di completamento del campo di calcio comunale. Impianto di illuminazione	100.506,68	100.506,68
C1	P.F2.09.02a	Lavori di completamento del campo di calcio comunale. Impianto di illuminazione. Opere di completamento	29.493,32	21.772,17
	P.F2.10	Lavori di sistemazione edificio Ludoteca. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.09.03 - Ludoteca della Fase I. L'importo precedente è stato decurtato della quota Comunale di € 6.400,00	70.000,00	83.055,02
C5			24.000,00	
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	161.360,00	126.487,41
	P.F2.11	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	65.014,00	34.479,49
TOTALI FASE I			2.393.536,64	2.337.746,11
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.979.074,00	1.061.284,35

TOTALI COMPLESSIVI	4.372.610,64	3.399.030,46
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 13: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Gallicchio

COMUNE DI GALLICCHIO				
D.P.C. Fase I Appr. Con DGR 272/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1441 del 18/06/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
C1	P.01.01	Completamento area impianti sportivi. Campo da bocce e da tennis.	71.400,43	71.400,43
C1	P.01.02*	Ammodernamento e completamento dell'impianto campo sportivo.	79.667,56	79.509,02
C1	P.01.03	Recupero edificio torre dell'orologio comunale adibito a palestra e scuola media inferiore. È stata variata la scheda progetto e a questo intervento è stato accorpato il P.F2.04.01 della Fase II Recupero edificio torre dell'orologio - Palestra per € 71.671,00, per un totale di € 183.018,61	183.018,61	182.668,50
C1	P.F2.04.01	Recupero Torre dell'orologio. III Lotto. Palestra. Questo intervento è stato spostato alla Fase I al P.01.03 per € 71.671,00	0,00	0,00
A2	P.02.01*	Acquedotto Rurale Cervone - Santa Lucia.	124.300,00	103.220,28
		Acquedotto Rurale Cervone - Santa Lucia. Opere di completamento		21.079,72
A2	P.02.02	Acquedotto Santa Lucia Il Stralcio - destra Aliano	116.000,00	100.881,39
A2	P.02.07	Interventi di elettrificazione Contrade rurali Santa Lucia e c/da Piagge	5.200,00	5.199,49
A2	P.02.08	Lavori di realizzazione tronchi di acquedotto rurale in Contrada Buscalupo. Questo intervento prima non c'era. È stato attivato con l'economia dell'intervento P.02.02	15.118,61	15.118,61
A2	P.02.11	Intesa tra i comuni. Rete dei paesaggi	10.000,00	1.375,00
A1	P.F2.01.01	Riquilificazione ed arredo urbano Piazza Papa Giovanni XIII	449.960,00	448.539,50
A1	P.F2.02.01	Riquilificazione funzionale area Piazza Papa Giovanni XXIII)	50.040,00	50.040,00
A1	P.F2.03.01	Completamento Piazza Papa Giovanni. Con DD N. 1349 del 24/11/2015 è stato rimodulato il DPC F1 e F2. Sono stati eliminati il P.04.01 Recupero Borgo Antico - comparto 2 di € 65.100,50 e P.F2.03.01 - Recupero e riquilificazione Antico Abitato - comparto 2/3 di € 148.000,00. L'importo complessivo di € 213.100,50 viene ridistribuito su altri 4 nuovi interventi: P.F2.03.01, P.F2.03.01a, P.F2.03.01b, P.F2.03.01c.	41.000,00	40.901,07
A1	P.F2.03.01a	Potenziamento PIC Facciate e Coperture. Con DD N. 1349 del 24/11/2015 è stato rimodulato il DPC F1 e F2. Sono stati eliminati il P.04.01 Recupero Borgo Antico - comparto 2 di € 65.100,50 e P.F2.03.01 - Recupero e riquilificazione Antico Abitato - comparto 2/3 di € 148.000,00. L'importo complessivo	24.100,50	0,00

		di € 213.100,50 viene ridistribuito su altri 4 nuovi interventi: P.F2.03.01, P.F2.03.01a, P.F2.03.01b, P.F2.03.01c.		
C5	P.F2.03.01b	Abbattimento barriere Palazzo Baronale. Con DD N. 1349 del 24/11/2015 è stato rimodulato il DPC F1 e F2. Sono stati eliminati il P.04.01 Recupero Borgo Antico - comparto 2 di € 65.100,50 e P.F2.03.01 - Recupero e riqualificazione Antico Abitato - comparto 2/3 di € 148.000,00. L'importo complessivo di € 213.100,50 viene ridistribuito su altri 4 nuovi interventi: P.F2.03.01, P.F2.03.01a, P.F2.03.01b, P.F2.03.01c.	60.000,00	0,00
C5	P.F2.03.01c	Riqualificazione Piazzetta Paolo VI e Largo Colombo. Con DD n. 302 del 29/03/2018 è stata variata la scheda progetto. Prima l'intervento era completamento tettoia comunale. Con DD N. 1349 del 24/11/2015 è stato rimodulato il DPC F1 e F2. Sono stati eliminati il P.04.01 Recupero Borgo Antico - comparto 2 di € 65.100,50 e P.F2.03.01 - Recupero e riqualificazione Antico Abitato - comparto 2/3 di € 148.000,00. L'importo complessivo di € 213.100,50 viene ridistribuito su altri 4 nuovi interventi: P.F2.03.01, P.F2.03.01a, P.F2.03.01b, P.F2.03.01c.	88.000,00	0,00
A1	P.F2.03.01	Recupero e riqualificazione Antico Abitato. Con DD N. 1349 del 24/11/2015 è stato rimodulato il DPC F1 e F2. Questo intervento di € 148.000,00, con l'intervento P.04.01 di € 65.100,50 scompaiono e l'importo complessivo di € 213.100,50 viene ridistribuito su altri 4 nuovi interventi: P.F2.03.01, P.F2.03.01a, P.F2.03.01b, P.F2.03.01c.	0,00	0,00
A1	P.04.01	Recupero borgo antico. Comparto 2. Con DD N. 1349 del 24/11/2015 è stato rimodulato il DPC F1 e F2. Questo intervento di € 65.100,50, con l'intervento P.F2.03.01 di € 148.000,00 scompaiono e l'importo complessivo di € 213.100,50 viene ridistribuito su altri 4 nuovi interventi: P.F2.03.01, P.F2.03.01a, P.F2.03.01b, P.F2.03.01c.	0,00	0,00
A1	P.04.03	Recupero borgo antico. Comparto 17	206.346,31	306.346,31
A1			100.000,00	
A1	P.04.04	Recupero borgo antico. Comparto 18	281.386,18	380.759,44
A1			100.000,00	
A1	P.05.01	PIC Casa Sicura	19.057,05	5.717,12
A1	P.05.02	PIC Facciate e coperture	139.041,26	103.613,32
A1	P.03.01*	Recupero palazzo baronale (ludoteca e centro diurno giovanile)	65.500,00	81.100,00
C5			15.600,00	
C5	P.03.02	Acquisto e recupero palazzo Mazziotta (centro diurno anziani)	170.000,00	169.923,37
		Risorse umane ed attrezzature connesse	34.068,68	32.068,68

	Risorse umane ed attrezzature connesse	8.000,00	0,00
TOTALI FASE I		1.735.704,69	1.659.980,68
TOTALI FASE II - PREMIALITA'		721.100,50	539.480,57
TOTALI COMPLESSIVI		2.456.805,19	2.199.461,25
Importi espressi in euro			



Scheda programmatica 14: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Gorgoglione

COMUNE DI GORGOGLIONE				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1931/2005, DGR 350/2006, DGR 963/2006, DGR 1776/2007 e DGR 1061/2008			D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 973 del 14/04/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione urbana Piazza Castello	110.000,00	110.000,00
		Riqualificazione urbana Piazza Castello. Opere di completamento.		
A1	P.01.02*	Riqualificazione urbana Via Mergoli	140.000,00	140.000,00
		Riqualificazione urbana Via Mergoli. Opere di completamento.		
A1	P.01.03	Riqualificazione urbana Centro Storico. € 15.277,41 l'economia di questo intervento che era di complessivi € 104.600,00 è stata accorpata al P.F2.01.01. € 15.277,41 di questo intervento sono stati spostati al P.F2.01.01	89.322,59	89.322,59
A1	P.06.02	Completamento strada rurale Gorgoglione - Cirigliano. Questo intervento deriva da P.01.04 Riqualificazione Via Fontana di complessivi € 120.000,00	80.000,00	59.995,18
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione e arredo zona Via Roma e Via Fontana	197.514,88	197.514,88
		Riqualificazione e arredo zona Via Roma e Via Fontana. Opere di completamento. Questo intervento viene fuori dall'economia dell'intervento precedente di € 12.485,12 e quella del P.01.03 di € 15.277,41	27.762,53	27.748,63
A1	P.F2.01.02	Piano Ringhiere. A questo intervento è stata accorpata l'economia dell'int. P.08.02 della Fase I di € 16.753,76	50.000,00 16.753,76	66.753,76
A1	P.F2.01.03	Sistemazione area Scuola Materna	52.500,00	51.959,84
A1	P.F2.02.01	PIC - Casa Sicura.	150.000,00	135.000,00
A1	P.F2.03.01	PIC - Riqualificazione Formale delle facciate e delle coperture.	70.000,00	35.000,00
A1	P.03.01*	PIC Facciate e coperture. Ambito pilota.	153.400,00	248.400,00
A1	P.03.02	PIC Facciate e Coperture. Ambito di priorità.	122.600,00	
A1	P.04.01	PIC Casa sicura. Attivazione.	50.000,00	147.000,00
			97.000,00	

A2	P.F2.04.01	Completamento sistemazione Madonna del Pergamo. A questo intervento di € 50.000,00 è stata accorpata l'economia dell'int. P.05.01 di € 18.032,25	68.032,25	61.099,02
A2	P.F2.04.02	Miglioramento e fruizione aree forestali	7.062,19	11.330,72
			5.207,78	
A2	P.05.01	Risanamento ambientale accessibilità e sentieristica per la fruibilità della Madonna del Pergamo.	101.967,75	101.967,75
A2	P.F2.05.01	Sistemazione strada Sant'Angelo	60.000,00	57.302,87
A2	P.F2.05.02	Sistemazione strade Cugno Teodoro e SC per Guardia Perticara	54.937,81	54.937,81
A2	P.F2.05.02 a	Sistemazione strade Cugno Teodoro e SC per Guardia Perticara. Opere di completamento	7.062,19	0,00
A2	P.06.01	Elettificazione Contrada Monte.	52.000,00	52.000,00
C1	P.F2.06.01	Sistemazione e potenziamento impianti sportivi Fosso Vallone e Pergamo. In questo intervento è stato incluso quello P.07.01 pari a € 50.000,00 più una economia fase I PO di € 3.852,28 ed € 6.688,35 di risorse comunali	64.644,22	64.644,22
C1	P.F2.06.01a	Sistemazione e potenziamento impianti sportivi Fosso Vallone e Pergamo. Opere di completamento	5.208,06	0,00
C1	P.07.02	Sistemazione Palestra Comunale.	139.037,58	139.037,58
			31.462,44	31.355,44
C1	P.07.03	Ristrutturazione, completamento ed abbattimento barriere architettoniche dell'impianto sportivo polivalente "Madonna del Pergamo".	24.500,00	20.647,72
C5	P.08.01	Sistemazione e riqualificazione vecchio cimitero. Le economie di € 15.102,56 sono state spostate alla P.F2.07.01a	174.897,44	174.897,44
C5	P.08.02	Sistemazione strutture ambulatoriali. La somma programmata in più di € 2.500,00 è stata reinvestita nelle risorse umane	82.746,24	82.746,24
C5	P.F2.07.01	Completamento Sistemazione e riqualificazione vecchio cimitero. A Questo intervento di € 72.000,00 sono stati aggiunti € 40.000,00 derivanti dal P.01.04 Riqualificazione Via Fontana di complessivi € 120.000,00	105.802,99	105.802,99
C5	P.F2.07.01a	Lavori di sistemazione e riqualificazione vecchio cimitero. Lavori di somma urgenza. Opere di completamento (somma economie P.08.01 ed economie P.F2.07.01	21.299,57	20.685,50

		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse. Sono state reinvestite in questo intervento € 2.500,00 del P.08.02	116.930,00	86.466,53
	P.F2.08	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse.	56.266,00	33.237,96
TOTALI FASE I			1.565.864,04	1.483.836,47
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.020.054,23	923.018,20
TOTALI			2.585.918,27	2.406.854,67
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 15: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Grumento Nova

COMUNE DI GRUMENTO NOVA				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 646/2006, DGR 282/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD n. 1018 del 15/04/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	PIC Facciate e coperture. Opere di adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e delle coperture.	287.464,00	147.989,06
A1	P.02.01	PIC Casa Sicura.	142.500,00	44.788,50
A1	P.F2.04.06	Completamento intervento sistemazione piazza Aurora Sanseverino	260.000,00	219.543,10
A1	P.F2.07.01	Progetto di area vasta. Interventi di ricucitura funzionale Scavi di Grumentum - Lago del Pertusillo - Aree di particolare valenza paesistica ed ambientale. Il Lotto.	172.030,00	0,00
C1			330.000,00	
A1	P.03.01	Opere di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del Palazzo Giliberti di proprietà comunale.	226.000,00	368.009,80
C5		Lavori di consolidamento e ripristino dell'area destinata ad attività Socio Assistenziali di Palazzo Giliberti.	150.000,00	
A1	P.04.01	Interventi di sistemazione della Piazza Aurorra Sanseverino	200.000,00	200.000,00
A1	P.04.02	Intervento di infrastrutturazione di Via Garibaldi - Via C. Danio - Via Toscano	150.000,00	142.540,96
A1	P.04.03	Intervento di infrastrutturazione del tratto Piazza Umberto I - Piazza Arciprete Caputi.	175.000,00	164.040,63
C5	P.05.01	Adeguamento edilizio e tecnologico ludoteca (ex mattatoio)	139.608,43	125.647,59
		Economie da ribasso d'Asta	21.193,57	0,00
C1	P.06.02	Adeguamento funzionale Palestre comunali	90.000,00	77.189,30
C1	P.F2.06.01	Adeguamento funzionale della piscina comunale, del campo sportivo (impianto adduzione idrica) e degli impianti del campo polivalente.	185.000,00	262.237,93
			98.034,00	
A2	P.08.01	Completamento pubblica illuminazione rurale.	90.000,00	66.138,67
A2	P.09.01	Lavori di completamento delle strutture turistiche alla località Bosco Maglie	30.000,00	0,00
A2	P.F2.08.02	Completamento pubblica illuminazione aree rurali	42.897,00	42.897,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	92.000,00	90.454,27
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	15.000,00	0,00

TOTALI FASE I	1.793.766,00	1.426.798,78
TOTALI FASE II - PREMIALITA'	1.102.961,00	524.678,03
TOTALI	2.896.727,00	1.951.476,81
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 16: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Guardia Perticara

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1930/2005 e DGR 1154/2009		D.P.C. Fase II - Approvato con DD n. 1894 del 06/09/2011		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualficazione e arredo urbano. Interventi nel centro storico.	80.000,00	0,00
A1	P.F2.01.01	Completamento Palazzo Montano. A questo intervento sono stati incorporati e rimodulati n. 5 interventi della fase I per complessivi € 470.000,00: una quota della prima fase pari a € 530.000,00 riferita all'int. P.05.01 Attivazione Box Interrati per € 220.000,00 ed € 250.000,00 riferiti agli interventi P.09.01 Polo della solidarietà di € 235.000,00, P.09.02 Sistemazione ambulatorio per € 15.000,00	530.000,00 470.000,00	670.078,00
A1	P.03.01a	PIC Facciate e coperture Centro Storico.	50.000,00	0,00
A1	P.04.01	PIC Casa Sicura. Attivazione.	50.000,00	0,00
A1	P.01.01b*	Realizzazione della cartografia numerica.	40.000,00	40.000,00
A1	P.02.01	Recupero e riutilizzo del Palazzo Montano.	274.899,26	274.899,26
		Recupero e riutilizzo del Palazzo Montano. Opere di completamento	25.100,74	0,00
A2	P.07.01*	Adeguamento acquedotto rurale S. Lucia	53.420,00	48.328,18
A2	P.07.02*	Sistemazione strade Fosso Papone e S. Lucia Lupara	100.000,00	74.039,08
A2	P.07.03	Sistemazione viabilità rurale	143.680,00	143.653,22
C1	P.F2.02.01	Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero. A questo intervento è stato accorpato l'int. P.08.02 della Fase I.	30.000,00 70.000,00	29.951,90 70.000,00
		Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero. Opere di completamento	16.508,00	0,00
C1	P.08.01	Sistemazione campo sportivo	104.000,00	73.880,00
C5	P.09.01	Polo della solidarietà. Questo intervento è stato accorpato nella Fase II all'int. P.F2.01.01 per € 235.000,00	0,00	0,00
C5	P.09.02	Sistemazione ambulatorio. Questo intervento è stato accorpato nella Fase II all'int. P.F2.01.01 per € 15.000,00	0,00	0,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	96.000,00	96.000,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	16.748,18	0,00

TOTALI FASE I	1.017.100,00	750.799,74
TOTALI FASE II - PREMIALITA'	1.133.256,18	770.029,90
TOTALI COMPLESSIVI	2.150.356,18	1.520.829,64
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 17: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Laurenzana

COMUNE DI LAURENZANA				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1300/2006, DGR 1928/2006 e DGR 349/2008			D.P.C. Fase II Approvato con DD 760 del 25/03/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione urbanistica Piazza S. Silvestro	158.403,10	158.403,10
A1	P.01.01a*	Riqualificazione urbanistica Piazza S. Silvestro. Opere di completamento	44.596,90	44.596,90
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione Piazza Dante Alighieri. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.01.02 - Riqualificazione Piazza Dante Alighieri della Fase I di € 47.000,00	153.000,00 47.000,00	200.000,00
A1	P.F2.01.02	Piano sistemazione marciapiedi	72.000,00	36.308,86
A1	P.02.01*	Completamento polifunzionale	120.000,00	120.000,00
A1	P.02.02	Recupero Palazzo Graziadei	320.000,00	318.886,07
A1	P.F2.02.01	Rifunzionalizzazione Zone Castello. A questo intervento è stato incorporato l'Int. P.08.02 - Pista di Karting attrezzata della Fase I di € 280.000,00	70.000,00 280.000,00	303.245,58
A1	P.F2.02.02	Recupero Palazzo Montagnoli	142.715,79	0,00
A1	P.F2.02.03	Riqualificazione energetica e recupero dell'istituto comprensivo V. Alfieri. Con D.D. N. 1644 del 10/08/2012 è stata Variata la scheda progetto prendendo parte dell'intervento P.F2.02.01 - Rifunzionalizzazione zona Castello e cioè € 50.000,00 e sono stati impegnati altri € 250.000,00	300.000,00	297.276,08
A1	P.02.03	Rifunzionalizzazione zona Castello. Prima l'intervento era: Pic facciate e coperture per € 100.000,00; PIC Casa Sciura per € 52.000,00, PIC Box interrati per € 190.000,00	342.000,00	214.528,34
A1	P.F2.03.01	PIC Box Interrati	95.000,00	0,00
A2	P.06.02	Riqualificazione area periferica zona S. Filomena	90.000,00	80.930,30
A2	P.06.03	Riqualificazione fruibilità zona Castello e Chiesa madre	135.000,00	83.734,89
A2	P.07.01	Sistemazione strada Santi Quaranta - Castelbello	170.000,00	51.000,00
A2	P.F2.04.01	Valorizzazione e fruibilità zona Abetina. A questo intervento è	180.000,00	198.405,66

		stato incorporato l'Int. P.06.01 - Valorizzazione e fruibilità zona Abetina della Fase I DI € 75.000,00	75.000,00	
A2	P.F2.04.02	Riqualificazione e fruibilità zona Largo Fiera	30.000,00	28.946,82
C1	P.08.01*	Illuminazione campo di calcio	50.437,00	50.437,00
		Illuminazione campo di calcio. Opere di completamento migliorative		
C1	P.F2.05.01	Potenziamento piscina comunale. A questo intervento è stato incorporato l'int. P.08.03 - Potenziamento piscina comunale della I Fase di € 54.363,00	101.637,00	156.000,00
			54.363,00	
C5	P.09.01*	Realizzazione Eliporto		0,00
C5	P.09.02	Casa Ospitalità per anziani. Recupero ex casa mandamentale	482.500,00	482.500,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	84.000,00	71.063,00
	P.F2.06	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	75.805,00	22.240,00
TOTALI FASE I			1.996.937,00	1.676.079,60
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.676.520,79	1.242.423,00
TOTALI COMPLESSIVI			3.673.457,79	2.918.502,60
Questo importo è stato detratto dal totale complessivo in quanto l'intervento P.F2.02.03 è stato originariamente portato in DPC con un finanziamento di soli € 50.000,00. Successivamente con variazione della Scheda Progetto, lo stesso intervento è stato incrementato con € 250.000,00 finanziati extra DPC. Di conseguenza pur facendo parte integrante dello stesso intervento non concorrono alla dotazione finanziaria complessiva assegnata per i DPC			250.000,00	195.485,13
TOTALI COMPLESSIVI			3.423.457,79	2.723.017,47
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 18: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Marsiconuovo

COMUNE DI MARSICONUOVO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1551/2006, 1774/2007 e 469/2009		D.P.C. Fase II Approvato con DD 253 del 10/02/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Completamento intervento funzionale area S. Donato	70.000,00	69.596,73
A1	P.01.02	Riqualficazione percorsi prioritari centro storico	230.000,00	230.000,00
A1	P.02.02	Collegamento verticale Viale Regina Margherita - Rione Civita. Questo intervento prima non c'era. È stata rimodulata la S.P.	610.000,00	269.762,37
A1	P.03.01	Completamento salone S. Francesco	40.000,00	39.880,89
A1	P.02.02	Adeguamento Chiesa S. Michele per Museo	30.000,00	27.000,00
A1	P.02.04	Completamento ex Seminario e Palazzo Vescovile per casa anziani. Questo intervento per € 175.000,00 in A1 ed € 163.305,00 in C5 è stato trasferito alla P.F2.02.04		
C5				
A1	P.03.	Ristrutturazione e riqualficazione fabbricato ex liceo Scientifico	35.000,00	35.000,00
A1	P.03.05	Adeguamento riqualficazione barriere architettoniche Casa Palazzo Pignatelli	164.554,00	164.079,19
A1	P.F2.01.04	Sistemazione delle strade San Nicola, Via Capano, Salita Tocco e aree limitrofe	140.310,00	140.133,98
A1	P.F2.01.06	Sistemazione largo San Gianuario e Via Sant'Angelo	120.000,00	120.000,00
A1	P.F2.02.03	Lavori di riqualficazione urbana dell'area della villa comunale con l'utilizzo di parcheggi esistenti a valle mediante un sistema di ascensori e recupero funzionale dello spazio sottostante l'area gioco per la realizzazione di un auditorium e l'ampliamento e adeguamento parco giochi.	1.500.000,00	1.500.000,00
A1	P.F2.02.04	Lavori di completamento fabbricato ex seminario e palazzo vescovile per realizzazione casa di riposo per anziani. Prima questo intervento non c'era. Con la rimodulazione del DPC è stato inserito prendendo risorse della fase I e della Fase II	916.502,00	822.433,81

A2	P.05.01	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e riqualificazione ambientale dell'area Fontanelle-San Donato.	125.000,00	106.687,66
A2	P.06.01*	Interventi di riqualificazione dei centri rurali	70.000,00	69.942,69
A2	P.06.02	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Tempa ecc. + Opere di completamento	250.000,00	249.661,33
A2	P.06.03	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Pergola, San Vito, Ginestole. + Opere di completamento	200.000,00	199.632,46
A2	P.06.05	Sist. strade illuminaz. pubblica centri rurali Cappuccini, San Giovanni,Agri	80.000,00	86.325,16
A2	P.06.04	Sist. strade illuminaz. pubblica centri rurali Campitelli, Calabritto,Campo di lupo etc	80.000,00	65.208,85
A2	P.06.06*	Riqualificazione centro di Pergola	70.000,00	69.339,05
A2	P.06.07*	Riqualificazione centro di Galaino	70.000,00	70.000,00
A2	P.F2.06.09	Valorizzazione dei borghi rurali	183.999,12	183.999,12
		Valorizzazione dei borghi rurali. Opere di completamento	16.000,88	16.000,88
C1	P.07.01	Sistemazione impianti sportivi centro abitato	31.941,00	9.582,90
C1	P.07.02	Completamento impianti sportivi Pergola . Realizzazione palestra	100.000,00	89.827,13
C1	P.07.04	Completamento impianti sportivi Galaino	100.000,00	100.000,00
C5	P.08.01	Adeguamento Casa di Riposo in Via Campitelli	30.000,00	29.691,42
C5	P.08.02	Adeguamento centro servizi socio - assistenziali ex scuola Elementare	31.900,00	31.900,00
C5	P.08.03	Adeguamento Centro Servizi Galaino	35.000,00	34.668,36
C5	P.08.04*	Realizzazione piscina Comunale con vasche riabilitative	470.000,00	469.619,52
C5	P.08.05	Piscina Comunale - Completamento I° Lotto	330.000,00	330.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	113.000,00	113.000,00

	Risorse umane ed attrezzature connesse	25.622,00	10.955,92
TOTALI FASE I		3.366.395,00	2.960.405,71
TOTALI FASE II - PREMIALITA'		2.902.434,00	2.793.523,71
TOTALI COMPLESSIVI		6.268.829,00	5.753.929,42
Importi espressi in euro			



Scheda programmatica 19: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Marsicovetere

COMUNE DI MARSICOVETERE				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1469/2006			D.P.C. Fase II Approvato con DD 137 del 26/01/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.02.01	Sistemazione Piazza Morlino e Zecchettin	835.525,74	698.255,77
		Sistemazione Piazza Morlino e Zecchettin. Opere di completamento. Le economie di € 51.744,23 di questo intervento più € 12.730,03, le economie delle opere di completamento, sono state cedute al P.02.05		137.269,97
A1	P.02.02	Restauro Portici	83.172,16	83.172,16
		Restauro Portici. Opere di completamento	16.827,84	6.827,84
A1	P.02.03	Realizzazione Fontana Monumentale	75.000,00	75.000,00
A1	P.02.04a	Rimodellamento Via Roma e arredo urbano. Le economie di € 10.587,83 di questo intervento sono state cedute al P.02.05	159.412,17	159.412,17
A1	P.02.04b	Completamento lavori di rimodellamento Via Roma - Villa d'Agri. Le economie di € 12.240,76 di questo intervento sono state cedute al P.02.05	42.759,23	42.759,23
A1	P.02.05	Lavori di pavimentazione stradale, segnaletica ed arredo urbano di via Roma e viabilità urbana di Piazza Zecchettin. Questo intervento è stato inserito recuperando le economie dei seguenti lavori: P.02.01 Riqualificazione e arredo urbano Piazza Zecchettin (€ 51.744,23) e opere di completamento (€ 12.730,03), P.02.04 Rimodellamento Via Roma (€ 10.587,83) e opere di completamento (€ 12.240,76).	71.215,94	71.215,94
A1	P.02.05a	Lavori di pavimentazione stradale, segnaletica ed arredo urbano Via Roma e viabilità urbana Piazza Zecchettin. Opere di completamento	16.086,21	0,00
A1	P.F2.02.08	Manutenzione edificio delegazione comunale	240.000,00	194.314,25
A1	P.F2.02.11	Manutenzione ex scuola elementare Piazza Zecchettin	170.000,00	170.000,00
A1	P.F2.03.03	Riqualificazione strade centro storico Borgo Castello ed area circostante ex convento S. Maria di Costantinopoli	314.851,10	314.851,10
A1	P.F2.03.03	Riqualificazione strade centro storico Borgo Castello ed area circostante ex convento S. Maria di Costantinopoli. Opere di completamento	145.148,90	109.852,87
A2	P.03.01	Riqualificazione Borgo Castello	395.978,76	346.367,25
A2	P.03.01a	Riqualificazione Borgo Castello. Opere di completamento	117.021,24	93.677,53
A2	P.05.01	Riqualificazione ex convento Santa Maria di Costantinopoli	80.000,00	50.867,06

A2	P.05.02	Lavori di completamento dell'aula liturgica della cappella feriale e della sagrestia del complesso S. Francesco d'Assisi Villa d'Agri. Prima l'intervento era Ripristino e restauro convento.	222.601,40	0,00
A2	P.05.02a	Riqualificazione urbana area esterna nuovo centro parrocchiale Villa d'Agri. è stata variata la scheda progetto P.05 dall'intervento Riqualificazione dell'Area dell'ex Convento di S. Maria di Loreto in località S. Maria dell'Aspro sono stati creati due nuovi progetti	458,47	100.277,09
			99.858,62	
A2	P.04.01	Opere di civiltà nelle campagne	82.577,16	55.357,37
A2	P.04.01b	Opere di civiltà nelle campagne – Opere di completamento		0,00
A2	P.04.02*	Sistemazione sponda destra del torrente Molinara	25.882,84	25.882,84
A2	P.06.01	Lavori di ripristino strutturale e restauro conservativo ex convento Santa Maria di Loreto.	38.222,91	250.059,99
			35.000,00	
			176.776,09	
A2	P.F2.04.03	Riqualificazione piazzetta lato Barricelle	160.902,74	160.902,74
		Riqualificazione piazzetta lato Barricelle. Opere di completamento	39.097,26	31.755,98
C1	P.07.01	Completamento palazzetto dello sport	119.040,38	103.572,64
C1	P.07.01b	Completamento Palazzetto dello sport –Opere di completamento	4.138,32	0,00
C1	P.07.02	Manutenzione Campo sportivo Villa d'Agri	55.000,00	43.930,97
C1	P.08.01	Sistemazione area sportiva Barricelle	178.294,76	178.294,76
		Sistemazione area sportiva Barricelle. Opere di completamento	53.485,24	32.334,23
C1	P.09.01	Ampliamento area di tiro a volo.	23.941,30	23.679,54
C1	P.F2.06.05	Interventi integrativi Campo sportivo	25.521,34	0,00
C1	P.F2.06.06	Interventi integrativi Palazzetto dello Sport	99.807,24	99.807,24
		Interventi integrativi Palazzetto dello Sport. Opere di completamento	40.192,76	33.147,05
C5	P.02.05	Ampliamento cimitero comunale (ex Punto ludico Op. P.02.05)	466.500,00	69.975,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	25.622,00	10.955,92
		Risorse umane ed attrezzature connesse	80.000,00	53.657,46
TOTALI FASE I			3.554.776,78	2.701.846,81

TOTALI FASE II - PREMIALITA'	1.261.143,34	1.125.587,15
TOTALI COMPLESSIVI	4.815.920,12	3.827.433,96
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 20: Interventi inseriti nei DPC del Comuni di Missanello

COMUNE DI MISSANELLO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1470/2006 e 284/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 62 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione Via Roma, Vico I ^a Roma e Vico II ^a Roma	107.500,00	107.500,00
A1	P.01.02	Riqualificazione Via Procida, Via Veglia, Piazzetta Persecuzione.	107.500,00	96.750,00
A1	P.03.01	PIC Facciate e coperture - Attivazione ambito pilota 1.	256.000,00	221.800,00
A1	P.03.02	PIC Facciate e coperture - OO.PP. Edificio Scolastico	34.000,00	0,00
A1	P.04.01.a	Risparmio energetico Casa Comunale	36.631,67	0,00
		Risparmio energetico Edificio Scolastico.	22.740,35	0,00
		Risparmio energetico Ex Scuola Materna	627,98	0,00
A1	P.F2.01.01	Riqualificazione ed arredo urbano	40.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	Recupero contenitori - Acquisizioni Centro Storico. E' stata variata la scheda progetto e di questo € 50.000,00 sono passati al P.F2.03.01	10.000,00	10.000,00
A1	P.F2.03.01	Decoro e accessibilità Municipio	140.000,00	40.705,70
A1	P.F2.03.02	Decoro e fruibilità Edificio Scolastico	33.333,33	33.333,33
A1	P.F2.04.01	PIC - Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	90.000,00	0,00
A2	P.06.01	Acquedotto piano Argenzio	75.000,00	74.336,17
A2	P.06.02	Lavori di ripristino e sistemazione strada interpoderale Fontana Isca - Fondo Valle dell'Agri	30.000,00	30.000,00
A2	P.05.01	"Sulle tracce di Levi pittore e scrittore" - sistemazione località foresta	136.000,00	122.400,00
A2	P.05.02	"Fra calanchi ed ulivi"	45.000,00	0,00
A2	P.F2.05.01	Sistemazione strada Aia del Cupolo. È variata la Scheda Progetto e l'intervento è stato portato da € 120.000,00 a € 20.000,00	120.000,00	20.000,00
A2	P.F2.05.01b	È variata la Scheda Progetto che prima era di € 120.000,00 ora restano 100.000,00 cedendo all'int. P.F2.05.01 € 20.000,00		56.578,00
A2	P.F2.05.02	Sistemazione strada Caselle	80.000,00	61.618,32

A2	P.F2.05.03	Sistemazione strada rurale Tonsante e Acquedotto Paschiere. È variata la scheda progetto e questo intervento da € 50.000,00 è passato ad € 100.000,00	100.000,00	100.000,00
C1	P.07.01	Lavori di sistemazione delle zone di gioco degli impianti sportivi in località Paschiere	89.189,51	89.189,51
		Lavori di sistemazione delle zone di gioco degli impianti sportivi in località Paschiere. Opere di completamento	25.710,49	7.713,15
C1	P.07.02	Lavori di sistemazione delle zone di gioco degli impianti sportivi in località Paschiere	80.000,00	69.337,46
C1	P.F2.06.01	Rifacimento impianto di pubblica illuminazione con nuova tecnologia a LED. Prima era: Potenziamento Polo sportivo e ricreativo in località Paschiere	50.000,00	38.562,14
C5	P.08.01	Polo della solidarietà	206.317,66	206.317,66
	P.08.01a	Polo della solidarietà. Opere di completamento	18.682,34	0,00
C5	P.08.02	Attivazione Ludoteca	23.600,00	0,00
C5	P.F2.07.01	Sistemazione esterna e potenziamento centro sociale ex asilo. Con DD n. 172 del 31/01/2017 questo intervento scompare e passa al P.F2.08.01 Gestione PO risorse umane	0,00	0,00
		Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse	78.000,00	78.000,00
	P.F2.08.01	Gestione del P.O. Risorse umane ed attrezzature connesse. Con DD n. 172 del 31/01/2017 a questo intervento viene accorpato il P.F2.07,01 di € 50.000,00 Sistemazione e potenziamento centro sociale ex asilo che di fatto scompare	102.192,00	35.690,14
TOTALI FASE I			1.372.500,00	1.103.343,95
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			765.525,33	396.487,63
TOTALI COMPLESSIVI			2.138.025,33	1.499.831,58
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 21: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Moliterno

COMUNE DI MOLITERNO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1382/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1895 del 10/09/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.02.01	Biblioteca comunale G. Racioppi e mediateca comprensoriale. Opere complementari ed accessorie Palazzo Valinoti.	40.000,00	36.000,00
A1	P.02.01a	Biblioteca comunale G. Racioppi e mediateca comprensoriale. Opere complementari ed accessorie Palazzo Valinoti. Sistemazione infissi	10.000,00	9.999,50
A1	P.02.02*	Recupero architettonico e funzionale Fondaci	40.000,00	28.113,20
A1	P.02.03	Opere complementari ed accessorie teatro comunale	40.000,00	35.801,17
A1	P.02.04a	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. I Tratto	699.174,07	598.905,88
	P.02.04aa	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. I Tratto. Opere supplementari e di completamento	278.600,93	99.246,55
	P.02.04b	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. II Tratto	75.000,00	74.795,33
	P.02.04c	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma. III Tratto	60.000,00	60.000,00
A1	P.03.01	Viabilità e accesso al Borgo Medioevale. Salita Chiesa Madre	100.000,00	97.157,83
A1	P.03.02*	Arredo urbano nel centro storico	50.000,00	48.943,50
A1	P.03.03	Riqualificazione paesaggistica in località "Sotto il Castello"	73.907,60	73.907,60
	P.03.03a	Riqualificazione paesaggistica in località "Sotto il Castello". Opere di completamento	26.092,40	0,00
A1	P.04.01*	Arredo urbano nelle zone di completamento	70.000,00	60.826,69
A1	P.04.02*	Manutenzione straordinaria palazzo Giliberti	50.000,00	50.000,00
A1	P.04.02a	Completamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria Palazzo Giliberti.	50.000,00	49.472,17
A1	P.04.03	Miglioria del Patrimonio ed arredo in ambito urbano. Via Rosario - Piazzetta Bianculli, etc.	100.000,00	98.298,08
A1	P.04.04	Completamento del Palazzo Parisi, candidato a sede del Parco Nazionale Val d'Agri	90.000,00	81.000,00
A1	P.04.04b	Completamento del Palazzo Parisi, candidato a sede del Parco Nazionale Val d'Agri ed estendimento e miglioria urbanizzazione in ambito urbano e rurale. Intervento di completamento	10.000,00	9.999,50
A1	P.F2.01.06	Riqualificazione immobile del centro storico - Palazzo DIMARIA	60.000,00	45.528,46

A1	P.F2.04.07	Riqu. funzionale delle strutture e delle aree pubbliche in ambito urbano in Largo Gandhi	40.000,00	35.358,63
A1	P.F2.04.08	Centro raccolta differenziata	16.000,00	16.000,00
A2	P.05.01*	Opere di civiltà nelle campagne. I° Lotto	60.000,00	54.000,00
A2	P.05.02	Opere di civiltà nelle campagne. II° Lotto	39.988,68	39.988,68
		Opere di civiltà nelle campagne. II° Lotto. Opere di completamento	10.011,32	10.007,25
A2	P.05.03	Riqualificazione area Pineta. Camper	29.745,94	29.745,94
	P.05.03a	Riqualificazione area Pineta. Camper. Opere di completamento	10.254,06	0,00
A2	P.05.04c	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale.	66.690,42	66.690,42
	P.05.04d	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale. Economie	23.855,15	23.855,15
A2	P.05.04a	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale. Itinerario ciclabile tra Pineta S. Francesco e Centro Sportivo Comunale. I° Lotto.	41.563,74	41.563,74
	P.05.04aa	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale. Itinerario ciclabile tra Pineta S. Francesco e Centro Sportivo Comunale. I° Lotto. Opere di completamento	11.436,26	9.902,08
A2	P.05.05	Riqualificazione Paesaggistica aree Urbane	190.000,00	186.468,34
A2	P.F2.05.06	Riqualificazione degli spazi compresi tra Piazza Matteotti e Santa Croce	65.000,00	65.000,00
A2	P.F2.05.07	Miglioramento e realizzazione percorsi pedonali Cancellone - S. Cataldo	70.193,29	70.193,29
		Miglioramento e realizzazione percorsi pedonali Cancellone - S. Cataldo. Opere di completamento	29.806,71	8.897,13
A2	P.F2.05.08	Messa in sicurezza strade Comunali	25.000,00	22.055,16
C1	P.06.01*	Copertura campi da tennis comunali	77.468,53	77.468,53
C1	P.06.02*	Fruibilità piscina comunale	26.151,47	16.856,05
C1	P.06.03	Erba sintetica campo polifunzionale	70.000,00	68.243,31
C1	P.06.04b	Interventi prioritari sulla piscina comunale. II Lotto.	81.235,89	52.120,77
	P.06.04c	Rifacimento manto erboso campo di calcio "O. Venezia"	25.000,00	24.900,34
	P.06.04d	Sistemazione campo polivalente, Via della Pineta ed arredi vari	15.000,00	12.636,78
	P.06.04e	intervento di riqualificazione strutture sportive in località Paggerelle	64.010,87	64.010,87

C1	P.06.04a	Interventi prioritari sulla piscina comunale. I Lotto.	144.753,24	117.013,28
		Opere di Miglioramento e recupero degli immobili e delle aree attrezzate del centro sportivo comunale. I Lotto Tennis e beach volley	23.600,00	19.478,57
		Opere di Miglioramento e recupero degli immobili e delle aree attrezzate del centro sportivo comunale. II Lotto Area piscina comunale	20.000,00	19.764,00
C1	P.F2.06.05	Opere di Miglioramento e recupero degli immobili e delle aree attrezzate del centro sportivo comunale. III Lotto Campo polivalente in Via Moro	26.400,00	26.398,23
C5	P.01.01*	Lavori di Adeguamento impianti, sistemazione esterna del centro diurno per anziani. Acquisto pulmino per portatori handicap	50.000,00	45.000,00
C5	P.01.02	Adeguamento struttura centro diurno per anziani	100.000,00	0,00
A1	P.01.03	Progetto integrato III età - Riqualificazione area Parco del Seggio	400.000,00	701.872,41
			360.000,00	
C5			33.124,80	
C5	P.01.03a	Progetto integrato III età - Riqualificazione area Parco del Seggio. Opere supplementari di completamento	216.875,20	158.589,57
C5	P.01.04	Adeguamento e ampliamento mensa a servizio polo socio - assistenziale	35.000,00	33.844,80
	P.01.04b	Adeguamento e ampliamento mensa a servizio polo socio - assistenziale. Intervento di completamento	80.000,00	0,00
A1	P.F2.01.03	Progetto integrato III età - Riqualificazione area Parco del Seggio. Opere supplementari di completamento	320.000,00	0,00
C5				
C5	P.F2.01.05	Lavori di costruzione nuovi loculi all'interno del Cimitero Comunale. 1^ Lotto.	30.000,00	30.000,00
C5	P.F2.01.07	Sistemazione ed ampliamento cimitero	100.000,00	99.996,71
C5	P.F2.01.08	Opere di miglioramento sismico Centro Smile	35.000,00	33.767,04
C5	P.F2.01.09	Sistemazione Cine-Teatro Pino	47.169,88	39.314,70
		Risorse umane ed attrezzature connesse	105.659,00	105.300,20
		Risorse umane ed attrezzature connesse	48.000,00	48.000,00
TOTALI FASE I			4.230.599,57	3.452.545,51
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			956.169,88	579.751,92

TOTALI COMPLESSIVI	5.186.769,45	4.032.297,43
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 22: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Montemurro

COMUNE DI MONTEMURRO				
DPC Fase I Appr. DGR 864/2006, 1929/2006 e 553/2008		D.P.C. Fase II Approvato con DD 758 del 25/03/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Pic Facciate e coperture Largo Spinelli	145.350,00	130.815,00
A1	P.01.02	Pic Facciate e coperture Piazza IV Novembre	105.280,20	105.280,20
	P.01.02a	Pic Facciate e coperture Piazza IV Novembre. Opere di completamento	22.219,80	20.547,34
A1	P.02.01	Sistemazione scalinata discesa Capo Le Tempe	62.711,68	66.258,71
A1	P.02.02	Riqualificazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre	389.242,58	389.242,58
		Riqualificazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre. Opere di completamento	54.513,36	54.513,36
	P.02.02a	Riqualificazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre. Opere di completamento. Arredo urbano Piazza IV Novembre	16.243,81	16.191,48
A1	P.02.03	Riqualificazione ambientale e naturalistica quartiere San Rocco per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Nelle precedenti approvazioni erano 2 interventi il P.02.03a di € 177.000,00 totali di cui € 40.000,00 a carico del P.O. e il P.02.03b di € 168.500,00 tutti a carico del P.O.. Ora è un unico intervento	208.500,00	164.493,38
A1	P.02.04	Realizzazione parcheggi in Via Sorgia	163.139,94	163.139,94
	P.02.04a	Realizzazione parcheggi in Via Sorgia. Opere di completamento	44.350,06	34.380,18
A1	P.F2.06.01	Lavori di completamento dell'edificio scolastico "Ten. Robilotta"	643.681,79	643.681,79
		Lavori di completamento dell'edificio scolastico "Ten. Robilotta". Opere di completamento	56.318,21	56.318,21
A2	P.03.01	Lavori di realizzazione parco e verde pubblico attrezzato. Discesa Scaliero	123.682,53	123.682,53
	P.03.01a	Lavori di realizzazione parco e verde pubblico attrezzato. Discesa Scaliero. Opere di completamento	26.317,47	11.317,47
A2	P.F2.03.02	Recupero ambientale e naturalistico fontana dell'Afio e attigua pineta	100.000,00	0,00
			92.000,00	0,00

C1	p.04.01	Miglioramento campo sportivo. Costruzione gradinate campo di calcio	99.000,00	99.000,00
C1	P.04.02	Miglioramento campo sportivo. Adeguamento campi palla a volo e tennis	55.765,65	55.765,65
	P.04.02a	Miglioramento campo sportivo. Adeguamento campi palla a volo e tennis. Opere di completamento	24.234,35	0,00
C5	P.05.01	Strutture socio sanitarie assistenziali .	271.501,00	271.483,00
C5	P.05.02	Completamento e attrezzature per Struttura socio sanitarie assistenziali	197.853,00	0,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	80.000,00	80.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	53.449,32	53.449,32
TOTALI FASE I			2.089.905,43	1.786.110,82
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			945.449,32	753.449,32
TOTALI COMPLESSIVI			3.035.354,75	2.539.560,14
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 23: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Paterno

COMUNE DI PATERNO				
DPC Fase I Appr. DGR 1279/2006 e 2032/2006			D.P.C. Fase Approvato con D.D. N. 7132.2012/D.02672 del 29/11/2012	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Riqualificazione rioni Limanti e Pantano	90.000,00	68.545,35
A1	P.02.01*	Riqualificazione rioni Raia, Carboni e Giardini	90.000,00	66.643,17
A1	P.F2.01.01	Costruzione Casa Comunale	600.000,00	0,00
	P.F2.01.02	Riqualificazione impianto pubblica illuminazione	206.000,00	206.000,00
A1	P.03.01*	Riqualificazione Via Petazzo, Castagne e Acquareggente	32.347,45	32.347,45
		Riqualificazione Via Petazzo, Castagne e Acquareggente. Opere di completamento	17.652,55	0,00
A1	P.03.02	Realizzazione marciapiedi Via Castagne Rotabile e Acquareggente.	180.000,00	132.960,59
A1	P.03.03	Realizzazione di una piazza belvedere con sottostanti parcheggi pubblici in Via Tempa. Questo intervento è stato accorpato al P.06.01 per € 190.000,00	0,00	0,00
A1	P.04.01	Riqualificazione Piazza Isabella Morra e Via G. Fortunato. Con Interventi di architettura paesaggistico - ambientale.	934.081,62	840.673,46
A2		Riqualificazione Piazza Isabella Morra e Via G. Fortunato. Con Interventi di architettura paesaggistico - ambientale.		
A2	P.02.02	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'area dismessa in località Giardini	200.000,00	186.417,25
A2	P.05.01	Viabilità rurale Via Le Sorti e Chiusulelle	42.871,11	42.871,11
A2	P.05.01b	Viabilità Rurale località Le Sorti e Chiusulelle – opere di completamento	12.008,89	9.368,10
A2	P.05.02	Riqualificazione area località Spineta. Questo intervento è stato spostato al P.06.01 per € 10.000,00	0,00	0,00
C1	P.01.02	Riqualificazione complesso sportivo Polivalente in località Pantano	50.000,00	49.999,13
C1	P.06.01	Realizzazione tribuna calcio.	80.000,00	79.348,95
C1	P.06.02	Sistemazione area impianti sportivi con interventi di adeguamento funzionale delle strutture esistenti. Con DD N. 1776 è stata variata la scheda progetto spostando, l'importo di € 190.000,00 e l'importo di € 10.000,00 di cui all'intervento	450.000,00	433.157,95

		precedente e impegnando ex novo € 250.000,00 e non € 300.000,00		
C1	P.06.03	Realizzazione campo di tiro a volo - Costa della Gaveta	50.000,00	0,00
C5	P.04.02	Recupero funzionale ed adeguamento impiantistico ex asilo in piazza Isabella Morra	210.083,67	210.083,67
		Recupero funzionale ed adeguamento impiantistico ex asilo in piazza Isabella Morra. Opere di completamento	59.916,33	0,00
C5	P.07.01	Ristrutturazione ed adeguamento ex complesso scolastico in comunità alloggio	140.000,00	119.435,37
C5	P.07.02	Acquisto arredo comunità alloggio	65.638,38	19.691,51
		Risorse umane e redazione DPC	68.672,00	57.547,00
		Risorse umane e redazione DPC	1.332,19	0,00
TOTALI FASE I			2.773.272,00	2.349.090,06
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			807.332,19	206.000,00
TOTALI COMPLESSIVI			3.580.604,19	2.555.090,06
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 24: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Pietrapertosa

COMUNE DI PIETRAPERTOSA				
DPC Fase I finanziato con DD N. 3611 del 22/11/2018		DPC Fase II: nel DPC Fase I sono stati presentati anche gli interventi Fuori tetto finanziario che dovrebbero confluire nel DPC Fase II		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Recupero ex Scuola Via Garibaldi. Questo è un unico intervento di complessivi € 704.722,89 che ricade su tre misure A1, C1 e C5, con importi diversi. Quindi troviamo lo stesso codice progetto in tre sezioni	397.117,60	
	P.01.02	PIC - Adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e coperture	250.000,00	
A2	P.03.01	Messa in sicurezza viabilità rurale	140.000,00	
C1	P.01.01	Recupero ex Scuola Via Garibaldi. Questo è un unico intervento di complessivi € 704.722,89 che ricade su tre misure A1, C1 e C5, con importi diversi. Quindi troviamo lo stesso codice progetto in tre sezioni	143.265,94	
C5	P.01.01	Recupero ex Scuola Via Garibaldi. Questo è un unico intervento di complessivi € 704.722,89 che ricade su tre misure A1, C1 e C5, con importi diversi. Quindi troviamo lo stesso codice progetto in tre sezioni	164.339,35	
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	82.403,74	24.721,12
		Somma impegnata (DGR 428/2012)	70,04	
TOTALI FASE I			1.177.196,67	24.721,12
TOTALI COMPLESSIVI			1.177.196,67	24.721,12
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 25: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Roccanova

COMUNE DI ROCCANOVA				
DPC Fase I Appr. DGR 2623/2005 e 654/2006			D.P.C. Fase II - PRESENTATO MA IN FASE DI ISTRUTTORIA	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Arredo urbano e Sistemazione Piazze	66.000,00	62.998,24
A1	P.02.01	Acquisizione e recupero immobili ex frantoio	250.000,00	0,00
A1	P.02.02	Acquisizione e recupero di alcune cantine	20.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	Acquisizione e recupero dell'immobile ex Frantonio	0,00	0,00
A1	P.F2.02.02	Acquisizione e recupero di alcune cantine	0,00	0,00
A1	P.03.01	PIC Facciate e Coperture. Attivazione ambito Pilota	50.000,00	50.000,00
A1	P.03.02	PIC Facciate e Coperture. Attivazione Ambito Priorità	125.000,00	125.000,00
A1	P.03.04	Eliminazione detrattore visivo viadotto	53.000,00	51.860,97
A1	P.F2.03.01	Parco delle cantine. Risistemazione strada di accesso al Parco c/da Manche	0,00	0,00
A1	P.F2.03.01	Attivazione ambito pilota	0,00	0,00
A1	P.F2.03.02	Attivazione ambito priorità maggiore	0,00	0,00
A1	P.F2.03.03	Attivazione ambito di priorità minore	0,00	0,00
A1	P.F2.03.04	Eliminazione del detrattore visivo "Viadotto"	0,00	0,00
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura	42.800,00	38.520,00
A1	P.F2.04.01	Recupero e riutilizzo dimore centro storico per Borgo albergo	0,00	0,00
A1	P.05.01	Pic Box Interrati zona A.	268.725,00	264.111,72
A2	P.F2.05.01	Sistemazione strada interpoderale di San Jorio, Gimone, Valdarra, Fontanelle, Montagnola	0,00	0,00
A2	P.06.01	Creazione Parco delle cantine	97.000,00	95.535,99
A2	P.06.02	Riqualficazione a valle del centro abitato Parco Carazita	189.000,00	174.199,04
A2	P.07.01	Sistemazione strada interpoderale Marchese Calderaro	100.000,00	94.358,04
C1	P.08.01	Realizzazione palazzetto sport e centro polifunzionale	326.000,00	324.226,36
C5	P.08.02	Realizzazione palazzetto sport e centro polifunzionale	324.000,00	323.000,00
C5	P.09.01	Centro diurno per anziani	106.000,00	126.519,95

		Centro diurno per anziani (attrezzature)	51.000,00	
		Risorse umane ed attrezzature connesse	142.475,00	147.632,50
		Risorse umane ed attrezzature connesse	0,00	0,00
TOTALI FASE I			2.211.000,00	1.877.962,81
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			0,00	0,00
TOTALI COMPLESSIVI			2.211.000,00	1.877.962,81
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 26: Interventi inseriti nel DPC del Comune di San Chirico Raparo

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 797/2005, 797/2006, DGR 1775/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 60 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.04.01	Recupero palazzo Barletta	270.000,00	203.350,62
A1	P.04.02	PIC Riqualificaz. Facciate e Coperture	315.000,00	94.500,00
A1	P.04.05	Riqualificazione Via e Piazza Roma	296.016,90	289.977,69
A1	P.04.07	Riqualificazione della villa comunale e recupero fontana S. Rocco	70.000,00	62.059,94
A1	P.04.08	Realizzazione collegamento pedonale centro storico e area sportiva	40.000,00	40.000,00
A1	P.04.13	Promozione turistica del Progetto "Città Basiliana"	15.000,00	0,00
A1	P.04.13a	Percorso narrativo Basiliano	18.000,00	0,00
A1	P.F2.01.01	Casa di Riposo per anziani. Completamento I^ Lotto.	150.000,00	150.000,00
A2	P.03.01	Riqualificazione Area Torre San Vito	100.000,00	99.517,00
A2	P.03.15	Restauro del convento Santa Maria (ex PIC Casa Sicura)	691.700,00	691.510,21
C5	P.08.01	Casa di riposo per anziani.		
A2	P.F2.02.01	Infrastrutturazione turistica Monte Raparo		
C1	P.08.02	Adeguamento impianti sportivi esistenti e centro polisportivo	374.900,00	374.522,02
C1	P.08.05	Centro socio assistenziale per assistenza ed orientamento al lavoro.	167.267,93	167.267,93
C1	P.08.05a	Completamento centro Polifunzionale Via San Rocco. Con DD. n. 1278 del 25/06/2013 è stata approvata la rimodulazione della S.P.. Di fatto questo intervento scaturisce dalle economie del progetto principale P.08.05 che era di complessivi € 220.000,00	52.732,07	43.535,79
C1	P.F2.	Attrezzature sportive a corredo del centro polisportivo esistente. Prima questo intervento era Infrastrutturazione turistica Monte Raparo per complessivi € 360.293,42 di cui € 30.000,00.	30.000,00	0,00
C5	P.F2.03.01	Casa per Anziani II^ Lotto	435.000,00	391.500,00
		Risorse Umane ed attrezzature connesse	141.384,00	141.384,00

	P.F2.04.01	Risorse Umane ed attrezzature connesse	58.776,48	58.297,77
TOTALI FASE I			2.552.000,90	2.207.625,20
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			673.776,48	599.797,77
TOTALI COMPLESSIVI			3.225.777,38	2.807.422,97
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 27: Interventi inseriti nei DPC del Comune di San Martino d'Agri

COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 1947/2006		D.P.C. Fase II Approvato con DD 58 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Dalla Piazza al Convento.	700.000,00	624.857,50
A1	P.02.01	Completamento recupero ex convento Sant'Antonio	150.000,00	117.327,63
A1	P.F2.01.01	Completamento, recupero ed attrezzaggio ex Convento	150.000,00	45.000,00
A1	P.F2.01.02	Completamento finiture ex convento. Questo intervento è stato inserito ex novo e deriva dalle economie dell'intervento P.01.01 Dalla Piazza al Convento per € 75.142,50 e da quelle dell'intervento P.02.01 Completamento e recupero ex convento Sant'Antonio per € 32.672,12	107.814,67	104.590,24
A2	P.05.01	Lavori di sistemazione della villetta Comunale	180.000,00	180.000,00
A2	P.05.02	Lavori di sistemazione ed arredo Pineta	45.000,00	45.000,00
A2	P.05.03	Sistemazione area circostante santuario Madonna della Rupe	50.000,00	48.349,50
A2	P.05.04	Sistemazione area verde e piazza località San Pietro	42.636,46	42.636,46
		Sistemazione area verde e piazza località San Pietro. Opere di completamento	7.363,54	0,00
A2	P.05.05	Sistemazione area Croce	20.000,00	19.275,74
A2	P.05.06	Sistemazione aree periferiche	41.550,00	41.550,00
		Sistemazione aree periferiche. Opere di completamento	3.450,00	0,00
A2	P.F2.02.01	Riqualificazione urbana e ambientale zona villetta. Prima l'intervento era Infrastrutturazione turistica Monte Raparo per € 25.000,00 ed è stato incrementato di altri € 25.000,00 presi dalle risorse umane	50.000,00	0,00
C1	P.F2.03.01	Nuovo impianto polivalente località San Pietro. A questo intervento è stato incorporato l'intervento P.07.01 della Fase I per € 279.000,00	279.000,00	439.761,03
			221.000,00	
C5	P.F2.04.01	Casa di residenza per anziani. A questo intervento è stato incorporato l'intervento P.08.01 della Fase I per € 355.000,00	224.000,00	560.128,00
			355.000,00	
		Risorse umane ed attrezzature connesse	90.000,00	101.656,52
		Risorse umane ed attrezzature connesse. A questo intervento sono stati decurtati € 25.000,00 passati all'intervento P.F2.02.01	57.410,00	47.663,84


TOTALI FASE I	1.330.000,00	1.220.653,35
TOTALI FASE II - PREMIALITA'	1.444.224,67	1.197.143,11
TOTALI COMPLESSIVI	2.774.224,67	2.417.796,46
Importi espressi in euro		



Scheda programmatica 28: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Sant'Arcangelo

COMUNE DI SANT'ARCANDELO				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 506/2006 e 1894/2006		D.P.C. Fase II Approvato con DD 59 del 22/01/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Collegamento orizzontale Corso Umberto - Rione Valle	130.000,00	128.746,18
A1	P.01.02	Riqualificazione Corso Umberto - La Piazzetta	100.000,00	100.000,00
A1	P.01.03	Riqualificazione ed arredo urbano San Brancato - Corso e Piazza Levi.	540.000,00	539.999,69
A2	P.06.02	Sulle tracce di Levi.		
A1	P.02.01	Recupero ex mercato coperto	380.000,00	380.000,00
C5	P.02.02	Recupero ex mercato coperto - Attrezzature.		
A1	P.03.01	Pic Riqualificazione formale facciate e coperture	795.819,51	800.000,00
			4.180,49	
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura	227.000,00	227.000,00
A1	P.F2.01.04	Riqualificazione rione Castello	246.287,28	246.287,28
		Riqualificazione rione Castello. Opere di completamento	103.712,72	81.194,58
A1	P.F2.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	350.000,00	449.921,71
		PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture. Finanziamento integrativo	100.000,00	
A2	P.06.01	Il percorso dei calanchi.	100.000,00	67.900,26
A2	P.07.01	Lavori di sistemazione e miglioramento viabilità rurale	101.531,57	101.531,57
A2	P.07.01b	Completamento lavori di sistemazione e miglioramento viabilità rurale	28.468,43	27.753,29
A2	P.F2.03.01	Riqualificazione e arredo urbano in San brancato. La Piazza Levi	401.946,04	401.946,04
		Riqualificazione e arredo urbano in San brancato. La Piazza Levi. Opere di completamento	98.053,96	98.053,96
C1	P.08.01	Lavori di costruzione di una piscina comprensoriale	707.200,00	707.200,00
C1	P.F2.04.01	Potenziamento Centro sportivo. Completamento piscina comprensoriale	564.009,25	564.009,25
C1	P.F2.04.01a	Potenziamento Centro sportivo. Completamento piscina comprensoriale. Opere di completamento	135.990,75	122.391,67


C5	P.08.01b	Lavori di completamento piscina comprensoriale. Acquisto attrezzature	61.000,00	60.872,16
C5	P.09.01	Struttura socio - assistenziale per anziani	829.000,00	828.341,07
C5	P.F2.05.01	Potenziamento Struttura socio assistenziale	530.119,47	530.169,47
		Potenziamento Struttura socio assistenziale. Opere di completamento	69.880,53	20.964,16
		Risorse umane ed attrezzature connesse	180.100,00	145.278,86
		Risorse umane ed attrezzature connesse	26.966,00	18.480,00
TOTALI FASE I			4.184.300,00	4.114.623,08
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			2.626.966,00	2.533.418,12
TOTALI COMPLESSIVI			6.811.266,00	6.648.041,20
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 29: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Sarconi

COMUNE DI SARCONI				
D.P.C. Fase I Appr. con DGR 283/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 576 del 25/03/2010 e 1911 del 13/09/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Pic Facciate e coperture	300.000,00	270.000,00
A1	P.03.01	Pic Box interrati.	135.000,00	135.000,00
A1	P.04.01	Sistemazione viabilità urbana e arredo, cablaggio reti e abbattimento barriere architettoniche.	150.360,82	150.360,82
		Sistemazione viabilità urbana e arredo, cablaggio reti e abbattimento barriere architettoniche. Opere di completamento	49.639,18	49.639,18
A1	P.04.02	Adeguamento norme di sicurezza impianto pubblica illuminazione nel centro abitato	100.367,71	100.367,71
		Adeguamento norme di sicurezza impianto pubblica illuminazione nel centro abitato. Opere di completamento	25.029,29	25.029,29
A2	P.05.01	Risanamento ambientale parco fluviale Maglie	0,00	0,00
A2	P.06.01	Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali	74.858,13	74.858,13
		Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali. Opere di collegamento	24.317,87	24.317,15
A1	P.F2.01.02	PIC Facciate e Coperture dei fabbricati siti nel centro storico (prima tale scheda rientrava nella Fase 1 come p.02.01 PIC Casa Sicura)	115.000,00	97.068,96
A2	P.F2.04.03	Adeguamento Impianto di pubblica illuminazione del centro abitato (2° Lotto)	68.154,99	68.154,99
	P.F2.04.03a	Adeguamento Impianto di pubblica illuminazione del centro abitato (2° Lotto). Opere di completamento	6.845,01	0,00
A2	P.F2.04.04	Sistemazione viabilità urbana ed abbattimento barriere architettoniche del Centro Abitato (2° Lotto)	50.000,00	50.000,00
A2	P.F2.05.01	Risanamento Ambientale area parco fluviale Maglie e riqualificazione tratturo turistico per il lago del Pertusillo (2^ Lotto). A questo intervento è accorpato l'intervento P.05.01 Fase I di € 190.000,00 che viene finanziato contestualmente.	110.000,00	0,00
			190.000,00	
A2	P.F2.06.02	Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali 2^ lotto	94.645,99	94.645,99
	P.F2.06.02a	Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali 2^ lotto. Opere di completamento	10.054,01	10.053,21
C1	P.07.01	Sistemazione Campi da tennis, calcetto e calcio	163.000,47	163.000,47

		Sistemazione Campi da tennis, calcetto e calcio. Opere di completamento	33.088,53	33.088,53
C1	P.F2.07.02	Adeguamento Palestra comunale e Campo Sportivo	87.708,43	87.708,43
	P.F2.07.02a	Adeguamento Palestra comunale e Campo Sportivo. Opere di completamento	27.291,57	27.291,57
C5	P.08.01	Ristrutturazione locali ex scuola media per centro assistenziale ricreativo per fasce deboli	216.739,00	216.739,00
		Ristrutturazione locali ex scuola media per centro assistenziale ricreativo per fasce deboli. Opere di completamento	18.000,00	0,00
C5	P.F2.06.03	Adeguamento area cimiteriale	87.978,89	87.978,89
		Adeguamento area cimiteriale. Opere di completamento	12.021,11	12.021,11
		Risorse umane ed attrezzature connesse	65.000,00	63.605,20
		Risorse umane ed attrezzature connesse	67.096,00	62.025,46
TOTALI FASE I			1.355.401,00	1.306.005,48
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			926.796,00	596.948,61
TOTALI COMPLESSIVI			2.282.197,00	1.902.954,09
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 30: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Sasso di Castalda

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA				
D.P.C. Fase I Appr. DGR 653/2006, 863/2006 e 273/2007		D.P.C. Fase II Approvato con DD 968 del 14/04/2010		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione e arredo urbano rione Manca. L'intervento prima era di € 65.940,00 l'economia di € 12.727,88 è stata utilizzata per l'intervento P.01.03a	53.212,12	53.212,12
A1	P.01.02	Riqualificazione e arredo urbano nel Centro Storico. Rione Ospizio, Via Concezione, Via Pietà, Via del Popolo, Via S. Nicola e chiesetta S. Antonio Abate. L'intervento prima era di € 65.940,00 l'economia di € 23.943,47 è stata utilizzata per l'intervento P.01.03a	226.056,53	226.056,53
A1	P.01.03a	Sistemazione dell'area adiacente i box interrati.	36.671,35	36.666,31
A1	P.02.01	Recupero palazzo De Luca 2° Lotto.	150.000,00	126.820,20
	P.02.01a	Recupero palazzo De Luca. Opere di completamento		23.179,80
A1	P.03.01	Pic Facciate e coperture.	135.000,00	135.000,00
A1	P.04.01	Pic Casa Sicura.	39.948,00	39.948,00
A1	P.05.01	Pic Box Interrati	50.000,00	40.613,44
A1	P.F2.01.01	Acquisizione e sistemazione urbanistico edilizia di fabbricati degradati del Centro Storico	250.000,00	0,00
A1	P.F2.02.01	PIC Facciate e coperture	48.000,00	48.000,00
A1	P.F2.03.01	PIC Casa Sicura	42.000,00	42.000,00
A1	P.F2.04.01	PIC Box Interrati	0,00	0,00
A1	P.F2.04.02	Lavori di completamento teatro comunale	50.000,00	50.000,00
A1	P.F2.05	Lavori di costruzione nuovo ponte tibetano "Il Ponte dei Sogni"	442.341,77	0,00
A2	P.06.01	Riqualificazione Campeggio Madonna del Sasso	100.000,00	84.395,20
A2	P.06.01b	Lavori di compl. elettrificazione impianti e strutture ricettive - comprensorio sciistico Arioso Fossa Cupa.	90.000,00	89.559,73
A2	P.06.02	Completamento riqualificazione località Costara	50.000,00	42.566,67
A2	P.06.03	Itinerari in quota	90.000,00	0,00
A2	P.07.01	Rete idrica località Turri e sistemazione strade	100.000,00	81.184,66

A2	P.07.02	Lavori di adeguamento viabilità rurale Aciriello e Isca Cerasa	33.500,00	29.813,95
A2	P.F2.05.01	Sistemazione aree periurbane Zona Castello e Vallone della Manca	121.616,31	121.616,31
A2	P.F2.05.01a	Lavori di riqualificazione aree periurbane Piazza R. Petrone e Villetta Comunale. Completamento dell'intervento	28.383,69	28.383,69
C1	P.08.01	Lavori di ristrutturazione impianti sportivi esistenti	194.757,03	194.757,03
C1	P.08.01b	Completamento lavori di ristrutturazione impianti sportivi esistenti	36.842,97	11.052,92
C1	P.F2.06.01	Sistemazione e potenziamento Impianti Sportivi leggeri nel centro urbano	50.000,00	49.924,26
C1	P.F2.06.02	Nuovo intervento in seguito alla rimodulazione della scheda da definirsi	50.000,00	0,00
C5	P.09.01.a	Centro diurno per anziani e fasce deboli	385.000,00	385.000,00
C5	P.09.01.b	Riqualificazione area di pertinenza del centro diurno per anziani.	41.826,00	41.825,46
C5	P.F2.07.01	Completamento e potenziamento Centro Diurno per Anziani e fasce deboli in località Aia la Croce	138.616,16	138.616,16
C5	P.F2.07.01	Completamento e potenziamento Centro Diurno per Anziani e fasce deboli in località Aia la Croce. Opere di completamento	31.383,84	31.383,84
C5	P.F2.07 bis	Lavori di riqualificazione dell'area cimiteriale. Questo intervento prima non c'era. E' stata modificata la Scheda Progetto	74.004,38	74.004,38
C5	P.F2.07a bis	Lavori di riqualificazione dell'area cimiteriale. Completamento dell'intervento	25.995,62	0,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	76.220,00	70.321,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	60.192,00	49.481,84
TOTALI FASE I			1.889.034,00	1.711.973,02
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.412.533,77	633.410,48
TOTALI COMPLESSIVI			3.301.567,77	2.345.383,50
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 31: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Satriano di Lucania

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA				
D.P.C. Fase I Appr. DGR 1299/2006			D.P.C. Fase II Approvato con DD 1491 del 28/06/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione P.zza Umberto I - Lavori di ristrutturazione Pubblica Illuminazione strade di accesso alla Piazza Umberto I	210.000,00	195.484,51
A1	P.02.01	Lavori di ristrutturazione ex Scuola Materna e realizzazione Casa della Solidarietà.	230.000,00	590.000,00
C5			360.000,00	
A1	P.02.02	Restauro Palazzo Guarino	60.000,00	60.000,00
A1	P.02.03	Riqualificazione Piazza Garibaldi	28.000,00	28.000,00
A1	P.03.01	PIC. Riqualificazione formale Facciate e coperture.	168.000,00	168.000,00
A1	P.03.02	Il Borgo Albergo completamento parcheggi c.so Trieste	30.000,00	27.000,00
A1	P.03.03	Costruzione autorimessa C.so Trieste. Parcheggi	230.000,00	230.000,00
A1	P.F2.01.01	PIC Facciate e coperture centro storico. Questo intervento è scomparso e passa di fatto nella S.P. 02 per € 30.000,00	0,00	0,00
A1	P.F2.01.02	Riqualificazione verde pubblico Paschiero	79.000,00	79.000,00
A1	P.F2.01.03	Riqualificazione piazza Umberto I. 2^ Lotto	150.000,00	150.000,00
A1	P.F2.01.04	Adeguamento impianto di pubblica illuminazione	60.000,00	60.000,00
A1	P.F2.01.06	Il Lotto Castello	300.000,00	300.000,00
A1	P.F2.01.07	Adeguamento immobili Comunali Caserma dei Carabinieri	40.000,00	40.000,00
A2	P.01.02	Lavori di riqualificazione Piazza S. Andrea	48.000,00	43.200,00
A2	P.01.03	Lavori di riqualificazione Largo Pantanelle	52.000,00	52.000,00
A2	P.02.04	Completamento lungofiume	25.000,00	22.500,00
A2	P.04.01b	Riqualificazione Parco Belvedere	45.000,00	44.432,96
A2	P.04.01c	Completamento Via dei Pellegrini.	20.000,00	19.884,24
A2	P.04.01a	Riqualificazione Parco Spera	25.000,20	24.869,86
A2	P.04.02	Realizzazione infrastrutturale stradale per il Miglioramento della viabilità urbana. Fondovalle.	120.000,00	120.000,00

A2	P.04.03	Miglioramento viabilità Via dei Pellegrini.	28.500,00	38.059,50
			11.500,00	
A2	P.F2.02.01	Via dei Pellegrini - Pietra del Corvo	100.000,00	99.941,09
A2	P.F2.02.02	Isola ecologica	55.000,00	55.000,00
A2	P.F2.02.03	Viale Angelo Pascale - Ultima fase	42.000,00	42.000,00
A2	P.F2.02.04	Completamento isola ecologica	30.000,00	29.722,00
C1	P.05.01	Sistemazione campo sportivo.	140.000,00	139.934,38
C1	P.05.02	Ampliamento ed adeguamento strutture sportive. Adeguamento piscina in località Cannonica	138.500,00	138.085,66
C1	P.05.03	Realizzazione impianto di illuminazione	15.000,00	23.825,00
			8.825,00	
A1	P.F2.01.05 P.F2.03.04	Campo di calcetto. Prima l'intervento era Adeguamento ed abbattimento barriere architettoniche sede comunale	90.000,00	90.000,00
C5	P.F2.03.01	Miglioramento tecnologico Casa della Solidarietà	120.000,00	120.000,00
C5	P.F2.03.02	Completamento Asilo Nido	105.459,80	105.459,80
C5	P.F2.03.02a	Lavori sistemazione esterna Asilo nido	24.930,20	0,00
C5	P.F2.03.03	Adeguamento Istituto Comprensivo	70.000,00	60.750,87
		Risorse umane ed attrezzature connesse	75.998,00	75.083,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse	35.000,00	34.721,04
TOTALI FASE I			2.069.323,20	2.040.359,11
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.301.390,00	1.266.594,80
TOTALI COMPLESSIVI			3.370.713,20	3.306.953,91
Importi espressi in euro				

Scheda programmatica 32: Interventi inseriti nel DPC del Comune di Spinoso

COMUNE DI SPINOSO				
D.P.C. Fase I Appr. DGR 1277/2006 e 2034/2006			D.P.C. Fase II Approvato con DD 530 del 03/03/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01*	Acquisizione palazzo Ranone	320.000,00	364.745,08
A1	P.01.0b*	Messa in sicurezza del Palazzo Ranone	45.000,00	
A1	P.01.02	Pic Facciate e coperture Piazza Plebiscito	25.000,00	7.500,00
A1	P.01.03	Riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza Plebiscito e del sottostante edificio polifunzionale.	497.743,00	120.966,00
A2		Riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza Plebiscito	308.697,00	
A1	P.F2.01.01	Restauro e consolidamento della Chiesa Madre e recupero percorsi sottostanti	160.000,00	160.000,00
	P.F2.01.02	Completamento PIC Adeguamento tipologico delle facciate e delle coperture. Questo intervento prima non c'era. È stata variata la scheda progetto delle risorse umane detraendo l'importo di € 11.498,00. Di conseguenza alle risorse umane restano € 14.462,00. Con altra variazione viene accorpato l'imp. di € 11.498,00 al P.F2.02.01		
	P.F2.01.03	Realizzazione interventi di contenimento dei consumi energetici sulla casa comunale. Questo intervento prima non c'era. È stato eliminato l'intervento P.F2.06.03 Lavori di infrastrutturazione del Monte Raparo di € 25.000,00 e realizzato questo	25.000,00	24.999,17
A2	P.F2.06.01	Riqualificazione di un tratto spondale del lago del Pertusillo per la realizzazione di attrezzature finalizzate alla balneazione	250.000,00	0,00
A2	P.F2.06.02	Riqualificazione e completamento infrastrutture turistiche Monte Raparo	99.631,64	0,00
A2	P.F2.06.03	Lavori di infrastrutturazione turistica Monte Raparo. Questo intervento è stato eliminato. Al suo posto verrà realizzato il P.F2.01.03 Realizzazione interventi di contenimento dei consumi energetici sulla casa comunale per € 25.000,00	0,00	0,00
C1	P.02.02	Illuminazione artificiale campo sportivo	45.000,00	42.457,46
C1	P.02.03	Adeguamento funzionale campo di calcetto e tennis. L'economia di questo intervento di € 8.946,03 passa all'Int. P.F2.02.01	31.053,97	31.053,97
C1	P.F2.02.01	Adeguamento sismico, norme in materia di sicurezza	170.000,00	176.051,56

		antincendio, barriere architettoniche. Scuola elementare e media con attigua palestra. Istituto comprensivo "Abate Racioppi". Questo intervento proviene dalla Fase I. Con variazione successiva sono stati inseriti: l'economia dell'int. P.02.03 di € 8946,00, l'ec. Dell'int. P.F2.01.03 di € 11.498,00, l'intero importo dell'int. P.F2.02.01 di € 125.000,00	11.498,00	
			125.000,00	
			8.946,00	
	P.F2.02.04	Palestra Comunale nell'area degli impianti sportivi. Con variazione viene accorpato l'imp. di € 11.498,00 al P.F2.02.01		
C5	P.03.01	Casa di riposo per anziani.	310.000,00	309.187,96
		Risorse umane ed attrezzature connesse	60.960,00	35.000,00
		Risorse umane ed attrezzature connesse. È stata variata la scheda progetto detraendo l'importo di € 11.498,00 e spostandolo all'intervento P.F2.01.02 PIC facciate e coperture. Di conseguenza alle risorse umane restano € 14.462,00	14.462,00	6.284,20
TOTALI FASE I			1.643.453,97	910.910,47
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			864.537,64	367.334,93
TOTALI COMPLESSIVI			2.507.991,61	1.278.245,40



Scheda programmatica 33: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Stigliano

COMUNE DI STIGLIANO				
DPC Fase I finanziato con DD N. 3612 del 22/11/2018		DPC Fase II: nel DPC Fase I sono stati presentati anche gli interventi Fuori tetto finanziario che dovrebbero confluire nel DPC Fase II		
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Riqualificazione aree centro urbano	200.000,00	
	P.01.02	Riqualificazione e completamento Piazza Garibaldi	150.000,00	
	P.01.03	Riqualificazione ed arredo area via Principe di Napoli	120.000,00	
	P.01.04	Risanamento e riqualificazione prospetti palazzo comunale	170.000,00	
	P.01.05	Riqualificazione ed arredo area circostante palazzo comunale	100.000,00	
	P.03.01	PIC Casa Sicura	150.000,00	
	P.02.01	PIC Riqualificazione formale delle facciate e delle coperture	350.000,00	
A2	P.04.01	Riqualificazione Area Centro Sociale	150.000,00	
	P.04.02	Riqualificazione Area Chiazza	155.728,14	
	P.04.03	Via del Grano - Ristrutturazione Mulino Desortis	80.000,00	
	P.05.01	Riqualificazione Borgata Serra di Croce	50.000,00	
C1	P.06.01	Consolidamento e riqualificazione stadio per il gioco del calcio	150.000,00	
	P.06.02	Realizzazione di un complesso sciistico	492.952,60	
	P.06.03	Realizzazione campo di bocce	50.000,00	
C5	P.07.01	Riqualificazione edificio ex INAM per la realizzazione di un centro di ascolto	150.000,00	
	P.07.02	Riqualificazione e completamento edificio ex INAM (piani superiori)	446.885,62	
		Somma impegnata (DGR 428/2012)	1,23	
	P.12.01	Risorse Umane ed attrezzature connesse	223.214,66	66.954,40
		TOTALE DPC FI	3.188.782,25	66.954,40
		TOTALE DPC FII	0,00	0,00

		TOTALE COMPLESSIVO DPC	3.188.782,25	66.954,40
--	--	-------------------------------	---------------------	------------------

Scheda programmatica 34: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Tramutola

COMUNE DI TRAMUTOLA				
D.P.C. Fase I Appr. DGR 1278/2006 e 1778/2007			D.P.C. Fase II Approvato con DD 562 del 09/03/2010	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	Pic Facciate e coperture	450.000,00	443.701,20
A1	P.02.01*	Riqualificazione aree degradate	250.000,00	249.968,62
A1	P.02.02	Pubblica illuminazione centro abitato	50.484,02	50.484,02
	P.02.02a	Pubblica illuminazione centro abitato. Opere di completamento	19.515,98	19.126,75
A1	P.02.03	Lavori di riqualificazione ed arredo urbano, sistemazione piazzette Via Gioberti, Vico San Felice, Via Alighieri, Vico Castagne.	64.208,80	64.208,80
		Lavori di riqualificazione ed arredo urbano, sistemazione piazzette Via Gioberti, Vico San Felice, Via Alighieri, Vico Castagne. Opere di completamento	15.791,20	10.100,84
A1	P.F2.01.02	PIC Facciate e coperture. Questo Intervento è finanziato con una rimodulazione della Fase I e precisamente dall'imp. Dell'ex int. P.02.04 Pavimentazione e illuminazione pubblica, arredo cablaggio reti Piazzette ed assi prioritari	320.000,00	318.884,00
A1	P.F2.02.04	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Garibaldi	115.000,00	114.038,88
A1	P.F2.02.05	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Emanuele	1.224,00	71.900,02
		Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Emanuele. Opere di completamento	70.676,02	16.576,06
A1	P.F2.02.06	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Ferroni e Piazzale Scuola Elementare	18.099,98	16.576,06
A1	P.F2.02.06	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Ferroni e Piazzale Scuola Elementare	113.014,33	113.014,33
A1	P.F2.02.06a	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Ferroni e Piazzale Scuola Elementare. Opere di completamento autorizzate con DD 1372 del 26/11/2015 con l'utilizzo delle economie del progetto principale di complessivi € 184.200,00	71.185,67	0,00
A1	P.F2.02.07	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Veneto	77.283,34	77.283,34

		Riqualificazione e sistemazione pavimentazione ed arredo urbano Largo Vittorio Veneto. Opere di completamento	22.716,66	21.522,50
A1	P.F2.02.08	Riqualificazione e sistemazione pavimentazione Via Cavour - Via M. Pagano	75.000,00	44.856,51
A1	P.F2.02.09	Completamento illuminazione artistica del centro storico e del centro abitato	140.000,00	136.109,71
A1	P.F2.02.10	Risanamento ambientale e recupero urbano del centro storico	300.000,00	262.158,94
A1	P.F2.03.01	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici della scuola primaria	11.989,16	11.989,16
			7.576,12	7.576,12
		36.311,00	36.311,00	
		Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici della scuola primaria. Opere di completamento	9.689,00	8.752,97
A1	P.F2.03.02	Recupero ex mulino San Carlo	100.000,00	97.428,97
A1	P.F2.03.03	Consolidamento e messa in sicurezza Palazzo terzella. Questa scheda è stata rimodulata e da € 55.000,00 ad € 15.000,00	15.000,00	15.000,00
A1	P.F2.03.04	Ristrutturazione servizi igienici ed adeguamento impianto termico Scuola Materna Via Ferroni	64.277,88	64.277,88
		Ristrutturazione servizi igienici ed adeguamento impianto termico Scuola Materna Via Ferroni. In questo intervento è stato incluso il P.F2.07.04: Ristrutturazione servizi igienici ed adeguamento impianto termico scuola materna Via Ferroni	11.116,12	8.522,73
A2	P.05.01	Risanamento zona sorgente Capo d'Acqua	120.685,52	120.685,52
		Risanamento zona sorgente Capo d'Acqua. Opere di completamento	29.314,48	27.190,01
A2	P.06.01*	Completamento pubblica illuminazione zone rurali	70.000,00	67.098,68
A2	P.06.02	Pubblica illuminazione rurale	95.488,54	95.488,54
A2	P.06.02b	Pubblica illuminazione rurale (completamento)	29.511,46	29.511,46
A2	P.F2.06.03	Sistemazione viabilità nelle zone rurali	80.000,00	75.111,30
C1	P.07.01*	Completamento infrastrutture sportive in località Castiglione	33.310,00	32.763,44
C1	P.07.01b	Adeguamento campo di calcetto	10.000,00	3.000,00
C1	P.07.02	Recupero agibilità e messa a norma impianti sportivi in località Castiglione Area 167	61.000,00	61.000,00
C1	P.07.03	Potenziamento della fruibilità delle attrezzature sportive parco Caranna ed adeguamento della viabilità di collegamento agli	210.689,00	203.112,88

		impianti sportivi. + Opere di completam.		
C5	P.08.01	Completamento strutturale per la trasformazione di una sala cinematografica in un Centro sociale polifunzionale denominato Centro 2000 Pace e Speranza	72.000,00	65.499,47
C5	P.08.01a	Lavori per la realizzazione di un cine-teatro ad alta accessibilità con particolare attenzione alle disabilità sensoriali	188.000,00	188.000,00
C5	P.08.02	Completamento attrezzaggio centro assistenza fasce deboli. Sala "Spolidoro Lenni" + Opere di completamento	103.856,00	103.855,90
C5	P.F2.08.01	Adeguamento ed ampliamento del Cimitero Comunale	262.333,44	262.333,44
		Adeguamento ed ampliamento del Cimitero Comunale. Opere di completamento	7.666,56	7.232,77
		Risorse umane ed attrezzature connesse	130.000,10	95.132,72
TOTALI FASE I			2.003.855,10	1.929.928,85
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			1.930.159,28	1.770.880,63
TOTALI COMPLESSIVI			3.934.014,38	3.700.809,48
Importi espressi in euro				



Scheda programmatica 35: Interventi inseriti nei DPC del Comune di Viggiano

COMUNE DI VIGGIANO				
D.P.C. Fase I Appr. DGR 647/2006 e 1301/2006			DPC FASE II - NON E' STATO ANCORA PRESENTATO	
Mis.	Cod. Oper.	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
A1	P.01.01	PIC Casa Sicura. Adeguamento statico e impiantistica.	358.000,00	322.200,00
A1	P.01.02	PIC Facciate e coperture. Riqualificazione percorsi urbani.	217.000,00	195.300,00
A1	P.01.03	Riqualificazione Centro storico. Abbattimento barriere architettoniche ed arredo urbano.	312.000,00	312.000,00
A1	P.01.04	Pic Box Interrati rioni Croci e S. Oronzo	438.750,00	0,00
A2	P.02.01	Sistema ecomusei Val d'Agri. Ostello verde	300.000,00	300.000,00
A2	P.02.02	Riqualificazione dell'area ex colonia	241.000,00	237.451,97
C1	P.03.01	Palestra Comunale	376.900,00	256.735,04
C5	P.04.01	Struttura polivalente da destinare ad attività culturali e socio assistenziali	475.100,00	434.741,98
		Risorse umane ed attrezzature connesse	80.000,00	80.000,00
TOTALI FASE I			2.798.750,00	2.138.428,99
TOTALI FASE II - PREMIALITA'			0,00	0,00
TOTALI COMPLESSIVI			2.798.750,00	2.138.428,99
Importi espressi in euro				

1.2 Edilizia Scolastica

La Regione Basilicata, ha approvato un programma di interventi finalizzato al miglioramento delle condizioni delle infrastrutture scolastiche.

Con la **D.G.R. n. 417/2006**, è stato approvato un programma per l'**adeguamento** delle **strutture scolastiche** al fine concorrere al **miglioramento** e alla **sostenibilità** del sistema dell'istruzione regionale.

Il P.O. "Val d'Agri" prevede, al riguardo, 2 specifiche tematiche: la **riqualificazione dei centri urbani e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (A1)** e l'**elevazione della qualità della vita con l'adeguamento delle scuole** esistenti alle prescrizioni sulla sicurezza per gli interventi coerenti con il Piano Edilizia Scolastica (C3).

La Regione Basilicata, attraverso un'analisi puntuale sullo stato **dell'edilizia scolastica** nel territorio regionale e, in particolare, nei Comuni del comprensorio ha individuato le criticità ed i possibili correttivi da porre in essere stanziando un importo complessivo di **6 Meuro** per i 30 Comuni e **2,5 Meuro** per i 5 nuovi Comuni.

La spesa realizzata a tutto il **2018** è pari a circa **6,2 Meuro** con una percentuale di spesa pari al 75,67% rispetto alle risorse impegnate, come si evince dalle tabelle e grafici che seguono.


Tabella 3: Quadro di sintesi edilizia scolastica

Riepilogo Scolastica	Finanziato	Speso al 31/12/2016	Speso al 31/12/2017	Speso al 31/12/2018	% di spesa su impegnato 31/12/2018	Incremento % spesa 2016 - 2017	Incremento % spesa al 31/12/2018
30 Comuni (Una quota parte pari ad € 54.515,60 è stata spostata negli interventi del DPC del Comune di Gallicchio)	5.945.484,38	4.984.170,80	4.984.170,80	5.020.727,54	84,45%	0,00%	0,73%
5 Nuovi Comuni	2.141.365,29	255.000,00	1.139.978,48	1.139.978,48	53,24%	347,05%	0,00%
TOTALI	8.086.849,67	5.239.170,80	6.124.149,28	6.160.706,02	76,18%	16,89%	0,60%


Tabella 4: Interventi finanziati e conclusi edilizia scolastica

Riepilogo Scolastica	Interventi Finanziati	Interventi conclusi	Finanziato	Speso per interventi conclusi
30 Comuni	66	49	5.945.484,38	4.478.655,32
5 Nuovi Comuni	8	0	2.141.365,29	0,00
TOTALI	74	49	8.086.849,67	4.478.655,32


Raffronto Finanziato/Speso

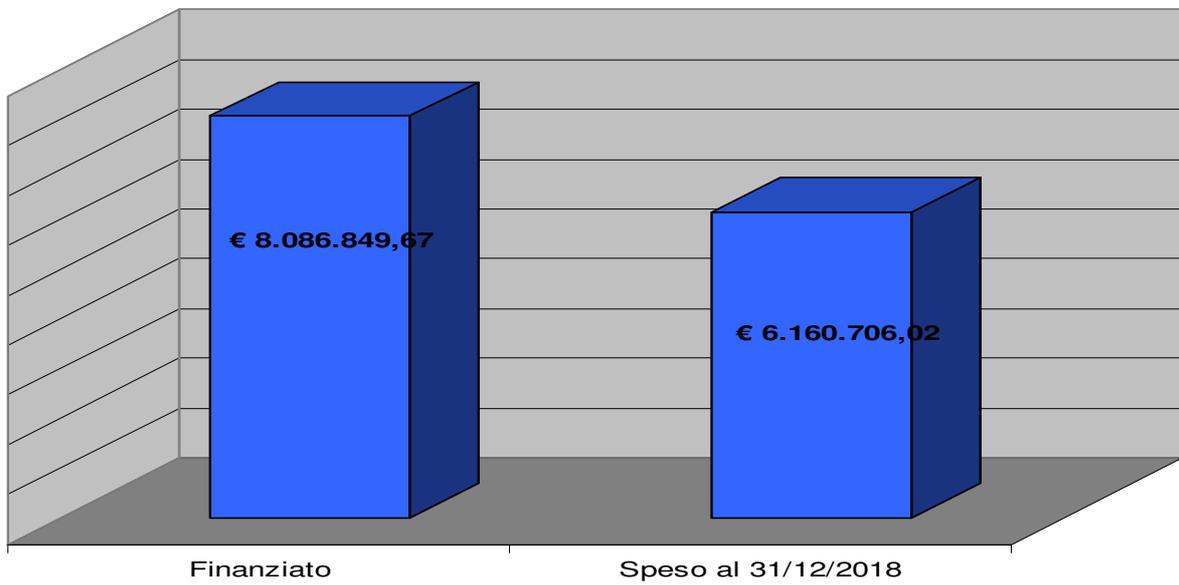

Raffronto n. Int. Finanziati/n. Int. conclusi

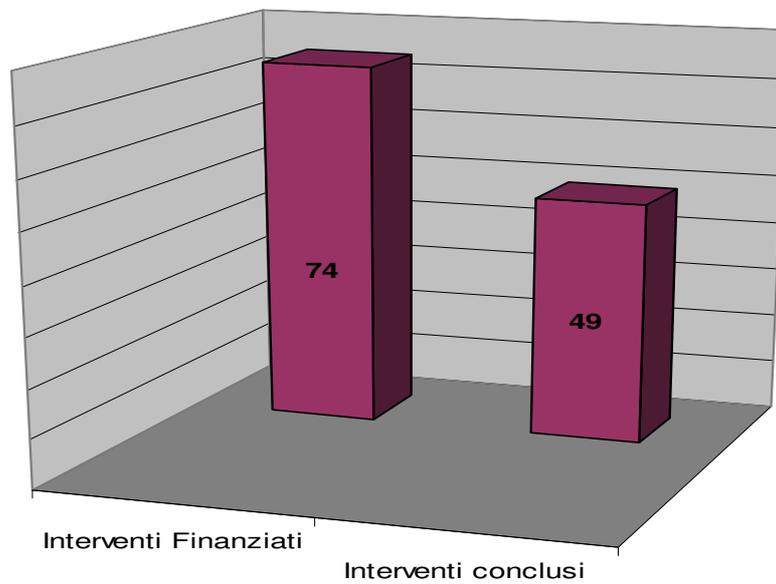

Quadro Temporale Speso ultimo triennio

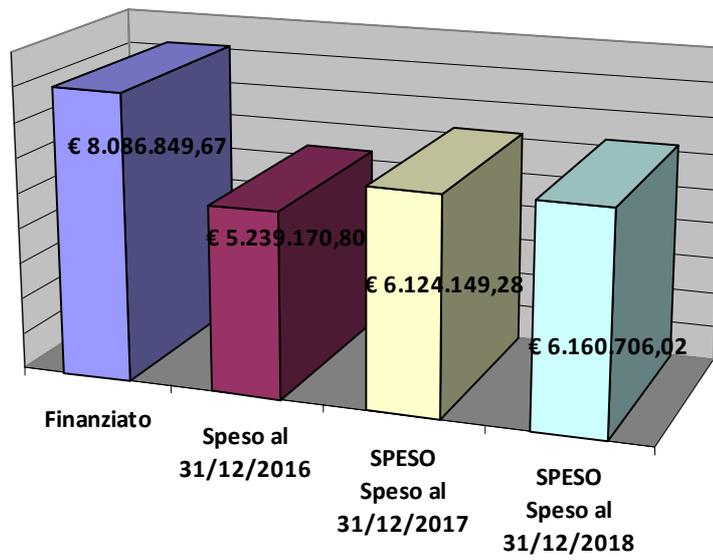

1.3 Edilizia di Culto

Particolare importanza è stata attribuita al tema della salvaguardia delle chiese ed alla custodia delle opere d'arte ivi contenute non solo per la difesa della cultura religiosa ma nell'ottica di un incremento del turismo religioso pur presente nel territorio.

E' stato predisposto un progetto di ripartizione dei fondi approvato dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. "Val d'Agri".

D'altronde il **programma di area vasta** degli interventi per l'**Edilizia di Culto** e per la **conservazione delle opere d'arte**, custodite nelle chiese, si concilia perfettamente con la **Tematica A "Riquilificazione dei centri urbani"** del P.O. "Val d'Agri".

La Regione Basilicata, ha assegnato un importo complessivo di circa 14 milioni di euro. L'importo finanziato ad oggi è pari a circa **13 MI e 850 mila euro**.

La progettazione è stata affidata alle diocesi ad eccezione di alcuni interventi di particolare importanza la cui realizzazione è stata curata dal Mi.B.A.C.

Globalmente la spesa realizzata a tutto il **2018** è pari a circa **11,3 Meuro** con una percentuale di spesa pari all'81,45% rispetto alle risorse impegnate, come si evince dalle tabelle e grafici che seguono.


Tabella 5: Quadro di sintesi edilizia di culto

Riepilogo Culto	Finanziato	Speso al 31/12/2016	Speso al 31/12/2017	Speso al 31/12/2018	% di spesa su impegnato 31/12/2018	Incremento % spesa 2016 - 2017	Incremento % spesa al 31/12/2018
30 Comuni	12.934.356,47	11.137.052,74	11.267.226,63	11.280.472,07	87,21%	1,17%	0,12%
5 Nuovi Comuni	914.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTALI	13.848.756,67	11.137.052,74	11.267.226,63	11.280.472,07	87,21%	1,17%	0,12%


Tabella 6: Interventi finanziati e conclusi edilizia di culto

Riepilogo Culto	Interventi Finanziati	Interventi conclusi	Finanziato	Speso per interventi conclusi
30 Comuni	104	79	12.934.356,47	9.392.969,86
5 Nuovi Comuni	10	0	914.400,20	0,00
TOTALI	114	79	13.848.756,67	9.392.969,86


Raffronto Finanziato/Speso

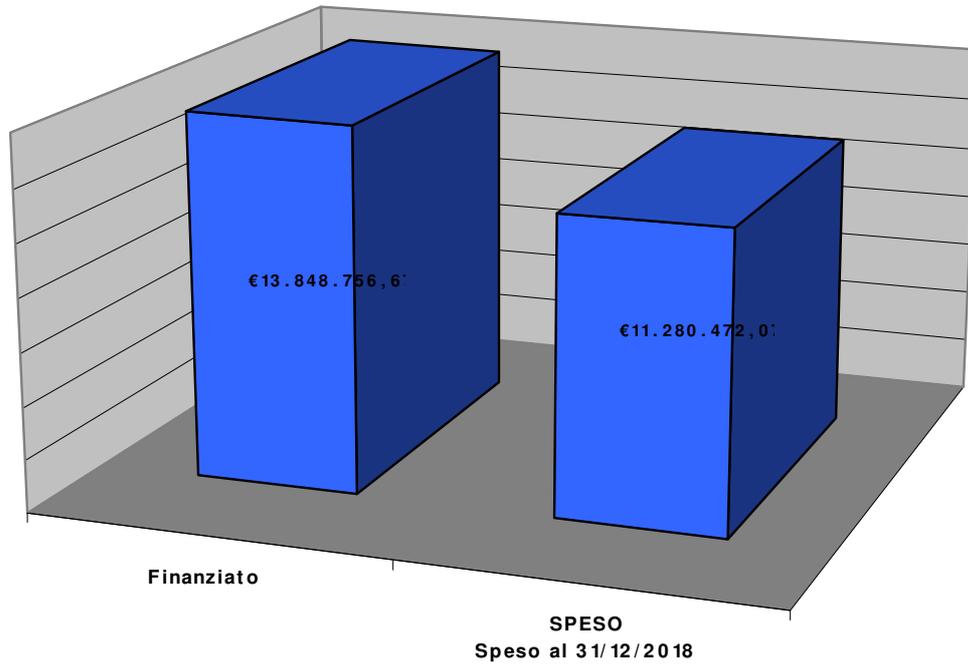

Raffronto n. Int. Finanziati/n. Int. Conclusi

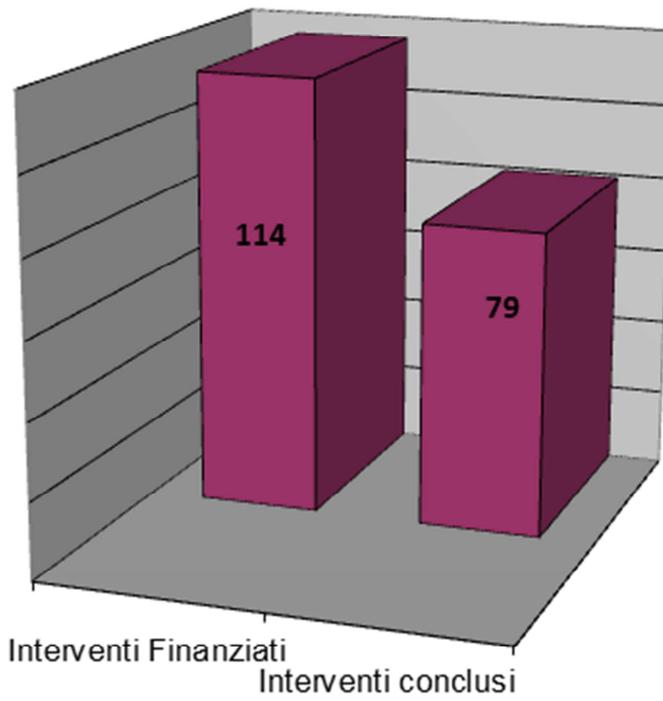

Quadro Temporale Speso ultimo triennio

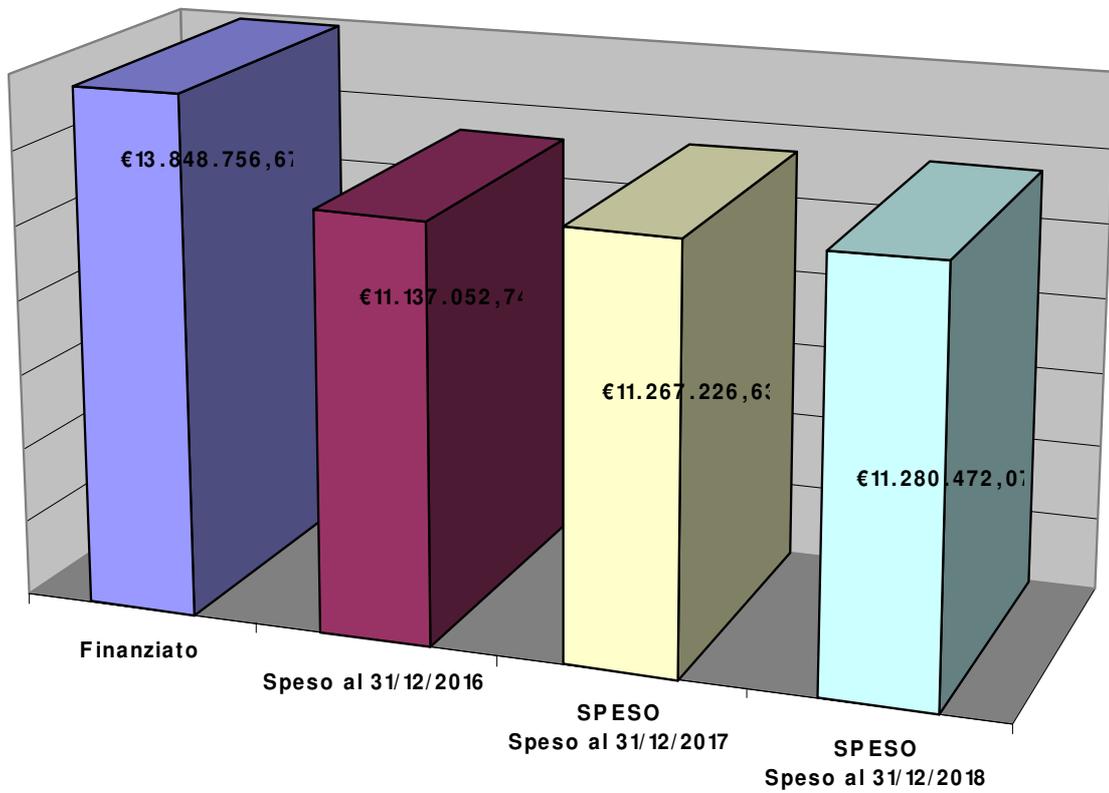

1.4 Viabilità

La strategia della Regione Basilicata, in tema di viabilità, è stata quella di creare un sistema per sviluppare le polarità urbane e di tendere alla **creazione di una città comprensorio** nell'area della Val d'Agri.

D'altronde il P.O. "Val d'Agri", attraverso la specifica linea di intervento **B "Infrastrutture essenziali"**, ha inteso potenziare e migliorare le infrastrutture intercomunali ed i collegamenti alle grandi vie di comunicazione.

L'obiettivo è quello di facilitare una maggiore integrazione fra i comuni attraverso la messa in rete delle peculiarità locali e la valorizzazione di tutte le opportunità presenti nel territorio utilizzandole quali volano per lo sviluppo dell'intera comunità.

Gli interventi programmati mirano a potenziare tutte le strade di accesso alla Fondovalle dell'Agri (arteria principale) e a migliorare la qualità della viabilità all'interno dei Comuni del comprensorio.

Di seguito si riporta la tabella dettagliata degli interventi in corso e conclusi relativi alla viabilità e la tabella degli interventi al solo stato Programmato.

Legenda	
	Interventi in corso
	Interventi conclusi

Tabella 7: Dettaglio interventi sulla viabilità del comprensorio

Ente attuatore	Denominazione Operazione	Impegnato	Speso
Provincia di PZ	Strada di Collegamento Racanello - Ponte S. Chirico Raparo - Fosso Reale - SS 598	1.360.158,44	3.208.727,44
		1.720.000,00	
Provincia di PZ	Strada di Collegamento Racanello - Ponte S. Chirico Raparo - Fosso Reale - SS 598. Opere di completamento con utilizzo economie	289.212,56	0,00
Provincia di PZ	Strada di collegamento galleria Intagliata - Fiumarella di Armento.	854.374,00	750.580,13
Provincia di PZ	Lavori di messa in sicurezza della Fondovalle del Sauro	4.135.660,94	4.135.660,94
Provincia di PZ	Lavori di messa in sicurezza della Fondovalle del Sauro. Opere di completamento	721.315,75	0,00
		13.023,31	13.023,31
Provincia di PZ	Messa in sicurezza ed ammodernamento della SP n. 25 - Tratto da Abitato di Grumento fino alla SP ex SS 103.	491.592,68	491.592,68
Provincia di PZ	Messa in sicurezza ed ammodernamento della SP n. 25 - Tratto da Abitato di Grumento fino alla SP ex SS 103. Opere di completamento	28.407,32	28.337,00
Provincia di PZ	Sistemazione e consolidamento tratto in frana tra Km. 8+400 e km 8+500 sulla SP ex SS 103 - Variante Moliterno.	1.200.000,00	912.465,00
Provincia di PZ	Messa in sicurezza della SP 19 "Moliternese" - Strada Visciglieta - Sarconi. Con DGR n. 1296 del 09/10/2012 è stata rimodulata la scheda progetto sul programma/intervento Cogliandrino - Fondovalle dell'Agri questo intervento è passato dallo stato di programmazione a quello di attuazione.	80.000,00	80.000,00
Provincia di PZ	Strada di collegamento Montemurro - SS 598. Variante SP 11 dell' Alto Agri.	1.500.000,00	1.135.191,54
Provincia di PZ	Lavori di messa in sicurezza SP 103 "della Val d'Agri" - Area PIP Abitato di Moliterno.	3.870.000,00	50.000,00

Provincia di PZ	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 19 Moliternese.	1.050.000,00	0,00
Provincia di PZ	Messa in sicurezza della SP 19 Moliternese - tratto dal Km. 6+700 al Km. 6+800.	450.000,00	310.775,97
Provincia di PZ	Strada di collegamento Armento - SS 598. L'importo iniziale impegnato era di € 7.154.734,41.	6.678.526,53	6.001.687,84
Provincia di PZ	Lavori di rifacimento del collettore fognario interferente con la strada di fondovalle Armento – S.S. 598. Fiumarella di Armento”.	476.207,88	472.972,71
Provincia di MT	Lavori di messa in sicurezza della Fondovalle del Sauro	2.949.180,59	2.949.180,59
	Completamento e riutilizzo economie	180.819,41	127.592,05
Provincia di MT	Strada di collegamento Aliano - Fondovalle Sauro - SS 598 Val d'Agri	1.125.000,00	1.119.783,50
Comune di Abriola	Strada di collegamento Valle Camastra - Val Basento	1.150.493,29	1.150.493,29
Comune di Calvello	Adeguamento strada Calvello - Bivio Autiero	385.000,00	345.748,85
TOTALI		30.708.972,70	23.283.812,84

Tabella 8: Dettaglio interventi viabilità al solo stato di Programmato

Interventi al Solo stato di PROGRAMMATO		Importo
Provincia di PZ	Strada di collegamento Roccanova - SS 598	9.700.000,00
	Strada di collegamento Fondovalle - Cogliandrino di Moliterno (SP 19 - Svincolo SP)	1.814.000,00
Comune di Abriola	Strada di collegamento Valle Camastra - Val Basento	7.849.506,71
Totale Programmato		19.363.506,71

Il budget finanziario messo in campo raggiunge quasi **37 Meuro** ed a tutto il **2018** si è registrata una spesa di circa **23,28 Meuro**. Il tutto si evince dalle tabelle e grafici che seguono.

Tabella 9: Quadro di sintesi viabilità

Ente Beneficiario	Finanziato	Speso al 31/12/2016	Speso al 31/12/2017	Speso al 31/12/2018	% di spesa su impegnato al 31/12/2018	Incremento % spesa 2016 - 2017	Incremento % spesa al 31/12/2018
PROVINCIA DI POTENZA	26.928.479,41	16.155.639,18	17.591.014,56	17.591.014,56	65,32%	8,88%	0,00%
PROVINCIA DI MATERA	7.255.000,00	4.189.132,09	4.189.132,09	4.196.556,14	57,84%	0,00%	0,18%
COMUNE DI ABRIOLO	1.150.493,29	1.150.493,29	1.150.493,29	1.150.493,29	100,00%	0,00%	0,00%
COMUNE DI CALVELLO	385.000,00	345.748,85	345.748,85	345.748,85	89,80%	0,00%	0,00%
TOTALE	35.718.972,70	21.841.013,41	23.276.388,79	23.283.812,84	65,19%	6,57%	0,03%

Tabella 10: Quadro di sintesi interventi finanziati e conclusi viabilità

Ente Beneficiario	Interventi Finanziati	Interventi Conclusi	Finanziato	Speso per interventi conclusi
PROVINCIA DI POTENZA	18	10	26.928.479,41	11.459.326,72
PROVINCIA DI MATERA	7	3	7.255.000,00	4.196.556,14
COMUNE DI ABRIOLO	1	1	1.150.493,29	1.150.493,29
COMUNE DI CALVELLO	1	0	385.000,00	0,00
TOTALE	27	14	35.718.972,70	16.806.376,15



Con la D.G.R. n. 428 del 5 aprile 2012 veniva approvato lo schema di accordo di adesione delle Province di Potenza e Matera e dei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano al Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra". Nel corso di un successivo incontro, tenutosi presso l'Ufficio Programmazione della Presidenza della Giunta Regionale in data 13.11.2012, le Province di Potenza e Matera con i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano hanno definito gli interventi sulla viabilità da realizzare sulla base delle risorse previste nell'allegato "A" della citata Delibera.

Per quanto concerne la dotazione finanziaria assegnata alle Province nell'ambito della Misura B.1 "Viabilità e Collegamenti" le risorse risultano ripartite come indicato nella tabella seguente:


Tabella 11 - Quadro di sintesi interventi viabilità previsti dalla D.G.R. n. 428 del 5 aprile 2012

COMUNE	INTERVENTO PREVISTO	DOTAZIONE FINANZIARIA PREVISTA
ACCETTURA (Provincia di MT)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza Strada Provinciale Accettura-Gallipoli-Ponte Balzano	900.000,00
ACCETTURA (Provincia di MT)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza Strada Provinciale ex S.S. n. 277 tratto Accettura-bivio Cirigliano	300.000,00
CIRIGLIANO (Provincia di MT)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza Strada Provinciale ex S.S. n. 103 Cirigliano-bivio ex S.S. n. 277 Stigliano	900.000,00
STIGLIANO (Provincia di MT)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza Strada Provinciale ex S.S. n. 103 Stigliano-Craco	900.000,00
CASTELMEZZANO (Provincia PZ)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.P. n. 32 Ter (Camastra-Castelmezzano)	1.000.000,00
PIETRAPERTOSA (Provincia PZ)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.P. n. 13	1.000.000,00

Totale	5.000.000,00
---------------	---------------------

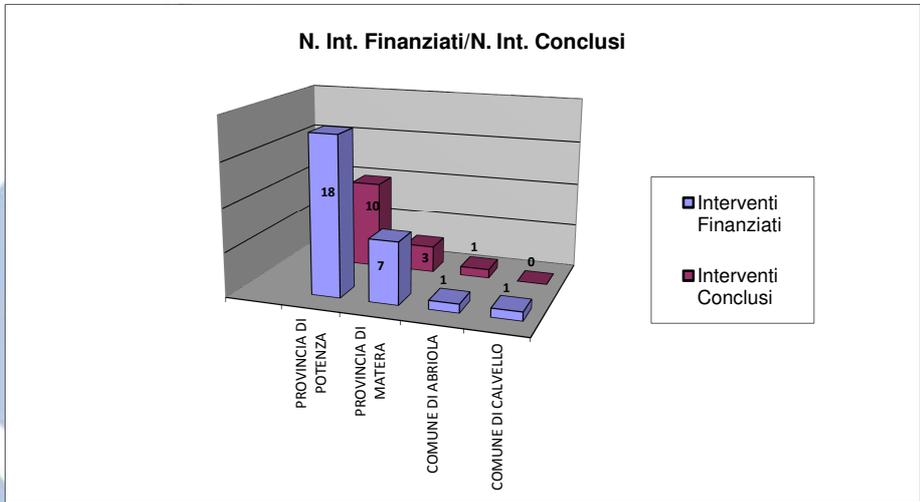

Quadro Temporale Speso ultimo triennio

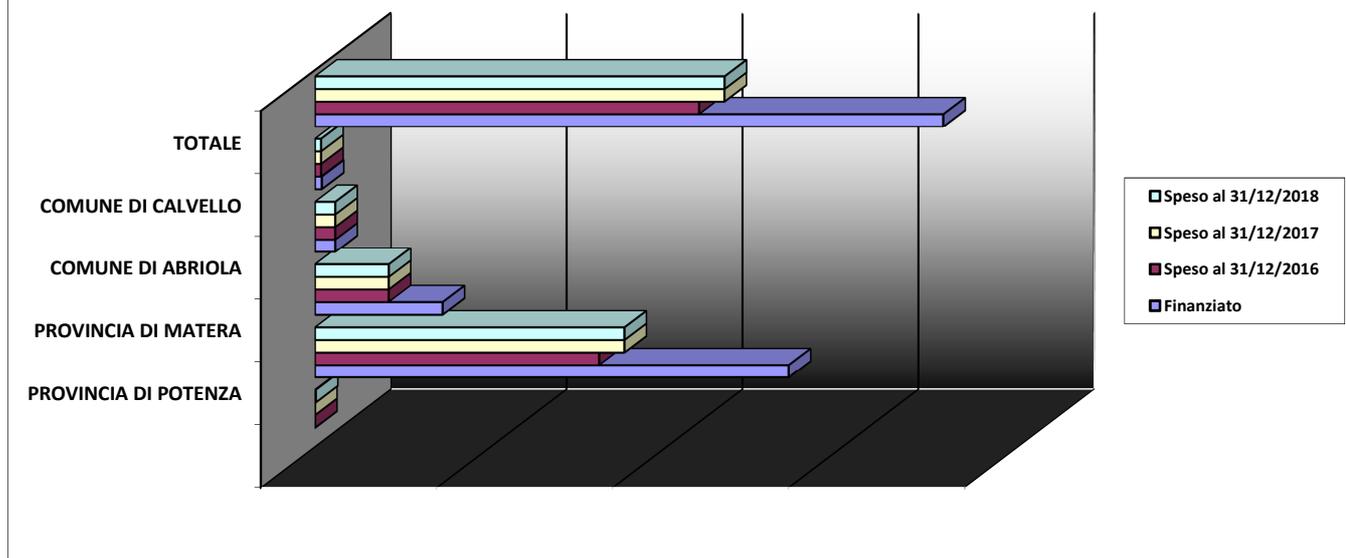

2. Gli Investimenti per il sistema turistico culturale

2.1 Il Grande attrattore

La strategia regionale, tesa a sviluppare un sistema turistico territoriale capace di coniugare le peculiarità del territorio e strutturare le risorse locali con tutti i valori naturalistici e storico-culturali presenti, ha come punto di partenza lo studio di fattibilità affidato all'APT al fine di articolare un progetto di rilancio turistico dell'intera Val d'Agri.

Il C.C.M. del P.O. "Val d'Agri", nella seduta del 6 luglio 2009, individuava gli interventi cardine da realizzare ovvero:

- ✓ Parco tematico per la realizzazione di percorsi turistico-tematici, di allestimenti scenici e ad alta tecnologia e di aree e strutture di divulgazione culturale e scientifica.
- ✓ Grumentum dal III sec.a.C al VI sec.d.C - Storia di una colonia romana per la valorizzazione dell'importante sito archeologico attraverso i più avanzati modelli di comunicazione e di fruizione e con percorsi di visita diurni e notturni basati su azioni di animazione spettacolare.
- ✓ Da Grumentum a Grumento con l'allestimento nel Castello di una sala con tecnologie visive avanzate per la fruizione di filmati e offrendo una panoramica di avvenimenti storici e leggendari dell'antica *Grumentum* con effetti comunicativi di grande suggestione.
- ✓ Museo Multisensoriale con l'allestimento, all'interno del complesso monastico di Santa Maria di Orsoleo di Sant'Arcangelo, di un museo scenografico di nuova generazione dove i visitatori potranno vivere l'esperienza di un'immersione multisensoriale nella storia culturale ed umana dei monaci Bizantini.

La Regione Basilicata, con D.G.R. n. 2132/09 ha approvato il "Progetto integrato di valorizzazione turistico-culturale ed ambientale della Val d'Agri" predisposto dall'APT in collaborazione con la Struttura di Progetto Val d'Agri, che prevedeva uno stanziamento programmatico complessivo di € 14.400.000,00.

La Regione Basilicata, con D.G.R. n. 483 del 24 Aprile 2012, ha approvato gli altri interventi progettuali proposti concedendo un finanziamento complessivo pari ad 3.600.000,00.

Nello specifico gli interventi prevedono:

2.1.1 Realizzazione di un percorso storico-naturalistico e riqualificazione fosso Arenazzo

In sintesi, l'obiettivo del progetto è quello di integrare l'offerta turistica tradizionale, costituita dalla bellezza della natura, dalla gastronomia mediterranea, dalla cultura e dalle tradizioni religiose secolari con elementi d'interesse specifici che possono fungere da forza attrattiva verso il territorio.

Con determina dirigenziale n. 2348 del 12.11.2013 la Struttura di Progetto "Val d'Agri" ha preso atto del progetto presentato dall'Amministrazione Comunale di Sasso Castalda impegnando la somma di € 1.200.000,00 per la realizzazione dell'opera.

L'opera è stata ultimata nel mese di luglio del 2017, con una spesa pari ad € 1.168.198, e l'attrattore è stato chiamato "Ponte alla Luna" in onore del famoso cittadino Ignazio Petrone che lavorando nel team di progetto alla Nato aveva partecipato alla prima missione per lo sbarco dell'uomo sulla Luna.

2.1.2 Un ponte tra i due parchi nel Comune degli sport estremi

Il territorio del Comune di Castelsaraceno è incluso nel Parco Nazionale del Pollino e nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e attraverso la proposta progettuale intende realizzare un collegamento non solo spaziale ma anche metaforico del territorio dei due Parchi puntando a consolidare il ruolo del Comune, da area periferica e marginale, quale luogo di cerniera tra territori ad altissimo pregio ambientale.

L'intervento si sostanzia nella costruzione di un ponte tibetano, corollario di un più ampio parco tematico, con attività, percorsi e attrezzature anche di sport a "forte esposizione aerea" con la finalità di promuovere le pratiche ludico-sportive e sensibilizzare alla visita ed alla conoscenza delle aree naturali e tutelate del territorio. Tale iniziativa è finalizzata, altresì, ad accrescere le opportunità di sviluppo territoriale e a potenziare l'attrattività del territorio a fini turistici.

Con determina dirigenziale n. 1125 del 05.08.2016 l'Ufficio Progetti Speciali "Val d'Agri – Senisese" ha preso atto del progetto definitivo presentato, a seguito di appalto integrato, dall'Amministrazione Comunale di Castelsaraceno per un importo di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell'opera.

Ad oggi, l'Amministrazione ha avviato i lavori e alcune opere previste all'interno del Parco tematico e la ditta esecutrice ha già realizzato le fondazioni delle stazioni di partenza e di arrivo dell'infrastruttura sospesa.

2.1.3 Valorizzazione e recupero dell'area naturalistica dei Calanchi

Lo scopo prioritario del progetto è quello di rivalutare una vasta superficie interessata da rilevanti testimonianze storiche e culturali valorizzando un'area ambientale costituita da unità architettoniche di antica origine (edifici a due piani in argilla e paglia), inserite sugli alti crinali dell'altipiano calanchivo.

In sostanza i "percorsi dei calanchi" permetteranno di raggiungere materialmente le valli di argilla per poterle ammirare in tutta la loro suggestiva unicità rafforzando il ruolo che Aliano riveste all'interno dei circuiti nazionali de "I Parchi Letterari" che si propongono di organizzare e divulgare le straordinarie peculiarità del paesaggio esaltandone le valenze letterarie, etnografiche, storiche, socio-antropologiche, gastronomiche ed archeologiche. Con determina dirigenziale n. 2338 del 12.11.2013 la Struttura di Progetto "Val d'Agri" ha preso atto del progetto presentato dall'Amministrazione comunale di Aliano impegnando la somma di € 900.000,00 per la realizzazione dell'opera. Allo stato attuale i lavori relativi ai diversi Poli di intervento, la strada dei Calanchi e i servizi funzionali alla realizzazione dell'opera sono stati realizzati.

In sostanza, tenuto conto degli interventi originariamente previsti per il "Grande Attrattore" e quelli relativi alla promozione territoriale ed alla valorizzazione turistica della Val d'Agri, le risorse messe in campo per il rilancio turistico del comprensorio ammontano ad oltre 7,5 Meuro il tutto come emerge dalla tabella che segue.

Tabella 1: Quadro di sintesi dello stato di avanzamento dei progetti

Iniziativa Attivata	Soggetto Attuatore	Finanziato	Speso
Proposta progettuale per il Sistema turistico dell'area della Val d'Agri per la valorizzazione culturale ed ambientale	APT Basilicata	300.000,00	100.000,00
GRUMENTUM dal III sec. a.C. al VI sec. d.C. - STORIA DI UNA COLONIA ROMANA	Mi. B.A.C.	Programmati 800.000,00	0,00
Interventi di realizzazione del Parco archeologico e del museo di Grumento Nova da attuare attraverso avanzati modelli di	Mi. B.A.C.	778.975,62	116.846,34

comunicazione e fruizione . CAPO B			
DA GRUMENTUM A GRUMENTO	Comune di Grumento Nova	347.772,78	347.772,78
MUSEO MULTISENSORIALE	Comune di Sant'Arcangelo	1.800.000,00	1.800.000,00
Realizzazione di un percorso storico-naturalistico e riqualificazione fosso Arenazzo	Comune di Sasso Castalda	1.200.000,00	1.168.198,5
Un ponte tra i due parchi nel Comune degli sport estremi	Comune di Castelsaraceno	1.500.000,00	359.288,39
Valorizzazione e recupero dell'area naturalistica dei Calanchi	Comune di Aliano	900.000,00	744.168,33
	Totale	7.626.748,4	4.636.274,34

2.2 Parco della Grancia

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio (C.C.M.) ha riconosciuto l'importanza di completare la prima fase di attuazione del Programma Operativo attraverso una serie di interventi straordinari rientranti in una strategia generale. In particolare nelle sedute del 14.12.2009 e del 29.12.2009 sono state prese in esame una serie di indicazioni operative, proposte da vari soggetti attuatori, coerenti con le Misure previste dal P.O.

Le decisioni assunte in sede di C.C.M. sono state approvate con la D.G.R. n. 71/2010, la D.G.R. n. 1055 del 20.07.2011 e la Determinazione Dirigenziale n. 913 del 04.06.12 con le quali, complessivamente, sono state destinate al rilancio del "Parco della Grancia" € 1.900.000,00, di cui al 31.12.2018 sono stati liquidati circa 1,62 milioni di euro come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 2: Quadro di sintesi delle risorse finanziarie assegnate

Parco della Grancia		
Provvedimento di impegno	Risorse assegnate	Importo liquidato
Piano di Sviluppo e rilancio del Parco Storico Rurale e Ambientale di Basilicata (Parco della Grancia)	1.600.000,00	1.320.799,00
Intervento straordinario per il rilancio del Parco della Grancia	300.000,00	294.827,75
Totale	1.900.000,00	1.615.626,75

2.3 La valorizzazione del Lago del Pertusillo

Le Amministrazioni comunali di Grumento Nova, Montemurro e Sarconi già in sede di redazione dei rispettivi Documenti Programmatici Comunali, avevano previsto interventi per il recupero e la fruizione dell'areale che gravita nel perimetro del Lago Pertusillo. Il C.C.M. del P.O. "Val d'Agri", nella seduta del 28.10.2008, esprimeva parere favorevole alla concessione di un contributo straordinario per la riqualificazione ambientale, ai fini turistici-sportivi del Lago Pertusillo e la Regione con la D.G.R. n. 2079 del 29 Dicembre 2008 ne approvava il finanziamento per un importo pari ad € 873.000,00. I comuni di Grumento Nova, Montemurro e Sarconi, in data 29.01.2009, sottoscrivevano un'intesa istituzionale per la realizzazione di un intervento comprensoriale di

“Riqualficazione paesistica ed ambientale per una migliore fruibilità turistica, sportiva e ricreativa del comprensorio del Lago Pertusillo”, alla quale successivamente si è associato il comune di Spinoso.

Il progetto presentato ha il seguente quadro economico di ripartizione delle risorse:

Tabella 3: Quadro di sintesi delle risorse finanziarie assegnate

Territorio in cui sono previste le opere	Risorse impegnate nei DPC	Risorse previste dalla D.G.R. n. 1424/10	Totale Risorse
Comune di Grumento Nova	502.030,00	148.197,78	650.227,78
Comune di Montemurro (comune capofila)	192.000,00	561.539,82	753.539,82
Comune di Sarconi	300.000,00	88.961,22	388.961,22
Comune di Spinoso	250.000,00	74.301,18	324.301,18
Totale	1.244.030,00	873.000,00	2.117.030,00

Nel 2015 è stata corrisposta un’anticipazione da parte della Struttura di Progetto Val d’Agri pari ad € 105.915, ma ad oggi il progetto non ha fatto registrare alcun avanzamento.

Nel corso del 2018 sono intercorse una serie di interlocuzioni scritte tra l’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri-Senise e il Comune di Montemurro (quale Capofila), tra quest’ultimo e il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, a cui spetta il parere per poter procedere alla redazione del progetto esecutivo. Con nota del 24 agosto 2018, il Comune di Montemurro (quale Capofila), non avendo ricevuta alcuna comunicazione da parte del Dipartimento di cui sopra, si avvale della formula del “Silenzio – Assenso” (ai sensi del comma 3 art. 17 bis, Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.).

3. Gli investimenti sociosanitari

3.1 “Obiettivo Inclusione delle persone con disabilità”

La proposta progettuale denominata “Obiettivo Inclusione delle persone con disabilità”, i cui contenuti sono stati trattati e condivisi dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O.V. nel corso della seduta del 12 gennaio 2016, è stata successivamente approvata con D.G.R. n. 802 del 12 luglio 2016, in attuazione della Linea di Intervento C.5.b “Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” del Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra.

Il progetto “Obiettivo Inclusione”, finalizzato inizialmente all’attivazione di n. 80 tirocini di Inclusione sociale delle persone con disabilità, ha individuato la Provincia di Potenza quale soggetto attuatore delle azioni previste, per il tramite della sua Agenzia in house per l’Orientamento e la formazione Apofil per le azioni formative, nelle more della piena operatività dell’Agenzia regionale per il lavoro e transizioni nella vita attiva LAB istituita con L.R. 13 maggio 2016, n. 9.

Elemento centrale dei programmi di tirocinio formativo è stata la presa in carico dei beneficiari che, con un percorso di accompagnamento, ha consentito di far acquisire ulteriori competenze con attività di formazione.

Il progetto Obiettivo inclusione si è sostanziato nell'attivazione di 63 tirocini svolti presso soggetti ospitanti (imprese, cooperative, associazioni, studi professionali, Enti Locali).

L'Agenzia Regionale LAB, subentrato come soggetto attuatore nel mese di marzo 2017, ha gestito l'intero progetto ed è stato il punto di raccordo con le componenti istituzionali, economiche e sociali presenti sul territorio, collaborando alla costituzione della rete di welfare comunitario.

Con Legge Regionale del 22/11/2018 n. 38, all'art. 11 si è stabilita la prosecuzione del progetto con una previsione finanziaria di € 1.200.000,00 per gli anni 2019 e 2020. Con riunione operativa tenutasi in data 28 gennaio u.s. con i sigg. Sindaci interessati si è fissato una bozza di cronoprogramma, di concerto con la ARLAB (già LAB) per l'effettivo prosieguo delle attività con i tirocinanti.

4. Sostegno alle attività produttive

4.1 Quadro di sintesi e avanzamento complessivo degli aiuti alle imprese

Per sostenere esclusivamente programmi di investimento aziendali, processi aggregativi, certificazioni di qualità e interventi formativi, sono stati attivati nel corso degli anni circa 35 bandi.

Ad oggi risultano in corso i seguenti 2 bandi:

4.1.1 Concessione di agevolazioni per la "Creazione di attività imprenditoriali"

L'Avviso Pubblico finalizzato alla Creazione di nuove attività imprenditoriali, emanato con la D.G.R. n. 381 del 10 aprile 2013, si pone l'obiettivo di far emergere le vocazioni territoriali e sostenere lo start up di nuove imprese nei comuni del comprensorio, incentivando finanziariamente i programmi di investimento finalizzati allo sviluppo dei "fattori di contesto", a rafforzare lo sviluppo competitivo e la valorizzazione della produzione di beni e di servizi. La dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso Pubblico è pari a 4 milioni di euro. Di seguito i dati finanziari e numerici relativi al bando.

Tabella 14: Il bando per la "Creazione di attività imprenditoriali": quadro di sintesi

Bando	Programmato	Finanziato	Speso	n. iniziative presentate	n. iniziative finanziate	n. iniziative avviate
Creazione di attività imprenditoriali	4.000.000,00	1.264.148,18	1.025.685,63	108	33	33

4.1.2 Concessione di agevolazioni per la "Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle PMI esistenti"

L'Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni finalizzate alla "Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle PMI esistenti", emanato con la D.G.R. n. 609 del 5 giugno 2013, si prefigge di incentivare e sostenere finanziariamente la delocalizzazione produttiva nelle aree artigianali, industriali, nelle aree PIP

attrezzate del territorio dei comuni del comprensorio del P.O. Val d'Agri, ma anche di promuovere nel tessuto imprenditoriale esistente l'innovazione tecnologica, la crescita dimensionale, lo sviluppo competitivo e di valorizzarne la produzione di beni e di servizi. La dotazione finanziaria iniziale del bando è di 2,4 milioni di euro. Di seguito i dati finanziari e numerici relativi al bando.

Tabella 15: Il bando per la “ Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle PMI esistenti”: quadro di sintesi

Bando	Programmato	Finanziato	Speso	n. iniziative presentate	n. iniziative ammesse	n. iniziative avviate
Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle PMI esistenti	2.400.000,00	1.200.000,00	1.150.066,22	166	12	12

A seguito delle varie interlocuzioni tra l'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri Senese e Sviluppo Basilicata, si è addivenuti all'individuazione dell'effettivo fabbisogno finanziario necessario per la conclusione dei due bandi per un importo pari a circa 1.300.000,00 di cui è stata richiesta apposita variazione di bilancio. (Vedi punto 5).

5. Fondo per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione del petrolio e adiacenti. Art.20 comma 1 Bis Decreto Legislativo 625/97

Nel corso dell'anno 2018 in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, è stato creato un nuovo capitolo di spesa denominato U 53645 allocato sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 Industria PMI e Artigianato.

Con le seguenti dotazioni finanziarie: (dato aggiornato al 11 febbraio 2019)

Annualità 2018 € 20.221.077,16

Annualità 2019 Stanziamento definitivo di € 34.578.098,85

Annualità 2020 stanziamento definitivo 40.710.067,50 con disponibilità di competenza pari ad € 30.042.124,16 ed un blocco per € 10.667.943,34.

Di questi fondi € **1.200.000,00** sono stati utilizzati per garantire, data la valenza sociale dello stesso, il prosieguo delle attività progettuali di Obiettivo Inclusione giusta **L.R. n. 38 del 22/11/2018 art. 11:** Proroga attività progettuali 2019/2020 Soggetto Attuatore LAB (Agenzia regionale per il lavoro e l'Apprendimento) per le annualità **2019/2020**.

Ulteriori € **500.000,00** andrebbero spostati su un apposito capitolo da destinare alla costituzione di un fondo rotativo per la progettazione relativa al Programma Operativo “Vald'Agri, Melandro, Sauro, Camastra” giusto art. 4 Legge Regionale 20 agosto 2018 N. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”.

Infine ulteriori € **1.300.000,00** sono stati richiesti in variazione diminutiva per la chiusura definitiva dei due bandi ancora in esecuzione vale a dire Creazione di Impresa e Delocalizzazione.
